



TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2021
Hora : 08:53 a.m.

USUARIO:
YESENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 2734

L.: 18,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2158

Fecha de Emision: 2/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Primer Estimación del Contrato No.048-2021 por Dirección de Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la comunidad de El Diviso, T.S.B. (Valor estimación Lps.22,760.00, devolución de anticipo Lps.4,552.00 y retención por cumplimiento de Contrato Lps.3,414.00; TOTAL A PAGAR LPS.14,794.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD, S.B.	18,208.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	3,414.00
Total de retenciones:		3,414.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,208.00
Monto Total:		18,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,208.00
- RETENCIONES	3,414.00
TOTAL	14,794.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: 1626197200126



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
UBICACIÓN: EL DIVISO, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.
FECHA: 02 DE OCTUBRE DE 2021
PRESENTADO POR: SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

ESTIMACIÓN No. 1 DE AVANCE DE OBRA.

DIRECCIÓN DE PROYECTO															
CONTRATADO						ACUMULADO ANTERIOR			AVANVE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECUTADO
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Dirección de Proyecto	Global	1.00	L 56,900.00	L 56,900.00		L -	L -	0.40	56,900.00	L 22,760.00	0.40	L 56,900.00	L 22,760.00	40.00
TOTAL					L 56,900.00		L -				L 22,760.00			L 22,760.00	40.00
(20%) DEVOLUCIÓN POR ANTIPO					L 11,380.00		L -				L 4,552.00			L 4,552.00	40.00
(15%) RETENCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO					L 8,535.00		L -				L 3,414.00			L 3,414.00	40.00
TOTAL NETO (L.)					L 36,985.00		L -				L 14,794.00			L 14,794.00	40.00



Manuel Leopoldo Regalado Fernández
 Alcalde Municipal



Ing. Levi López Fernández
 C.I.C.H 7031

SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,
TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: levi_alfa02@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000553

Por Lps: 14,794.00

CAI: 1B56BA-3F1FB2-C74589-DF972A-599E85-46

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S.B.

RTN: 16269995443317

La suma neta de: Catorce mil setecientos noventa y cuatro con 00/100

Por concepto de: Pago de estimación No 1 por avance de obra según contrato No.

02 de 10 del 2021

Original: Cliente
Copia: Emisor



Total por Honorarios: _____
Total Neto Recibido: Lps. 14,794.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-04-00000501 - 000-001-04-00000600 - Fech. Recepción - 14/01/2021 - Limite. Emisión - 14/01/2022



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2018

RTN: 16261972001266

LEVI LOPEZ FERNANDEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 65 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2976804

Transacción: EFEEBD

INFORME DE DIRECCIÓN DE PROYECTO N°1

“Proyecto de Construcción de SISTEMA DE AGUA POTABLE”

**EL DIVISO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE
SANTA BÁRBARA.**



SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA
Ing. Levi López Fernández

Trinidad, Santa Bárbara, 02 de octubre de 2021

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°1

Período del 06 de septiembre al 02 de octubre de 2021

I. DATOS GENERALES:

Proyecto:	Construcción de Sistema de Agua Potable.
Ubicación:	El Diviso, Trinidad, Santa Bárbara.
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha de Inicio del Proyecto:	Lunes 06 de septiembre de 2021
Período de trabajo:	Del 06 de septiembre al 02 de octubre de 2021

II. ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1) Excavación para la construcción de la Cisterna (5.40m x 2.80m x 2.40m de profundidad)
- 2) Acarreo de material producto de la excavación
- 3) Trabajos preliminares en Obra de Toma
- 4) Fundición de base de Cisterna con Concreto Ciclópeo
- 5) Armado con Acero de 3/8" de losa de piso y de paredes de la cisterna
- 6) Trabajos de mejoramiento en la obra de Toma.
- 7) Fundición de Losa de Piso de concreto armado.
- 8) Encofrado de paredes
- 9) Fundición de paredes con concreto
- 10) Encofrado para losa superior
- 11) Armado de hierro para losa superior
- 12) Fundido de losa superior.
- 13) Remoción de rocas del sitio donde se construirá el tanque aéreo.

III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Trabajos preliminares en Obra de Toma



Excavación para Construcción de Cisterna y acarreo de material de excavación



*Excavación para la construcción de la Cisterna
(5.40m x 2.80m x 2.40m de profundidad)*



Trabajos de mejoramiento en la obra de Toma



Fundición de Base de Cisterna con concreto Ciclópeo y armado con Acero de 3/8" de losa de piso y de paredes de la cisterna



Cisterna: Armado con Acero de 3/8" de losa de piso y de paredes de la cisterna





Fundición de Base de Cisterna con concreto y armado con Acero de 3/8" de paredes de la cisterna






Encofrado y función de paredes de Cisterna



Fundido y Pulido de paredes

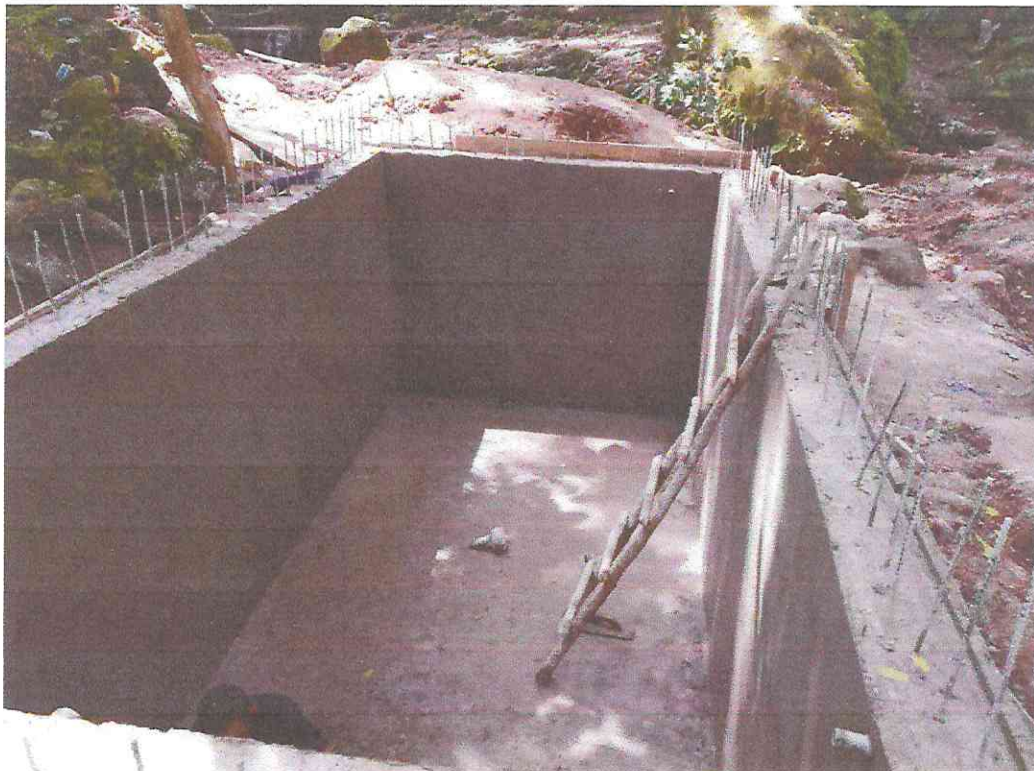

Pulido de paredes internas de cisterna



Encofrado, armado de hierro y fundido de losa de Losa Superior de Cisterna



Remoción de rocas del sitio donde se construirá el tanque aéreo



Remoción de rocas del sitio donde se construirá el Tanque Aéreo

