



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

### **NOTIFICACION DEL PROYECTO**

En respuesta a la solicitud No OIP-005-05-10-2021 enviada el día 05 de octubre del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de "pavimentación hidráulica en las calles alternas al I.T.R.P.P, Barrio LA Violeta, Porvenir

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encargado de la ejecución del proyecto | Ing. Walter David Guzmán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sector                                 | Noroeste del municipio de Cane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre del proyecto                    | Pavimentación Hidráulica en las calles alternas al Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce, Barrio la Violeta, el Porvenir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ubicación del proyecto                 | Casco urbano del Municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción del proyecto               | <ul style="list-style-type: none"><li>31. El proyecto consiste en la pavimentación ciclópea de 303.93 metros lineales ubicados en la parte norte de la escuela Manuel Francisco Vélez, las actividades a realizar son las siguientes: Trazado y marcado CON TEODOLITO</li><li>32. Corte de material con moto a niveladora</li><li>33. Acarreo de material desperdicio</li><li>34. Escarificación, conformación, y compactación</li><li>35. Suministro y colocación de material selecto</li><li>36. Concreto Hidráulica E=15CM</li><li>37. Bordillo de concreto de 15x15 cm</li><li>38. Bordillo de concreto de 10x10 cm</li><li>39. Transporte de maquinaria</li><li>40. Junta asfáltica para la losa de 15cm</li></ul> |



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

| ELABORACIÓN DEL PROYECTO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcance del proyecto( principal de proyecto)                                 | La construcción del Proyecto pavimentación HIDRAULICA en el barrio porvenir y barrio la violeta del casco urbano del municipio de Cane, estará dando solución al problema que afrontan los habitantes, de contar con unas de las calle principal en REGULAR ESTADO estado, brindándole a la comunidad una calle de acceso en buenas condiciones en la cual puedan transportarse con más facilidad en cualquier época del año. |
| Impacto ambiental                                                            | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impacto en el terreno y asentamiento                                         | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Detalle del encargado del proyecto                                           | Ing. Walter David Guzmán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuente de financiamiento                                                     | Alcaldía municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Presupuesto del proyecto                                                     | Lps. 2,723,358.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto                             | Junio 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Estado actual del proyecto                                                   | Ejecutado aproximadamente en un 88.33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Costo de finalización del proyecto                                           | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fecha de finalización                                                        | 22 Noviembre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Variación en el costo total del proyecto                                     | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Variación en el alcance de duración del proyecto.                            | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 12 días del mes de Octubre del año 2021.



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

---

  
Luis Fernando Martínez Avila  
Desarrollo comunitario/proyectos





LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.  
ALCALDE MUNICIPAL  
E-mail: [municane@yahoo.com](mailto:municane@yahoo.com)  
[www.municane.org](http://www.municane.org)

## **NOTA ACLARATORIA**

**PARA:** Thelma Yolibeth de la O Pineda  
Oficina de información pública

**DE:** Luis Fernando Martínez  
Desarrollo comunitario y proyectos

En respuesta a la solicitud enviada el 05 de Octubre del presente año con numero No: OIP-005-05-10-2021 por la oficina de información pública, sobre la ejecución de proyectos; le comunico que en el mes de Septiembre año 2021 no se llevó a cabo ningún proceso de licitación pública ni privada, solo se ESTA ejecutando el proyecto de pavimentación hidráulica en el casco urbano de la comunidad de CANE, LA PAZ.

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente nota a los 12 días del mes de Octubre del año 2021.

  
Luis Fernando Martínez Ávila  
Desarrollo comunitario/proyectos



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2021

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13949

L.: 724,668.14

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10245Fecha de Emisión: 5/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Pague a: WALTER DAVID GUZMAN SALINASId/RTN: 1204198200038La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:


Pago de la tercera estimación del Proyecto de Pavimentación Hidráulica de calles de los Barrios El Porvenir y La Violeta y calles alternas del Barrio El Porvenir por la cantidad de L.724,668.14

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12 07 001 000 001 47210 11-001-01 | Construcción de Calles Pavimentadas 700 metros calle del Barrio Porvenir y La Violeta. | 724,668.14 |

| CODIGO                | RETENCIONES | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
|                       | DESCRIPCION |       |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO      |
|--------------|---------------------------------------|------------|
|              | DESCRIPCION                           |            |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local     | 724,668.14 |
| Monto Total: |                                       | 724,668.14 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |            |
|-----------------------------|--|------------|
| SUBTOTAL                    |  | 724,668.14 |
| - RETENCIONES               |  | 0.00       |
| TOTAL                       |  | 724,668.14 |



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:


Identidad No.:

Walter David Guzman Salinas  
1204-1982-00058



0s+jsf9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNiHQtX/e7rg6v7BoxqUNU8S96hAcBCKsp5CO63wTpCiZYRTUbfXI8yWLRWUXY0zf+FGqF3V+c  
 NvzqinGPjIK54N1AjtMqgkCBNxqFmTAZQj





**CONGUSA**  
COMPAÑIA NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS


ESTIMACION DE OBRA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE  
PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES ALTERNAS AL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE  
UBICACION: BARRIO PORVENIR Y BARRIO LA VIOLETA CANE, LA PAZ  
EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS  
ESTIMACION: 3  
PERIODO DEL: 17/09/2021 HASTA 04/10/2021 17 DIAS




| No.                 | CONCEPTOS                                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |             | EJEC. EN ESTE PERIODO |             | TOTAL ACUMULADO |             | % AVANCE |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
|                     |                                                     |        |          |              |              | CANTIDAD           | MONTO       | CANTIDAD              | MONTO       | CANTIDAD        | MONTO       |          |
| A. TRAMO 1          |                                                     |        |          |              |              |                    |             |                       |             |                 |             |          |
| 1                   | TRAZADO CON TEODOLITO                               | ML     | 71.60    | L35.02       | L2,507.43    |                    |             |                       |             |                 |             |          |
| 2                   | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 178.28   | L124.20      | L22,142.38   | 178.28             | L22,142.38  | 0.00                  | 0.00        | 178.28          | L2,507.43   | 100.00%  |
| 3                   | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                  | M3     | 231.77   | L153.07      | L35,477.03   | 231.77             | L35,477.03  | 0.00                  | 0.00        | 231.77          | L22,142.38  | 100.00%  |
| 4                   | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   | M3     | 89.14    | L705.85      | L62,919.47   | 89.14              | L62,919.47  | 0.00                  | 0.00        | 89.14           | L35,477.03  | 100.00%  |
| 5                   | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA            | M2     | 594.28   | L39.39       | L23,408.69   | 594.28             | L23,408.69  | 0.00                  | 0.00        | 594.28          | L62,919.47  | 100.00%  |
| 6                   | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO     | M3     | 89.14    | L5,364.66    | L478,205.79  |                    |             | 89.14                 | L478,205.79 | 89.14           | L23,408.69  | 100.00%  |
| 7                   | CORTADO DE CONCRETO                                 | ML     | 198.09   | L10.56       | L2,091.83    | 0.00               | 0.00        | 198.09                | L2,091.83   | 198.09          | L478,205.79 | 100.00%  |
| 8                   | CURADO DE LOSA                                      | M2     | 594.28   | L34.06       | L20,241.18   | 0.00               | 0.00        | 594.28                | L20,241.18  | 594.28          | L2,091.83   | 100.00%  |
| 9                   | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2         | KG     | 40.32    | L37.10       | L1,495.87    | 0.00               | 0.00        | 40.32                 | L1,495.87   | 40.32           | L20,241.18  | 100.00%  |
| 10                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                   | ML     | 123.20   | L263.55      | L32,469.36   | 0.00               | 0.00        | 123.20                | L32,469.36  | 123.20          | L1,495.87   | 100.00%  |
| 11                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4      | ML     | 20.00    | L214.95      | L4,299.00    | 0.00               | 0.00        | 20.00                 | L4,299.00   | 20.00           | L32,469.36  | 100.00%  |
| 12                  | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)          | ML     | 269.69   | L62.28       | L16,796.29   | 0.00               | 0.00        | 269.69                | L16,796.29  | 269.69          | L4,299.00   | 57.63%   |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | L702,054.32  |                    |             |                       |             |                 |             | 0.00%    |
| B. PAVIMENTOS       |                                                     |        |          |              |              |                    |             |                       |             |                 |             |          |
| 13                  | MOVILIZACION DE EQUIPO                              | GLB    | 1.00     | L23,000.00   | L23,000.00   | 1.00               | L23,000.00  | 0.00                  | 0.00        | 1.00            | L667,201.72 | 95.04%   |
| 14                  | ROTULO FHS METALICO 3'X8 INCLUYE PATAS              | UNO    | 1.00     | L1,150.00    | L1,150.00    | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | L23,000.00  | 100.00%  |
| 15                  | ADMINISTRACION DELEGADA                             | GLB    | 1.00     | L40,250.00   | L40,250.00   | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | L64,400.00   |                    |             |                       |             |                 |             | 0.00%    |
| C. OBRAS DE DRENAJE |                                                     |        |          |              |              |                    |             |                       |             |                 |             |          |
| 16                  | DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO NO INCL. BASE    | M3     | 0.11     | L225.63      | L24.82       |                    |             |                       |             |                 |             | 35.71%   |
| 17                  | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 0.36     | L186.46      | L67.13       | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 18                  | LOSA DE CONCRETO E= 10 CMS N 2 A/C 20 CMS A/S       | M2     | 0.48     | L906.57      | L435.15      | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 19                  | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CMS                    | M2     | 1.92     | L599.35      | L1,150.75    | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 20                  | SOLERA DE 10 X 15 CMS. #2 @ 15CMS CONCRETO 1:2:2    | ML     | 3.20     | L238.69      | L763.81      | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 21                  | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E= 2 CMS MORTERO DE 1:4 | M2     | 1.92     | L200.22      | L384.42      | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 22                  | REJILLA DE VARILLA DE 1/2"                          | M2     | 0.48     | L2,990.00    | L1,435.20    | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 23                  | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" RD-41            | ML     | 66.00    | L163.24      | L10,773.84   | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 24                  | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 6"                 | ML     | 66.00    | L39.24       | L2,589.84    | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| 25                  | CAJA DE REGISTRO DE 0.80X0.80X0.85                  | M      | 1.00     | L3,280.77    | L3,280.77    | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | L70,905.73   |                    |             |                       |             |                 |             | 0.00%    |
| D. TRAMO 2          |                                                     |        |          |              |              |                    |             |                       |             |                 |             |          |
| 26                  | TRAZADO CON TEODOLITO                               | ML     | 82.53    | L35.02       | L2,890.20    |                    |             |                       |             |                 |             |          |
| 27                  | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 155.98   | L124.20      | L19,372.72   | 82.53              | L2,890.20   | 0.00                  | 0.00        | 82.53           | L2,890.20   | 100.00%  |
| 28                  | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                  | M3     | 202.78   | L153.07      | L31,039.53   | 155.98             | L19,372.72  | 0.00                  | 0.00        | 155.98          | L19,372.72  | 100.00%  |
| 29                  | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   | M3     | 77.99    | L705.85      | L55,049.24   | 202.78             | L31,039.53  | 0.00                  | 0.00        | 202.78          | L31,039.53  | 100.00%  |
| 30                  | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA            | M2     | 519.94   | L39.39       | L20,480.44   | 77.99              | L55,049.24  | 0.00                  | 0.00        | 77.99           | L55,049.24  | 100.00%  |
| 31                  | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO     | M3     | 77.99    | L5,364.66    | L418,389.83  | 519.94             | L20,480.44  | 0.00                  | 0.00        | 519.94          | L20,480.44  | 100.00%  |
| 32                  | CORTADO DE CONCRETO                                 | ML     | 173.31   | L10.56       | L1,820.15    | 18.43              | L98,870.68  | 59.56                 | L319,523.71 | 77.99           | L418,389.83 | 100.00%  |
| 33                  | CURADO DE LOSA                                      | M2     | 519.94   | L34.06       | L17,709.16   | 102.00             | L1,077.12   | 71.31                 | L753.03     | 173.31          | L1,820.15   | 100.00%  |
| 34                  | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2         | KG     | 35.28    | L37.10       | L1,308.89    | 122.85             | L4,184.27   | 397.09                | L13,524.89  | 519.94          | L17,709.16  | 100.00%  |
| 35                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                   | ML     | 145.06   | L263.55      | L38,330.56   | 35.28              | L1,308.89   | 0.00                  | 0.00        | 35.28           | L1,308.89   | 100.00%  |
| 36                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4      | ML     | 20.00    | L214.95      | L4,299.00    | 0.00               | 0.00        | 140.00                | L36,897.00  | 140.00          | L36,897.00  | 96.31%   |
| 37                  | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)          | ML     | 255.84   | L62.28       | L15,933.72   | 0.00               | 0.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | L626,533.44  |                    |             |                       |             |                 |             | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              |              |                    | L234,273.09 |                       | L370,698.63 |                 | L604,971.72 | 96.56%   |

|                    |                                                   |    |        |           |                      |        |                      |      |                    |
|--------------------|---------------------------------------------------|----|--------|-----------|----------------------|--------|----------------------|------|--------------------|
| <b>E. TRAMO 3</b>  |                                                   |    |        |           |                      |        |                      |      |                    |
| 38                 | TRAZADO CON TEODOLITO                             | ML | 75.00  | 135.02    | 12,626.50            | 75.00  | 12,626.50            | 0.00 | 10.00              |
| 39                 | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)       | M3 | 164.25 | 1124.20   | 120,399.85           | 141.75 | 117,605.35           | 0.00 | 10.00              |
| 40                 | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                | M3 | 213.53 | 1153.07   | 132,685.04           | 184.28 | 128,207.74           | 0.00 | 10.00              |
| 41                 | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 82.13  | 1705.85   | 157,971.46           | 82.13  | 157,971.46           | 0.00 | 10.00              |
| 42                 | COMFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA          | M2 | 547.50 | 139.39    | 121,566.03           | 472.50 | 118,611.78           | 0.00 | 10.00              |
| 43                 | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO   | M3 | 82.13  | 15,364.66 | 1,440,599.53         | 70.88  | 1,380,247.10         | 0.00 | 10.00              |
| 44                 | CORTADO DE CONCRETO                               | ML | 182.50 | 110.56    | 11,927.20            | 182.50 | 11,927.20            | 0.00 | 10.00              |
| 45                 | CURADO DE LOSA                                    | M2 | 547.50 | 134.06    | 118,647.85           | 472.50 | 116,093.35           | 0.00 | 10.00              |
| 46                 | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 PY= 2,800 KG/CM2       | KG | 35.28  | 137.10    | 11,308.89            | 35.28  | 11,308.89            | 0.00 | 10.00              |
| 47                 | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                 | ML | 130.00 | 1263.55   | 134,261.50           | 130.00 | 134,261.50           | 0.00 | 10.00              |
| 48                 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4    | ML | 20.00  | 1214.95   | 14,299.00            | 0.00   | 0.00                 | 0.00 | 10.00              |
| 49                 | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)        | ML | 257.50 | 162.28    | 116,037.10           | 0.00   | 0.00                 | 0.00 | 10.00              |
| <b>SUB TOTAL</b>   |                                                   |    |        |           | <b>1652,379.94</b>   |        | <b>1558,860.86</b>   |      | <b>10.00</b>       |
| <b>F. TRAMO 4</b>  |                                                   |    |        |           |                      |        |                      |      |                    |
| 50                 | TRAZADO CON TEODOLITO                             | ML | 74.80  | 135.02    | 12,619.50            | 74.80  | 12,619.50            | 0.00 | 10.00              |
| 51                 | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)       | M3 | 163.81 | 1124.20   | 120,345.20           | 144.00 | 117,884.80           | 0.00 | 10.00              |
| 52                 | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                | M3 | 212.96 | 1153.07   | 132,597.79           | 187.20 | 128,654.70           | 0.00 | 10.00              |
| 53                 | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 81.91  | 1705.85   | 157,816.17           | 72.00  | 150,821.20           | 0.00 | 10.00              |
| 54                 | COMFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA          | M2 | 546.04 | 139.39    | 121,508.52           | 480.00 | 118,907.20           | 0.00 | 10.00              |
| 55                 | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO   | M3 | 81.91  | 15,364.66 | 1,439,419.30         | 72.00  | 1,386,255.52         | 0.00 | 10.00              |
| 56                 | CORTADO DE CONCRETO                               | ML | 182.01 | 110.56    | 11,927.03            | 182.01 | 11,927.03            | 0.00 | 10.00              |
| 57                 | CURADO DE LOSA                                    | M2 | 182.01 | 134.06    | 16,199.26            | 182.01 | 16,199.26            | 0.00 | 10.00              |
| 58                 | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 PY= 2,800 KG/CM2       | KG | 546.04 | 137.10    | 120,258.08           | 130.50 | 14,841.55            | 0.00 | 10.00              |
| 59                 | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                 | ML | 129.60 | 1263.55   | 134,156.08           | 75.00  | 114,389.83           | 0.00 | 10.00              |
| 60                 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4    | ML | 20.00  | 1214.95   | 14,299.00            | 0.00   | 0.00                 | 0.00 | 10.00              |
| 61                 | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)        | ML | 256.81 | 162.28    | 115,994.13           | 0.00   | 0.00                 | 0.00 | 10.00              |
| <b>SUB TOTAL</b>   |                                                   |    |        |           | <b>1657,135.05</b>   |        | <b>1537,872.01</b>   |      | <b>10.00</b>       |
| <b>MONTO TOTAL</b> |                                                   |    |        |           | <b>12,723,358.48</b> |        | <b>11,500,460.96</b> |      | <b>1905,835.18</b> |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ESTIMACION #3            | 1905,835.18  |
| MENOS 15% DE ANTICIPO    | 1,135,875.28 |
| MENOS 5% CALIDAD DE OBRA | 145,291.76   |
| NETO A PAGAR             | 1,724,668.14 |

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y represento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor



|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>FIRMA: <br>NOMBRE: ING. WALTER VALDERRAMAN | <br>FIRMA: <br>NOMBRE: ING. JOSE MARIA ALVARO | <br>FIRMA: <br>NOMBRE: ING. JOSE MARIA ALVARO | <br>FIRMA: <br>NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO | <br>FIRMA: <br>NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ |
| FECHA: 4 DE OCTUBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                             | FECHA: 4 DE OCTUBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                            | FECHA: 4 DE OCTUBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                            | FECHA: 4 DE OCTUBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                      | FECHA: 4 DE OCTUBRE DEL 2021                                                                                                                                                                                        |

## INFORME FOTOGRAFICO 3

PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES  
ALTERNAS AL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE.

FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

CICH: 5828




Capturas fotográficas de los trabajos realizados en el periodo del 17 de septiembre al 4 octubre de 2021.


1. Losa de concreto de 4,000 lb/plg<sup>2</sup> y 15 cms de espesor en calle #1.




2. Acabado de pavimento en calle #1.

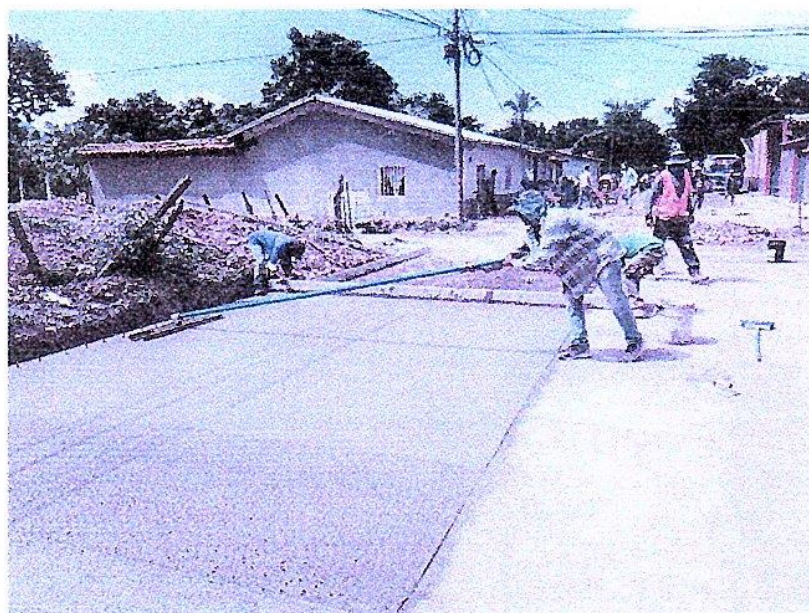


3. Curado de losa de concreto en calle #1.

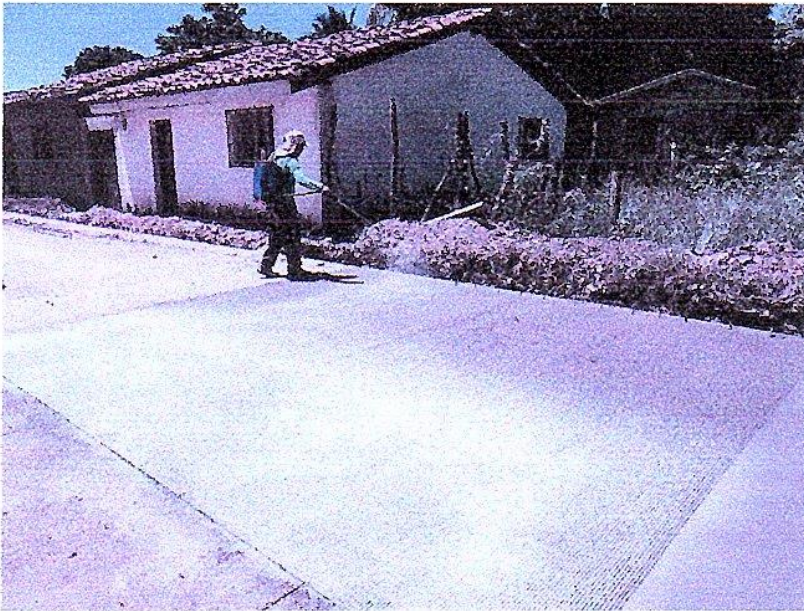


4. Corte de concreto en calle #1.

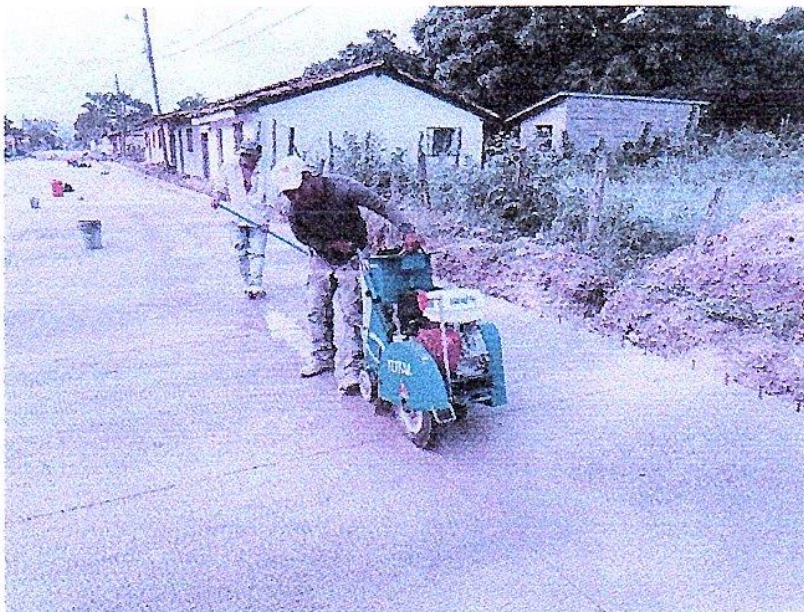

5. Bordillo de concreto de 15x15 cms en calle #1.

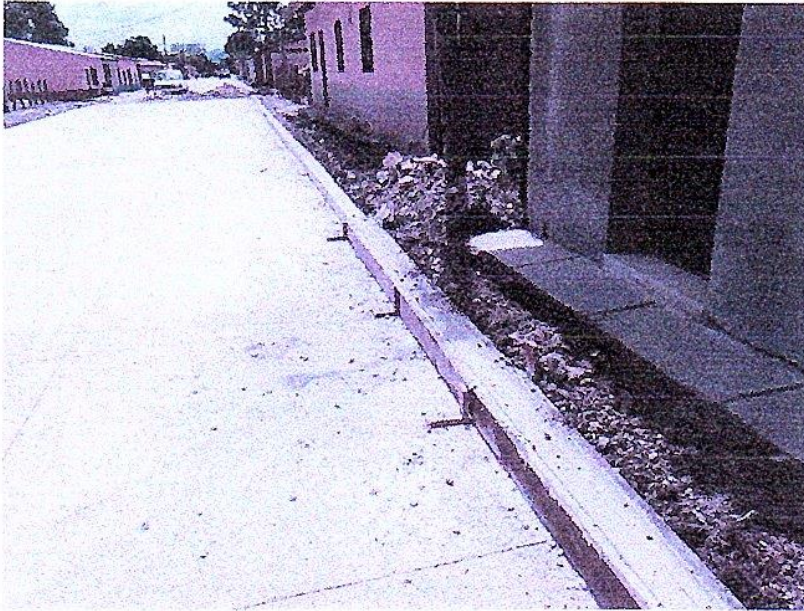


6. Bordillo de concreto en calle #2.

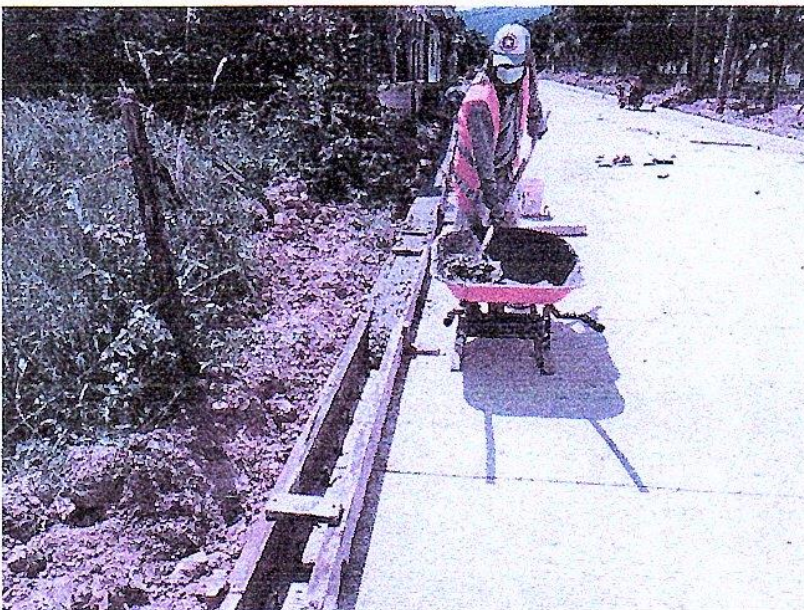

9. Calle #1.



10. Calle #2.

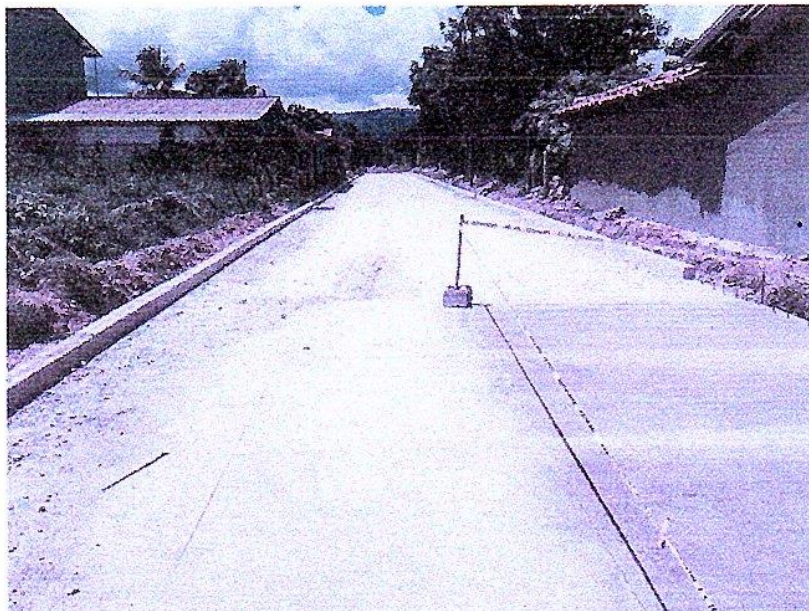

A circular stamp with a signature over it.

22/ Sept / 2021

Hoja

Nº 000013

El día de hoy se funde 30 ml con  
concreto hidráulico de 4000 PSI en  
Calle # 2.

En la Calle # 2 nos encontramos en  
estación 0+075. Fundidos por ambos  
un total de  $75 \times 6.3 = 472.5 \text{ m}^2$   
Fundidos.

También se funde bordillo de concreto  
en calle # 4.



23/ Sept / 2021

El día de hoy se inició Fundación  
con concreto hidráulico en Calle # 1  
con 24 ml y ancho de 4.15 con  
total fundido el día de hoy  $99.6 \text{ m}^2$   
Cerrado de obra de  $99.6 \text{ m}^2$ .

También se cortó concreto en Calle # 1  
se trabaja en fundición de bordillo  
de  $15 \times 15$  en Calle # 2 con 30 ml  
Fundidos.



25/Sept/2021

Hoja

Nº 000014

El día de hoy se fundió el tramo pendiente en calle #4, Tramo que se estaba reparando caja de Registro y Tubero por parte de Bermudez.



29/Sept/2021

El día de hoy Bermudez se encuentra Reparando Válvula de agua potable que tiene fuga de agua...  
También se Reparó por la fuga por fuga de agua de la Válvula.  
Reparando Terreno en calle #1 en estación 0+060 - 0+071 con ancho de 1.20 y profundidad de 40 cm.

También se fundió 32 ml en ancho de 4.15 ml en total de 91.3 m<sup>2</sup> Curado de obra 91.3 m<sup>2</sup>  
También se trabaja en forjado de concreto en calle #2





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2021

Hora : 02:33 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13873

L.: 446,949.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10169Fecha de Emisión: 20/9/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: WALTER DAVID GUZMAN SALINASId/RTN: 1204198200038La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de la segunda estimación del Proyecto de Pavimentación Hidráulica de calles de los Barrios El Porvenir y La Violeta y calles alternas del Barrio El Porvenir por la cantidad de L. 446,949.66

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                | MONTO      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12 07 001 000 001 47210 11-001-01 | Construcción de Calles Pavimentadas 700 metros calle del Barrio Porvenir y La Violeta. | 446,949.66 |

| CODIGO | DESCRIPCION           | MONTO |
|--------|-----------------------|-------|
|        | Total de retenciones: | 0.00  |

| CODIGO    | DESCRIPCION                       | MONTO             |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 446,949.66        |
|           | <b>Monto Total:</b>               | <b>446,949.66</b> |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SUBTOTAL                    | 446,949.66        |
| - RETENCIONES               | 0.00              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>446,949.66</b> |





Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Walter David Guzman SalinasIdentidad No.: 1204-1982-00038

0s+js/9Jmcy/LQzMDGUq2WlqgyZA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNIhLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S96hAcBcksp5CG63wTpcIZYRTUbrXi8yWLRWUXY0zf+FGqF3I/+c  
NvzqinGPjIK54N1AjtMqgCBNxxqFmTAZQj



CAI: 5E1DDF-54CFE8-674C94-9B226C-827DDA-0C

Dirección: Come La Paz

Gráficas Printmaker Cel.: (504) 3320-7800 R.T.N. 08011978010631 / Certificación N° 9231-21-10500-17





ESTIMACION DE OBRA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE  
PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES ALTERNAS AL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE  
UBICACION: BARRIO PORVENIR Y BARRIO LA VIOLETA CANE, LA PAZ  
EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS  
ESTIMACION: 2  
PERIODO DEL: 06/09/2021 HASTA 17/09/2021 11 DIAS

| No.                 | CONCEPTOS                                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | EJEC. EN ESTE PERIODO | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|
| A. TRAMO 1          |                                                     |        |          |              |              |                    |                       |                 |          |
| 1                   | TRAZADO CON TEODOLITO                               | ML     | 71.60    | 135.02       | 12,507.43    | 71.60              | 0.00                  | 71.60           | 100.00%  |
| 2                   | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 178.28   | 1124.20      | 122,142.38   | 178.28             | 0.00                  | 178.28          | 100.00%  |
| 3                   | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDIO                    | M3     | 231.77   | 1153.07      | 135,477.03   | 231.77             | 0.00                  | 231.77          | 100.00%  |
| 4                   | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   | M3     | 89.14    | 1705.85      | 162,919.47   | 89.14              | 0.00                  | 89.14           | 100.00%  |
| 5                   | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA            | M2     | 594.28   | 139.39       | 123,408.69   | 594.28             | 0.00                  | 594.28          | 100.00%  |
| 6                   | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO     | M3     | 89.14    | 15,364.66    | 1,478,205.79 | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 7                   | CORTADO DE CONCRETO                                 | ML     | 198.09   | 110.56       | 12,091.83    | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 8                   | CURADO DE LOSA                                      | M2     | 594.28   | 134.06       | 120,241.18   | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 9                   | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2         | KG     | 40.32    | 137.10       | 11,495.87    | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 10                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                   | ML     | 123.20   | 1263.55      | 132,469.36   | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 11                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4      | ML     | 20.00    | 1214.95      | 14,299.00    | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 12                  | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)          | ML     | 269.69   | 162.28       | 116,796.29   | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | 1,702,054.32 | 1,146,455.00       | 10.00                 | 1,146,455.00    | 20.86%   |
| B. PAVIMENTOS       |                                                     |        |          |              |              |                    |                       |                 |          |
| 13                  | MOVILIZACION DE EQUIPO                              | GLB    | 1.00     | 123,000.00   | 123,000.00   | 1.00               | 0.00                  | 1.00            | 100.00%  |
| 14                  | ROTULO FHS METALICO 3'X8" INCLUYE PATAS             | UND    | 1.00     | 11,150.00    | 11,150.00    | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 15                  | ADMINISTRACION DELEGADA                             | GLB    | 1.00     | 140,250.00   | 140,250.00   | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | 164,400.00   | 123,000.00         | 10.00                 | 123,000.00      | 35.71%   |
| C. OBRAS DE DRENAJE |                                                     |        |          |              |              |                    |                       |                 |          |
| 16                  | DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO NO INCL. BASE    | M3     | 0.11     | 1,225.63     | 124.82       | 0.00               | 0.00                  | 0.00            | 0.00%    |
| 17                  | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 0.36     | 1,186.46     | 167.13       | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 18                  | LOSA DE CONCRETO E= 10 CMS N 2 A/C 20 CMS A/S       | M2     | 0.48     | 1,906.57     | 1,435.15     | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 19                  | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CMS                    | M2     | 1.92     | 1,599.35     | 11,150.75    | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 20                  | SOLERA DE 10 X 15 CMS, #2 @ 15CMS CONCRETO 1:2:2    | ML     | 3.20     | 1,238.69     | 1,763.81     | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 21                  | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E= 2 CMS MORTERO DE 1:4 | M2     | 1.92     | 1,200.22     | 1,384.42     | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 22                  | REJILLA DE VARILLA DE 1/2"                          | M2     | 0.48     | 12,990.00    | 11,435.20    | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 23                  | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" RD-41            | ML     | 66.00    | 1163.24      | 110,773.84   | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 24                  | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 6"                 | ML     | 66.00    | 139.24       | 12,589.84    | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| 25                  | CAJA DE REGISTRO DE 0.80X0.80X0.85                  | M      | 1.00     | 13,280.77    | 13,280.77    | 0.00               | 0.00                  | 10.00           | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | 120,905.73   | 10.00              | 10.00                 | 10.00           | 0.00%    |
| D. TRAMO 2          |                                                     |        |          |              |              |                    |                       |                 |          |
| 26                  | TRAZADO CON TEODOLITO                               | ML     | 82.53    | 135.02       | 12,890.20    | 82.53              | 0.00                  | 82.53           | 100.00%  |
| 27                  | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 155.98   | 1124.20      | 119,372.72   | 155.98             | 0.00                  | 155.98          | 100.00%  |
| 28                  | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDIO                    | M3     | 202.78   | 1153.07      | 131,039.53   | 202.78             | 0.00                  | 202.78          | 100.00%  |
| 29                  | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   | M3     | 77.99    | 1705.85      | 155,049.24   | 77.99              | 0.00                  | 77.99           | 100.00%  |
| 30                  | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA            | M2     | 519.94   | 139.39       | 120,480.44   | 519.94             | 0.00                  | 519.94          | 100.00%  |
| 31                  | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO     | M3     | 77.99    | 15,364.66    | 1,418,389.83 | 0.00               | 0.00                  | 18.43           | 23.63%   |
| 32                  | CORTADO DE CONCRETO                                 | ML     | 173.31   | 110.56       | 11,830.15    | 0.00               | 102.00                | 102.00          | 58.85%   |
| 33                  | CURADO DE LOSA                                      | M2     | 519.94   | 134.06       | 117,709.16   | 0.00               | 122.85                | 122.85          | 23.63%   |
| 34                  | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2         | KG     | 35.28    | 137.10       | 11,308.89    | 0.00               | 35.28                 | 35.28           | 100.00%  |
| 35                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                   | ML     | 145.06   | 1263.55      | 138,230.56   | 0.00               | 10.00                 | 10.00           | 0.00%    |
| 36                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4      | ML     | 20.00    | 1214.95      | 14,299.00    | 0.00               | 0.00                  | 0.00            | 0.00%    |
| 37                  | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)          | ML     | 255.84   | 162.28       | 115,933.72   | 0.00               | 0.00                  | 0.00            | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | 1,626,533.44 | 1,128,832.13       | 1,105,440.96          | 1,234,273.09    | 37.39%   |

|                    |                                                   |    |        |                      |              |        |                     |        |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------|--------|---------------------|--------|----------------------|
| <b>E. TRAMO 3</b>  |                                                   |    |        |                      |              |        |                     |        |                      |
| 38                 | TRAZADO CON TEODOLITO                             | ML | 75.00  | 135.02               | 12,626.50    | 75.00  | 12,626.50           | 0.00   | 10.00                |
| 39                 | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)       | M3 | 104.25 | 1124.20              | 120,399.85   | 104.25 | 117,605.35          | 0.00   | 141.75               |
| 40                 | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                | M3 | 213.53 | 1153.07              | 132,685.04   | 184.28 | 128,207.74          | 0.00   | 184.28               |
| 41                 | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 82.13  | 1705.85              | 157,971.46   | 82.13  | 157,971.46          | 0.00   | 82.13                |
| 42                 | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA          | M2 | 547.50 | 139.39               | 121,566.03   | 472.50 | 118,611.78          | 0.00   | 472.50               |
| 43                 | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO   | M3 | 82.13  | 15,364.66            | 1,440,599.53 | 70.88  | 1,380,247.10        | 0.00   | 70.88                |
| 44                 | CORTADO DE CONCRETO                               | ML | 182.50 | 110.56               | 11,927.20    | 182.50 | 11,927.20           | 0.00   | 182.50               |
| 45                 | CURADO DE LOSA                                    | M2 | 547.50 | 134.06               | 118,647.85   | 472.50 | 116,093.35          | 0.00   | 472.50               |
| 46                 | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2       | KG | 35.28  | 137.10               | 11,308.89    | 35.28  | 11,308.89           | 0.00   | 35.28                |
| 47                 | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                 | ML | 130.00 | 1263.55              | 134,261.50   | 0.00   | 134,261.50          | 130.00 | 130.00               |
| 48                 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4    | ML | 20.00  | 1214.95              | 14,299.00    | 0.00   | 10.00               | 0.00   | 10.00                |
| 49                 | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)        | ML | 257.50 | 162.28               | 116,037.10   | 0.00   | 10.00               | 0.00   | 0.00                 |
| <b>SUB TOTAL</b>   |                                                   |    |        | <b>1652,329.94</b>   |              |        | <b>134,261.50</b>   |        | <b>1558,860.86</b>   |
| <b>F. TRAMO 4</b>  |                                                   |    |        |                      |              |        |                     |        |                      |
| 50                 | TRAZADO CON TEODOLITO                             | ML | 74.80  | 135.02               | 12,619.50    | 74.80  | 12,619.50           | 0.00   | 74.80                |
| 51                 | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)       | M3 | 163.81 | 1124.20              | 120,345.70   | 144.00 | 117,884.80          | 0.00   | 144.00               |
| 52                 | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                | M3 | 212.96 | 1153.07              | 132,597.79   | 187.20 | 128,654.70          | 0.00   | 187.20               |
| 53                 | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 81.91  | 1705.85              | 157,816.17   | 72.00  | 150,821.20          | 0.00   | 72.00                |
| 54                 | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA          | M2 | 546.04 | 139.39               | 121,508.52   | 480.00 | 118,907.20          | 0.00   | 480.00               |
| 55                 | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO   | M3 | 81.91  | 15,364.66            | 1,439,419.30 | 0.00   | 10.00               | 72.00  | 72.00                |
| 56                 | CORTADO DE CONCRETO                               | ML | 182.01 | 110.56               | 11,922.03    | 0.00   | 10.00               | 182.01 | 182.01               |
| 57                 | CURADO DE LOSA                                    | M2 | 182.01 | 134.06               | 16,199.26    | 0.00   | 10.00               | 182.01 | 16,199.26            |
| 58                 | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2       | KG | 546.04 | 137.10               | 120,258.08   | 0.00   | 10.00               | 130.50 | 130.50               |
| 59                 | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                 | ML | 129.60 | 1263.55              | 134,156.08   | 0.00   | 10.00               | 75.00  | 75.00                |
| 60                 | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4    | ML | 20.00  | 1214.95              | 14,299.00    | 0.00   | 10.00               | 0.00   | 0.00                 |
| 61                 | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)        | ML | 256.81 | 162.28               | 115,994.13   | 0.00   | 10.00               | 0.00   | 0.00                 |
| <b>SUB TOTAL</b>   |                                                   |    |        | <b>1657,135.05</b>   |              |        | <b>1418,984.61</b>  |        | <b>1537,872.01</b>   |
| <b>MONTO TOTAL</b> |                                                   |    |        | <b>12,723,358.48</b> |              |        | <b>1,941,773.89</b> |        | <b>11,500,460.96</b> |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ESTIMACION #2            | L558,687.07  |
| MENOS 15% DE ANTICIPO    | 183,803.06   |
| MENOS 5% CALIDAD DE OBRA | 127,934.35   |
| NETO A PAGAR             | 1,446,949.66 |

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad, y comprometo a las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

|                                                                                              |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |         |         |         |
| FIRMA:  | FIRMA:  | FIRMA:  | FIRMA:  |
| NOMBRE: ING. WALTER GUZMAN                                                                   | NOMBRE: ING. JOSE DINAS ASTURIAS                                                            | NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO                                                                 | NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ                                                             |
| FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                             | FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                            | FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                           | FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021                                                           |

## INFORME FOTOGRAFICO 2

PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES  
ALTERNAS AL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE.

FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES


EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

CICH: 5828




Capturas fotográficas de los trabajos realizados en el periodo del 6 al 17 de septiembre de 2021.

1. Losa de concreto de 4,000 lb/plg<sup>2</sup> y 15 cms de espesor.

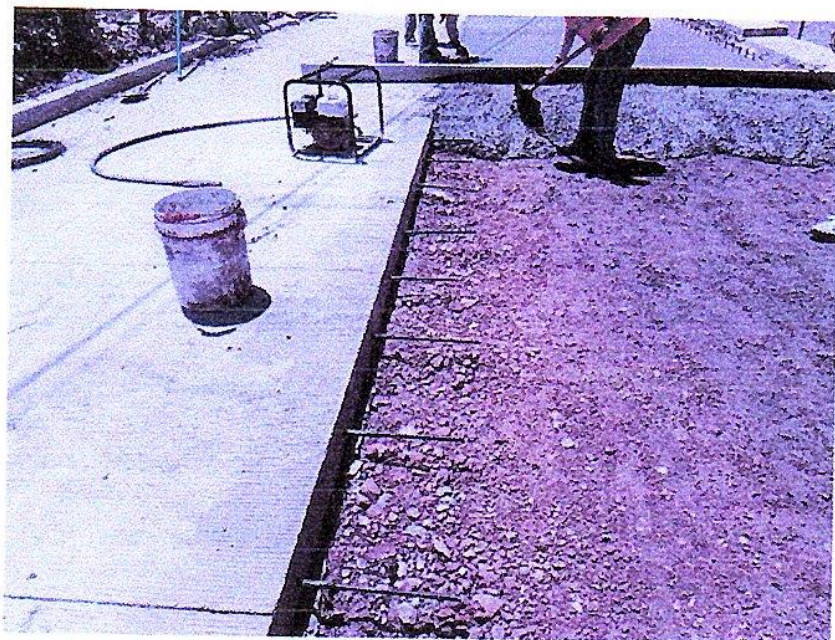


2. Vibrado de concreto.



3. Acabado de pavimento.




4. Curado de losa de pavimento.

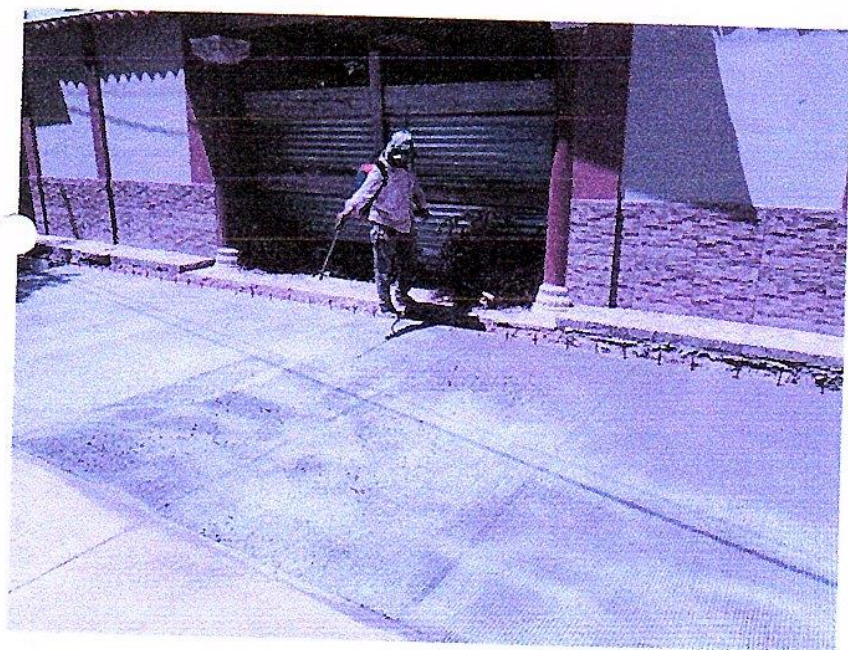


WALTER DAVID GUZMAN SALINAS  
INGENIERO  
C.R.A.  
19-10-12  
24-10-12  
C.O.H., No. 5878

5. Junta longitudinal Varilla #4 de 75 cms @ 50 cms.

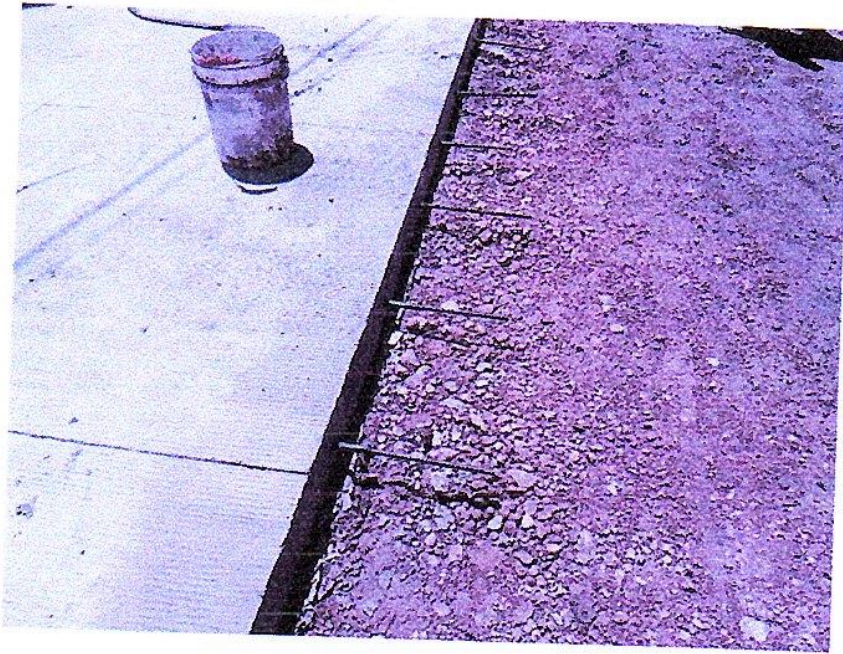

6. Bordillo de concreto de 15x15 cms.

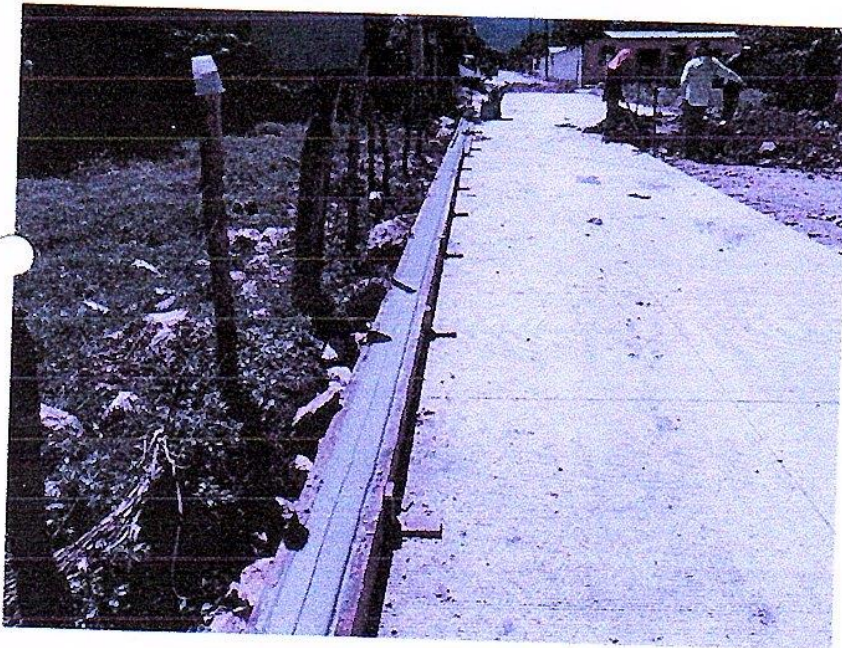

WALTER DAVID GUZMAN S. INGENIERO CIVIL 19-10-12 24-10-12 C.H. No. 500

15/sept/2021


Hoja

Nº 000011

el día de hoy se trabaja en fundición de los de concreto de 4.600 PSI en calle #2 y se fundieron.

$15 \times 3.15 = 47.25 \text{ m}^2$  También se curó concreto con P1000 ADHIX. También en junta longitudinal se coloca varilla de #4 @ 50 cm con longitud de 75 cm.

También se trabaja en bordillo de concreto de  $15 \times 15$  cm en calle #3. El día de hoy se trabaja en calle #2 por motivo que se encuentra tubería de coque de Registro Rápido.

  
Walter David Guzman Salinas




16/sept/2021

se trabaja en fundición de los de concreto de 4000 PSI/plz en calle #2 fundidos  $30 \text{ m} \times 3.15 = 94.5 \text{ m}^2$  También se curaron  $94.5 \text{ m}^2$  se realizó bordillo de concreto en calle #4. También en calle #4 por estación 0+020 con de yitio se realiza trabajo de elevación por obstrucción de tubería de aguas negras en caso de Registro de yitio la cual es realizada por

Bitácora

Nº 08



17/Sept/2021

Se trabaja en calle #4 con fundición de losa de concreto con su respectivo curado  $30ml \times 3.20 = 96 m^2$ .

También se funda bndillo de concreto de  $13 \times 15$  cm en calle #4.  
Permanece continuo por trabajo de Reparación de tuberías obstruidas en calle #4.



18/Sept/2021


Se trabaja en fundición de losa de pavimento en calle #2.

y Curado  $21ml \times 3.15 = 66.15 m^2$   
Permanece continuo con trabajo de Reparación de Tuberías Personal en obra.

3 albañiles  
14 ayudantes

Equipo

1 Mezcladora de 1 baco.  
1 Vibrador de concreto.  
1 cortador de concreto.



007614000219

ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ  
AL NORTE DE PLAZA SAN FRANCISCO  
TEL 27744067

CHEQUE No. 00008335

Cane, 20/09/2021  
Lugar y Fecha

Walter David Guzman Salinas  
Páguese a la orden de

L 446,949.66

Cuatrocientos Cuarenta y Seis mil novecientos Cuarenta y nueve con 66/100  
Cantidad en letras Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.



Firma(s)



⑈01001142⑈00007614000218⑈00008335

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

WALTER DAVID / GUZMAN SALINAS



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL: 03 AGOSTO 1982  
SEXO: MASCULINO  
EMITIDA EL: 11 OCTUBRE 2017

1204-1982-00038



03813325-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo oirá lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1204  
WALTER DAVID / GUZMAN SALINAS  
1204-1982-00038



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13847

L.: 753,419.11

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10142

Fecha de Emisión: 7/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

Id/RTN: 1204198200038

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de la primera estimación del Proyecto de Pavimentación Hidráulica de calles de los Barrios El Porvenir y La Violeta y calles alternas del Barrio El Porvenir por la cantidad de L. 753,419.11

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                                                | MONTO      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 11 00 012 000 001 47210 15-013-01 | Construcción de Calles Pavimentadas, calle del Barrio Porvenir y La Violeta del Municipio Casco Urbano | 281,752.68 |
| 15 02 001 000 001 47210 11-001-01 | Construcción de Calles Pavimentadas, calle del Barrio Porvenir y La Violeta del Municipio Casco Urbano | 471,666.43 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO      |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 281,752.68 |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 471,666.43 |
| Monto Total:                          |                                   | 753,419.11 |



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2021

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |            |
|-----------------------------|------------|
| SUBTOTAL                    | 753,419.11 |
| - RETENCIONES               | 0.00       |
| TOTAL                       | 753,419.11 |

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Walter David Guzmán Salas

Identidad No.:

1204-1982-000380s+js/j9Jmcy/LQzMdGUq2WlqgyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNlhLqIXe7rg6v7BoxqUNU8S96hAcBCKsp5CUB3wTpCIZYRTUbfXi8yWLRWUXY0zf+FGqF3l/+c  
NvzqinGPjIK54N1AjtMgqkCBNxxqFmTAZQj



**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**  
Gráficas Printmaker Cel.: (504) 3320-7800 R.T.N. 08011978010631 / Certificación N° 9231-21-10500-17

TOTAL LPS.

|            |
|------------|
| 753,419.11 |
|------------|




ESTIMACION DE OBRA  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE  
PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES ALTERNAS AL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE  
UBICACION: CASCO URBANO CANE, LA PAZ  
EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS  
ESTIMACION: 1  
PERIODO DEL: 02/08/2021 HASTA 06/09/2021 35 DIAS

| No.                 | CONCEPTOS                                           | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR |       | EJEC. EN ESTE PERIODO |             | TOTAL ACUMULADO |             | % AVANCE |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|--------------------|-------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|----------|
|                     |                                                     |        |          |              |              | CANTIDAD           | MONTO | CANTIDAD              | MONTO       | CANTIDAD        | MONTO       |          |
| A. TRAMO 1          |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| 1                   | TRAZADO CON TEODOLITO                               | ML     | 71.60    | L35.02       | L2,507.43    |                    |       | 71.60                 | L2,507.43   | 71.60           | L2,507.43   | 100.00%  |
| 2                   | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 178.28   | L124.20      | L22,142.38   |                    |       | 178.28                | L22,142.38  | 178.28          | L22,142.38  | 100.00%  |
| 3                   | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                  | M3     | 231.77   | L153.07      | L35,477.03   |                    |       | 231.77                | L35,477.03  | 231.77          | L35,477.03  | 100.00%  |
| 4                   | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   | M3     | 89.14    | L705.85      | L62,919.47   |                    |       | 89.14                 | L62,919.47  | 89.14           | L62,919.47  | 100.00%  |
| 5                   | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA            | M2     | 594.28   | L39.39       | L23,408.69   |                    |       | 594.28                | L23,408.69  | 594.28          | L23,408.69  | 100.00%  |
| 6                   | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO     | M3     | 89.14    | L5,364.66    | L478,205.79  |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 7                   | CORTADO DE CONCRETO                                 | ML     | 198.09   | L10.56       | L2,091.83    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 8                   | CURADO DE LOSA                                      | M2     | 594.28   | L34.06       | L20,241.18   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 9                   | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2         | KG     | 40.32    | L1,495.87    | L37,100.00   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 10                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                   | ML     | 123.20   | L263.55      | L32,469.36   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 11                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4      | ML     | 20.00    | L214.95      | L4,299.00    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 12                  | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)          | ML     | 269.69   | L62.28       | L16,796.29   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | L702,054.32  |                    |       |                       | L146,455.00 |                 | L146,455.00 | 20.86%   |
| B. PAVIMENTOS       |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| 13                  | MOVILIZACION DE EQUIPO                              | GLB    | 1.00     | L23,000.00   | L23,000.00   |                    |       | 1.00                  | L23,000.00  | 1.00            | L23,000.00  | 100.00%  |
| 14                  | ROTULO FHS METALICO 2'X8" INCLUYE PATAS             | UND    | 1.00     | L1,150.00    | L1,150.00    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 15                  | ADMINISTRACION DELEGADA                             | GLB    | 1.00     | L40,250.00   | L40,250.00   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | L64,400.00   |                    |       |                       | L23,000.00  |                 | L23,000.00  | 35.71%   |
| C. OBRAS DE DRENAJE |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| 16                  | DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO NO INCL. BASE    | M3     | 0.11     | L225.63      | L24.82       |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 17                  | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 0.36     | L186.46      | L67.13       |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 18                  | LOSA DE CONCRETO E= 10 CMS N 2 A/C 20 CMS A/S       | M2     | 0.48     | L906.57      | L435.15      |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 19                  | PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CMS                    | M2     | 1.92     | L599.35      | L1,150.75    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 20                  | SOLERA DE 10 X 15 CMS, #2 @ 15CMS CONCRETO 1:2:2    | ML     | 3.20     | L238.69      | L763.81      |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 21                  | REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E= 2 CMS MORTERO DE 1:4 | M2     | 1.92     | L200.22      | L384.42      |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 22                  | REJILLA DE VARILLA DE 1/2"                          | M2     | 0.48     | L2,990.00    | L1,435.20    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 23                  | SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" RD-41            | ML     | 66.00    | L163.24      | L10,773.84   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 24                  | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 6"                 | ML     | 66.00    | L39.24       | L2,589.84    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 25                  | CAJA DE REGISTRO DE 0.80X0.80X0.85                  | M      | 1.00     | L3,280.77    | L3,280.77    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | L20,905.73   |                    |       |                       | L0.00       |                 | L0.00       | 0.00%    |
| D. TRAMO 2          |                                                     |        |          |              |              |                    |       |                       |             |                 |             |          |
| 26                  | TRAZADO CON TEODOLITO                               | ML     | 82.53    | L35.02       | L2,890.20    |                    |       | 82.53                 | L2,890.20   | 82.53           | L2,890.20   | 100.00%  |
| 27                  | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)         | M3     | 155.98   | L124.20      | L19,372.72   |                    |       | 155.98                | L19,372.72  | 155.98          | L19,372.72  | 100.00%  |
| 28                  | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                  | M3     | 202.78   | L153.07      | L31,039.53   |                    |       | 202.78                | L31,039.53  | 202.78          | L31,039.53  | 100.00%  |
| 29                  | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)   | M3     | 77.99    | L705.85      | L55,049.24   |                    |       | 77.99                 | L55,049.24  | 77.99           | L55,049.24  | 100.00%  |
| 30                  | CONFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA            | M2     | 519.94   | L39.39       | L20,480.44   |                    |       | 519.94                | L20,480.44  | 519.94          | L20,480.44  | 100.00%  |
| 31                  | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO     | M3     | 77.99    | L5,364.66    | L418,389.83  |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 32                  | CORTADO DE CONCRETO                                 | ML     | 173.31   | L10.56       | L1,830.15    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 33                  | CURADO DE LOSA                                      | M2     | 519.94   | L34.06       | L17,709.16   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 34                  | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2         | KG     | 35.28    | L37.10       | L1,308.89    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 35                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                   | ML     | 145.06   | L263.55      | L38,230.56   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 36                  | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4      | ML     | 20.00    | L214.95      | L4,299.00    |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| 37                  | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS)          | ML     | 255.84   | L62.28       | L15,933.72   |                    |       | 0.00                  | L0.00       | 0.00            | L0.00       | 0.00%    |
| SUB TOTAL           |                                                     |        |          |              | L626,532.44  |                    |       |                       | L128,832.13 |                 | L128,832.13 | 20.56%   |

| E. TRAMO 3  |                                                   |    |        |           |               |  |        |              |         |
|-------------|---------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------------|--|--------|--------------|---------|
| 38          | TRAZADO CON TEODOLITO                             | ML | 75.00  | 135.02    | 12,626.50     |  | 75.00  | 12,626.50    | 100.00% |
| 39          | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)       | M3 | 164.25 | 1124.20   | 120,399.85    |  | 141.75 | 117,605.35   | 86.30%  |
| 40          | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                | M3 | 213.53 | 1153.07   | 137,685.04    |  | 184.28 | 128,207.74   | 86.30%  |
| 41          | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 82.13  | 1705.85   | 157,971.46    |  | 82.13  | 157,971.46   | 100.00% |
| 42          | COMFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA          | M2 | 547.50 | 139.39    | 121,566.03    |  | 472.50 | 118,611.78   | 86.30%  |
| 43          | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO   | M3 | 82.13  | 15,364.66 | 1,440,599.53  |  | 70.88  | 1,380,247.10 | 86.30%  |
| 44          | CORTADO DE CONCRETO                               | ML | 182.50 | 110.56    | 11,927.20     |  | 182.50 | 11,927.20    | 100.00% |
| 45          | CURADO DE LOSA                                    | M2 | 547.50 | 134.06    | 118,647.85    |  | 472.50 | 116,093.35   | 86.30%  |
| 46          | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2       | KG | 35.28  | 137.10    | 11,308.89     |  | 35.28  | 11,308.89    | 100.00% |
| 47          | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                 | ML | 130.00 | 1263.55   | 134,261.50    |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| 48          | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4    | ML | 20.00  | 1214.95   | 14,299.00     |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| 49          | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPOSOR 15 CMS)        | ML | 257.50 | 162.28    | 116,037.10    |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| SUB TOTAL   |                                                   |    |        |           | 1,652,329.94  |  |        | 1,524,599.36 | 80.42%  |
| F. TRAMO 4  |                                                   |    |        |           |               |  |        |              |         |
| 50          | TRAZADO CON TEODOLITO                             | ML | 74.80  | 135.02    | 12,619.50     |  | 74.80  | 12,619.50    | 100.00% |
| 51          | EXCAVACION MATERIAL TIPO 1 (MATERIAL COMUN)       | M3 | 163.81 | 1124.20   | 120,345.20    |  | 144.00 | 117,884.80   | 87.91%  |
| 52          | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO                | M3 | 212.96 | 1153.07   | 137,597.79    |  | 187.20 | 128,654.70   | 87.90%  |
| 53          | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 81.91  | 1705.85   | 157,816.17    |  | 72.00  | 150,821.20   | 87.90%  |
| 54          | COMFORMACION DE CALLE CON MOTONIVELADORA          | M2 | 546.04 | 139.39    | 121,508.52    |  | 480.00 | 118,907.20   | 87.91%  |
| 55          | CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI INCLUYE ENCOFRADO   | M3 | 81.91  | 15,364.66 | 1,439,419.30  |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| 56          | CORTADO DE CONCRETO                               | ML | 182.01 | 110.56    | 11,922.03     |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| 57          | CURADO DE LOSA                                    | M2 | 182.01 | 134.06    | 16,199.26     |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| 58          | ACERO DE REFUERZO GRADO 40 FY= 2,800 KG/CM2       | KG | 546.04 | 137.10    | 120,258.08    |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| 59          | BORDILLO DE CONCRETO DE 15X15 CMS                 | ML | 129.60 | 1263.55   | 134,156.08    |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| 60          | BORDILLO DE CONCRETO DE 10 X 10 CMS CONC 1:2:4    | ML | 20.00  | 1214.95   | 14,299.00     |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| 61          | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPOSOR 15 CMS)        | ML | 256.81 | 162.28    | 115,994.13    |  | 0.00   | 0.00         | 0.00%   |
| SUB TOTAL   |                                                   |    |        |           | 1,657,135.05  |  |        | 1,118,887.40 | 18.09%  |
| MONTO TOTAL |                                                   |    |        |           | 12,723,358.48 |  |        | 1941,773.89  | 34.58%  |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| ESTIMACION #1            | 1941,773.89  |
| MENOS 15% DE ANTICIPO    | 1,141,266.08 |
| MENOS 5% CALIDAD DE OBRA | 1,47,088.69  |
| NETO A PAGAR             | 1,753,419.11 |

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad, y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

|                                 |                                                                                       |                                 |                                                                                       |                                 |                                                                                     |                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA:                          |  | FIRMA:                          |  | FIRMA:                          |  | FIRMA:                          |  |
|                                 | ING. WALTER DÁVILA                                                                    |                                 | ING. JOSE DIMAS ASTURIAS                                                              |                                 | FRANCISCO BUSTOS                                                                    |                                 | LUIS FERNANDO MARTINEZ                                                              |
| FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |                                                                                       | FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |                                                                                       | FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |                                                                                     | FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 |                                                                                     |



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-35603

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GUZMAN SALINAS WALTER DAVID**  
Con Registro Tributario Nacional: **12041982000380**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-35603 en fecha 13/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25715392762 de fecha 11/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27724576880, presentada el 05/02/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan,

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-35603** o mediante el siguiente código QR:



## INFORME FOTOGRAFICO 1

PROYECTO: PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES  
ALTERNAS AL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA  
PONCE.

FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES


EJECUTOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

CICH: 5828



**Capturas fotográficas de los trabajos realizados en el periodo.**


**1. Corte de material con motoniveladora.**

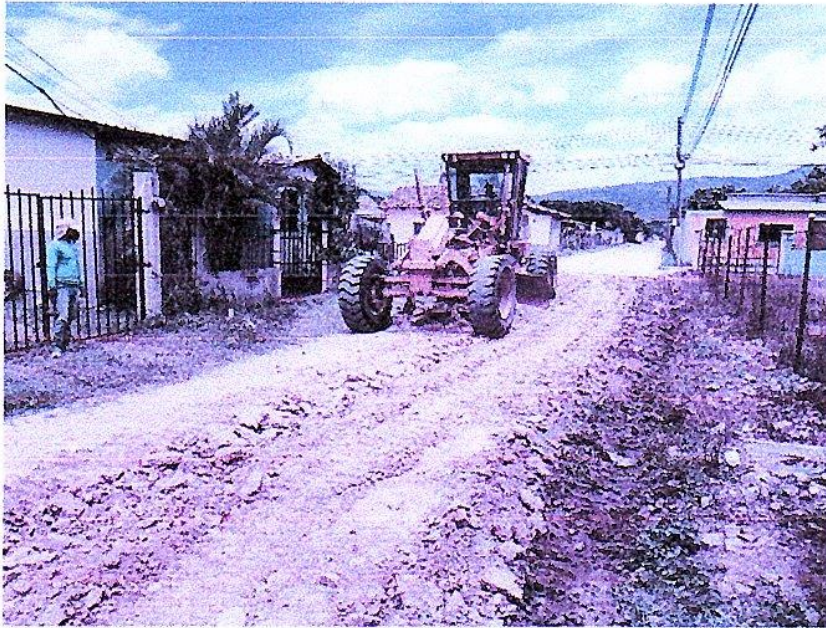


**2. Votado de material.**



5. Acabado de pavimento.

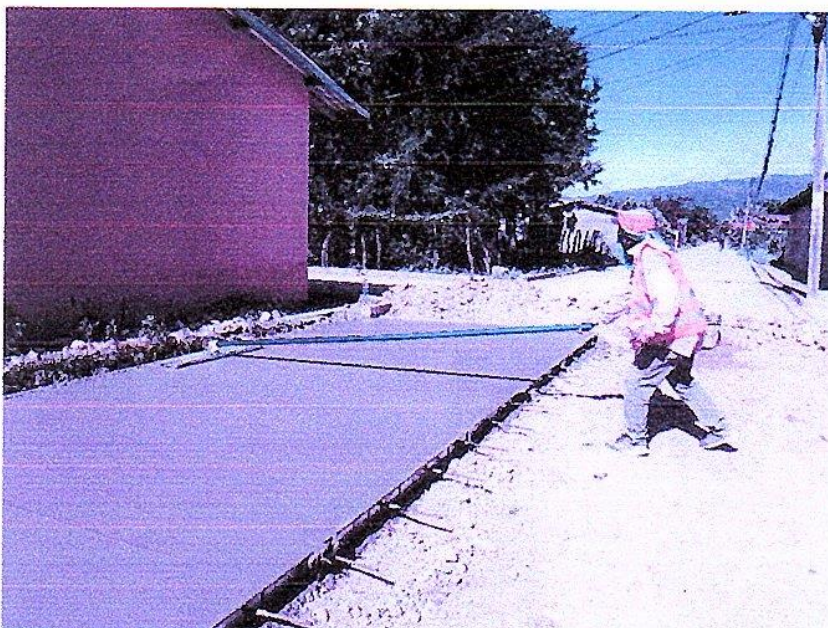


6. Curado de losa de pavimento.

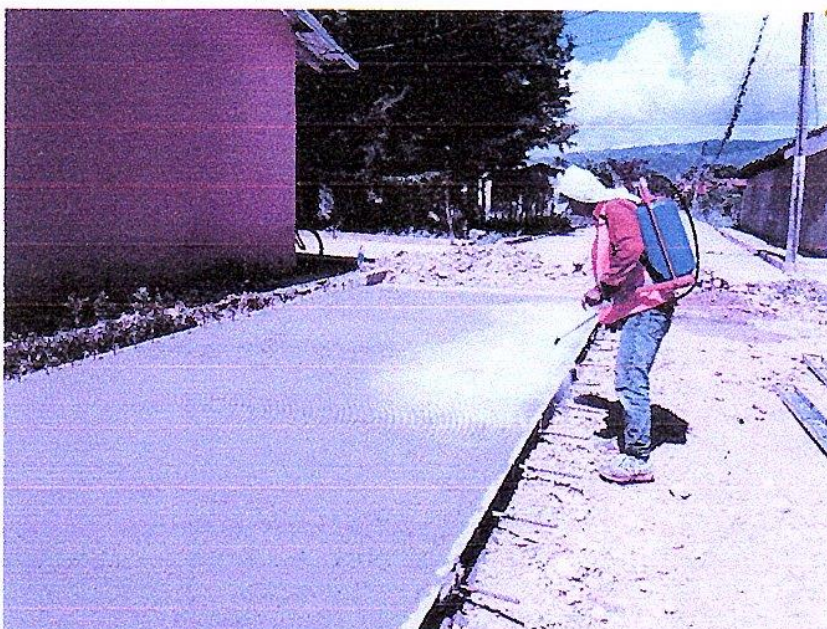


5. Acabado de pavimento.



6. Curado de losa de pavimento.

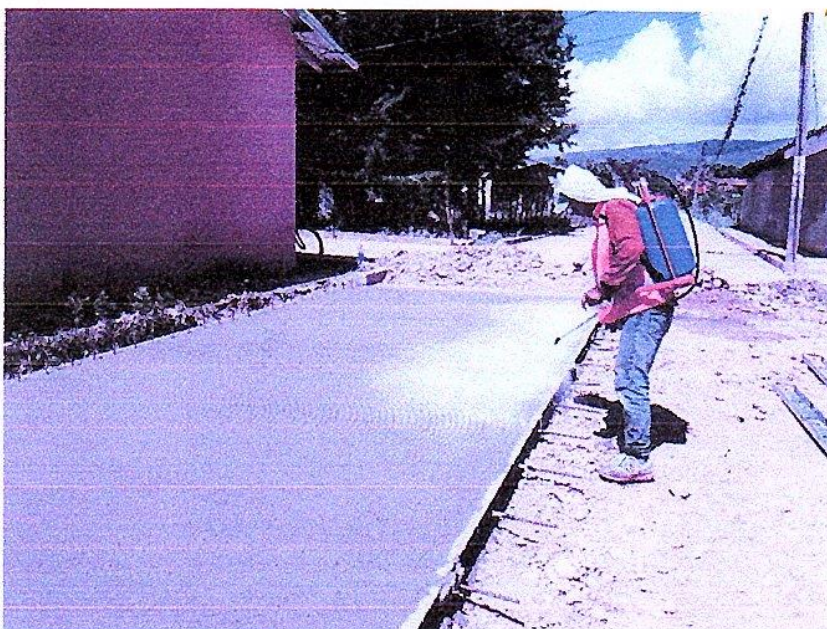

7. Corte de concreto.

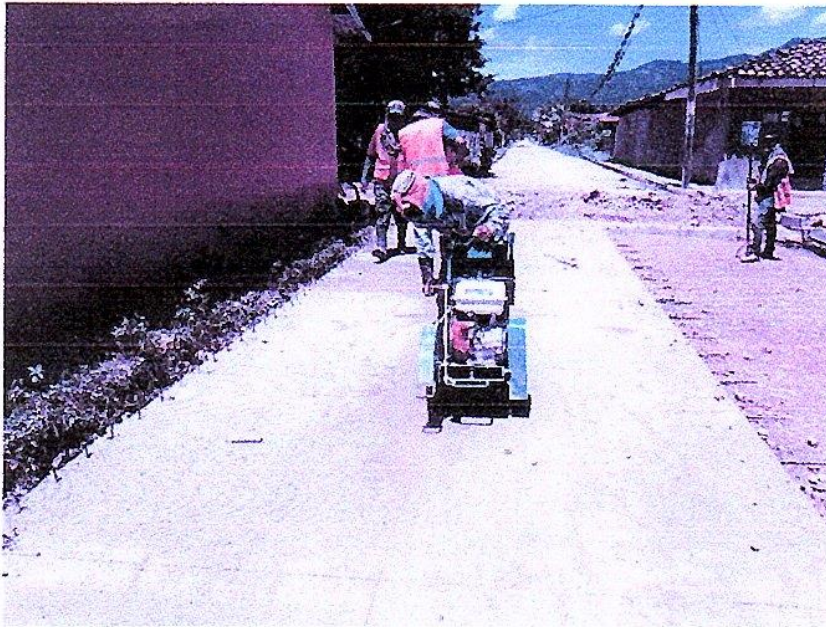

2/Agosto/2021

Hoja

Nº 000001


Proyecto: Pavimento hidráulico calles  
alturas al Instituto Tecnico  
Rafael Pineda Ponce.

Ubicación: Barrio Pordén, Lima, La Paz

Este día se procede a apertura este  
libro de bitácora para hacer las  
anotaciones mas relevantes de dicho  
proyecto, así como avances y modificaciones/  
adiciones si las hubiese quedando  
establecido. También este día como  
orden de inicio se establece una  
duración de 120 días calendario para  
la ejecución de dicho proyecto.

  
Ing. Walter D. Guzmán  
contratista



  
T. I. Huamani

2/ agosto / 2021

Hoja

Nº 000002

Seo. Seleccionado  
calles)



1 Principal

Se trabajo en corte de material en calles  
4-3 con espesor de 30cm y longitud  
75ml. haciendo un Volumen de corte de  
calle 4 =  $6.40 \times 0.30 \times 75 = 744 m^3$   
calle 3 =  $6.30 \times 0.3 \times 75 = 285.75 m^3$

285.75

3/ agosto / 2021



Se trabajo en corte de material en calles  
2 y 1

$$\text{Calle 2} = 6.30 \times 87.3 \times 0.30 = 164.997 m^3$$

$$\text{Calle 1} = 8.30 \times 76.5 \times 0.30 = 190.49 m^3$$

355.49 m<sup>3</sup>

Se votaron  $285.75 \times 1.3 = 371.55 m^3$   
de material de desperdicio.



Bitácora

Nº 034552

Objeto / 1021


Hoja

Nº 000003

Se Realizó trabajo de mantenimiento de  
desagües en la calle #4 y calle #4

Se Realizó corte en la calle #3  
con un metro de ancho por largo de  
70 metros lineales.

Los días 3 y 4 por la tarde hizo  
llover de 2-3 horas de duración.

  
Jose Maria Asturias  
T.I. Moravia

La Unidad Técnica de la Munic. Pol. de la H. S.  
Supervisión al Proyecto de Pavimentación Hidráulica  
donde observa que se estaba trabajando en corte en la  
calle #3 y bacheo de Material despidiendo en la calle #4.

Hoy se trabaja con normalidad ya que al día 5 del presente  
mes no hubo lluvia.

  
José María Asturias  
Alcalde de la zona

Bitácora

Nº 034552

16/ Agosto 2021

Hoja

Nº 000004

El día de hoy se realizó corte de material en calle y Votado de material de calle 1 y 2  
 $355.49 \times 1.3 = 462.14 \text{ m}^3$

Lo día 3 y 4 de agosto por la noche hubo fuertes lluvias por lo que impidió que se realizaran trabajos debido a la saturación del terreno.

9/ Agosto 2021

el día de hoy se tomó la decisión de demoler 6 ml más otro del predio existente debido a que el nivel final quedó muy alto por lo que se hizo una presa de agua y no evacuaba los aguas.

por lo que la Calle 1 quedó con una longitud de  $76.5 + 6 = 82.5 \text{ ml}$

Demolicion de  $8.30 \times 6 \times 0.15 = 7.47 \text{ m}^3$

Votado de pavimentos existente  $7.47 \times 1.3 = 9.71 \text{ m}^3$

Todas las actividades serán llevadas a la Calle 1 Principal.

La decisión fue tomada con la UT Municipal, alcalde municipal.

Bitácora

Nº 03



10/Agosto/2021

Hoja

Nº 000005

Día/ Soleado

Calle 1 = 82.5 ml

Sección 8.30 m

Calle 2 = 87.3 ml

Sección 6.30 m

Calle 3 = 75 ml

Sección 6.30 m

Calle 4 = 75 ml

Sección 6.40 m

Se trabaja en colocación de material selecto en calles 3 y 4. Co. Volumen

$$\text{Calle 3} = 75 \times 0.15 \times 6.30 = 70.88 \text{ m}^3$$

$$\text{Calle 4} = 75 \times 0.15 \times 6.40 = 72 \text{ m}^3$$



11/Agosto/2021

Se trabaja en colocación de material selecto en calles 1-2.

$$\text{Calle 1} = 82.5 \times 8.3 \times 0.15 = 102.71 \text{ m}^3$$

$$\text{Calle 2} = 87.3 \times 6.3 \times 0.15 = 82.50 \text{ m}^3$$

El día de hoy se acurrió el portal por lo que estamos en espera de nueva maquinaria.



Bitácora

Nº 034552

17/Agosto/2021

Hoja

Nº 000006

Por pedido  
el día de hoy llegó al portal y  
se trabajó en traslado de fase de  
cable #4a

Tipo 2 de la tarde se dejó de  
trabajar por lluvia fuerte.



21/Agosto/2021

Los días 18-19-20-21 de agosto  
no se han trabajado debido al  
mal tiempo con fuerte lluvia  
y suelo saturado



27/Agosto/2021

El día de hoy Reimoviera actividades  
y se trabajó en afirmado y tratamiento  
de calle 3 en la cual se colocó  
un tramo que contiene bolsa debido a  
lluvia fuerte en la cual se utilizaron  
12 m<sup>3</sup> de material selecto.



Bitácora

Nº

34552

28/Ago 2021

Hoja

Nº 000007

Se trabajó en calle #4 con ancho de 6.40 donde del debido tratamiento y compactación de base, también se resalo en tramo en calle #1 que contenía material demorado soterrado y se excavó  $1 \times 12 \times 0.50 \text{ m}^3$



El cual está originado falso en la base y se Resano.  
en calle #2 se utilizó material  
relato para Resonar  $= 9 \text{ m}^3$

haciendo en total de material de Resonar  
calle 1 =  $6 \text{ m}^3$   
calle 2 =  $9 \text{ m}^3$   
calle 3 =  $12 \text{ m}^3$   

---

27  $\text{m}^3$

Notas 31/Agosto



día soleado.  
El día de hoy se trabajó en fundición de losa de 4.000 lb/plg haciendo un área de  $3.15 \times 30 = 94.5 \text{ m}^2$  con espesor de losa de 0.15 m y acero de Refuerzo #4 @ 50 cm

Bitácora

Nº 034552

Arreglo de los de  
94.5 m<sup>2</sup> y corte de  
concreto.

Hoja

Nº 000008

También se trabajó en encofrado para  
fundición de losa para pasarela.  
Por la noche hubo lluvias dejando  
terrazas dañadas.

También se realizó la corrección de  
medidas en la calle #1  
dejando una medida de 73 m.

Calle #1

Trazado 73 m

Corte Material  $73 \times 8.30 \times 0.30 = 181.77 \text{ m}^3$

Acampo de madera  $181.77 \times 1.3 = 236.30 \text{ m}^3$

Material selecto  $73 \times 8.30 \times 0.15 = 90.89 \text{ m}^3$

Escombrificación  $73 \times 8.30 = 605.90 \text{ m}^2$

Sábado 4/sep/2011

Se colocó

se trabajó en fundición de losa de  
pasarela  $3.15 \times 30 = 94.5 \text{ m}^2$

Arreglo de losa 94.5 m<sup>2</sup> se colocó  
adós de Refugio Ca Varillo #4

El día de hoy hubo una fuerte lluvia  
dejando daños en terracerías.

Bitácora

Nº 034552

6/Sept/2021

Hoja

Nº 000009

Se realiza la primera estimación de obra  
en la cual la estimación se realiza  
en un 100%, Paralelo hidráulico  
en la 3ª cota esto es 100%  
con ancho de 6.30 y longitud de  
75m, dando un área de  
472.5 m<sup>2</sup>



Bitácora

Nº 034552
