



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/01/2022

Hora : 01:06 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 3116

L.: 163,114.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2482

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA

Id/RTN: 1606198700048

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO CATORCE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Primer Estimación del Contrato No.062-2021 por valor de Lps.803,487.87 (Adendum No.01-2022) por la Construcción 116 Mts Pavimento de Concreto Ciclopeo 70/30, de 6.30 M de ancho y 20 cm de espesor en el Barrio San Juan II, T.S.B. (Primer Estimación Lps.203,892.54, Retención de Anticipo Lps.40,778.51, Retención del 5% de Calidad de Obra Lps.10,194.63 y Retención el 12.5% del Impuesto Sobre La Renta Lps.2,548.66 TOTAL A PAGAR LPS.150,370.74)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 013 000 001 47210 11-011-10	CONSTRUCCION 116 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	163,114.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,548.66
207	RETENCIONES VARIAS	10,194.63
Total de retenciones:		12,743.29

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	Transferencia Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo en Barrio San Juan II, Trinidad,S.B.- Inversión	163,114.03
Monto Total:		163,114.03



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2022

Hora : 01:06 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	163,114.03
- RETENCIONES	12,743.29
TOTAL	150,370.74

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
---	--	---

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
 1606-1987-00048
 INGENIERO CIVIL
 28-01-18
 06-02-18

0s+jS/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwUyZjZiC9Yag1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfGNHy6j8q13k9QSgrebsDJxQXuhSYWwiZzj49C
FPuOah75xqDkGmQxXP0Op3+MSTL3BAAddb2+qYrwsbrtip2H 5Q==



ADENDUM DE CONTRATO N°01-2022

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Ingeniero Civil **JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1606-1987-00048, RTN 16061987000488, con número de CICH 6492 y con domicilio en el Municipio de San José De Colinas, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este Adendum de contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente **ADENDUM DE CONTRATO N° 062-2021** por **LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OBRA TERMINADA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 116 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, A=6.30 M, e=0.20 M, EN CALLE UBICADA EN BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, EL CUAL INCLUYE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA**, el cual se registrará bajo las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:** **LA MUNICIPALIDAD** con fecha 25 de Noviembre del año 2021 firmó con **EL CONTRATISTA** el contrato respectivo para **LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OBRA TERMINADA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 116 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO, A=6.30 M, e=0.20 M, EN CALLE UBICADA EN BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, EL CUAL INCLUYE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA**, por un monto de Ochocientos Tres Mil Cuatrocientos Ochenta Y Siete con 87/100 (**Lps. 803,487.87**), de acuerdo al monto de la oferta presentada, el cual se entregaría en un lapso de tiempo de 45 días Laborables a partir del 29 de Noviembre del año 2021, el presente contrato es financiado con fondos condicionados provenientes del Gobierno Central de la Republica, a través de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, el cual ha desembolsado el 90% del monto total a la Municipalidad, y un 10% una vez realizada la primera liquidación del Proyecto, mismos que deben ser liquidados en una liquidación final. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM:** Realizar la ampliación de tiempo de entrega del Proyecto a 45 días laborables contados a partir del 17 de Enero del presente año, ya que se estaban realizando trabajos del Proyecto del Alcantarillado Sanitario para dicha calle, ejecutados por la Municipalidad de Trinidad, los cuales impidieron el inicio de las actividades en el tiempo establecido. **CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** El presente contrato **NO** sufrirá incremento de su monto contractual. **CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION:** Queda entendido que el resto de las cláusulas del contrato



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.




inicialmente firmado se mantienen vigentes y que deberá ser respetado y cumplido de acuerdo a sus lineamientos. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DE ESTE ADENDUM DE CONTRATO:** Forman parte de este Adendum de contrato: 1) El contrato original y sus cláusulas. 2) Solicitud de Adendum entregada por **EL CONTRATISTA**. Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente Adendum de Contrato y lo suscriben en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a los Catorce (14) días del mes de Enero del año dos mil veintidós (2022). Quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes





MANUEL LEOPOLDO REGALADO
ALCALDE MUNICIPAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA





JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA
CONTRATISTA



Trinidad Santa Bárbara 12 de Enero del 2022


SR. Leopoldo Regalado
Alcalde Municipal
Corporación Municipal

Estimado Señor Alcalde.

Por la presente me es grato dirigirme a usted, deseándole muchos éxitos en las actividades que realiza por el bien del Municipio de Trinidad, de la misma manera aprovecho a solicitarle lo siguiente:

Según contrato firmado **No. 062-2021 Del Proyecto de Construcción de 116 metros lineales de Pavimento de Concreto Ciclópeo, ubicado en calle del Barrio San Juan II**, entre la Municipalidad y mi persona, con **orden de inicio en fecha 29 de Noviembre del 2021**, con una duración de 45 días laborables, y **fecha de entrega 19 de Enero del año 2022**, mismo que no se inició las actividades en el tiempo indicado, debido a que los vecinos expresaron la necesidad de la construcción del tramo de alcantarillado sanitario antes de iniciar el Proyecto de Pavimento, mismo que está siendo ejecutado por la Municipalidad, por lo cual solicito muy respetuosamente poder realizar el Adendum de Contrato en el marco de tiempo, una vez finalizados los trabajos del Alcantarillado Sanitario, debido a que no se podrán cumplir los tiempos establecidos debido a ese inconveniente, por los cual solicito una ampliación de tiempo de 45 días laborables contados a partir del día 17 de Enero del presente año.

A la espera de su respuesta me suscribo ante ustedes, muy agradecido.


Ing. José Edgardo Leiva
CICH-6492



ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA # 1

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 116 ML PAVIMENTO CICLOPEO, A=6.30 M , e=20 CMS

UBICACIÓN: CALLE EN BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO, TRINIDAD, SANTA BARBARA

N°	ACTIVIDAD	CONTRATADO				AVANCE ANTERIOR			AVANCE DEL PERIODO			AVANCE TOTAL			PENDIENTE DE PAGAR		
		UND	CANT.	P. UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%
1	Trazado y Marcado Con Teodolito	Global	1.00	18262.40	18,262.40	0.00	0.00	0.00	1.00	18,262.40	100.00	1.00	18,262.40	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Excavación Tipo I (Material Común)	M3	167.76	196.95	33,040.33	0.00	0.00	0.00	167.76	33,040.33	100.00	167.76	33,040.33	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Acarreo de Material (Desperdicio)	M3-km	872.35	30.62	26,711.36	0.00	0.00	0.00	872.35	26,711.36	100.00	872.35	26,711.36	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Conformacion Y Compactacion de Sub-rasante	M2	559.20	93.21	52,123.03	0.00	0.00	0.00	559.20	52,123.03	100.00	559.20	52,123.03	100.00	0.00	0.00	0.00
5	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	83.88	505.51	42,402.18	0.00	0.00	0.00	83.88	42,402.18	100.00	83.88	42,402.18	100.00	0.00	0.00	0.00
6	Pavimento de Concreto Ciclópeo e=0.20, (incluye corte, curado y sellado de juntas)	M3	111.84	3982.71	445,426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.84	445,426.29	100.00
7	Acero de Refuerzo, Grado Inter. Fy=2800 kg/Cm2	Kg	354.82	152.17	53,992.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.82	53,992.96	100.00
8	Bordillo de Concreto Ciclópeo de 0.15 x 0.15	ML	233.00	406.28	94,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	94,663.24	100.00
9	Acondicionamiento de Pozos Existentes	Unidad	2.00	2756.42	5,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,512.84	100.00
10	Movilizacion de Equipo	Global	1.00	26000	26,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	100.00	1.00	26,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	Rótulo del Proyecto	Unidad	1.00	5,353.24	5,353.24	0.00	0.00	0.00	1.00	5,353.24	100.00	1.00	5,353.24	100.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL.....LPS.					803,487.87	0.00	0.00	0.00		203,892.54	25.38		203,892.54	25.38		599,595.33	74.62


RESUMEN DE LA PRIMERA ESTIMACION DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA

1°) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPO.....LPS.	203,892.54
2°) DEDUCCION DEL ANTICIPO 20% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	40,778.51
3°) DEDUCCION DEL CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	10,194.63
4°) DEDUCCION DEL ISR (12.5% DEL 10% CONSIDERADO COMO UTILIDAD) DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	2,548.66
5°) NETO A PAGAR EN PRIMERA ESTIMACION.....LPS.	150,370.74

CUADRO DE DEDUCCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		CUADRO DE DEDUCCION			
TOTAL DEL ANTICIPO (20%)	L. 160,697.57	AMORTIZACION DE ANTICIPO			
		ANTERIOR	ESTA EST.	ACUMULADO	PENDIENTE DE AMPORTIZAR
		0.00	40,778.51	40,778.51	L. 119,919.06



 JOSE EDGARDO LEIVA
 CONTRATISTA



 MANUEL LEOPOLDO REGALADO
 ALCALDE MUNICIPAL



 MYRA SARAI PAZ
 TESORERA



PROP. JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA
 R. T. N. 16061987000488 // TEL. 88201108
 BARRIO EL OCOTE, CALLE PRINCIPAL,
 COLINAS S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: galoleiva7@gmail.com
 CAI: B625B9-E28183-E74B83-CF1025-AE55FA-18

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000022

Por Lps: **150,370.74**

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S.B

RTN: 16269995443317

La suma neta de: Ciento cincuenta mil trescientos setenta con 74/100

Por concepto de: Pago de Primera Estimacion de contrato NO 062-2021 Pavimento Concreto ciclopeo Barrio San Juan II.

22 de 01 del 2022

[Handwritten Signature]
 firma



Total por Honorarios	L.:	_____
Total Retenido	L.:	_____
Total Neto Recibido	L.:	<u>150,370.74</u>

Original: Cliente Copia: Emisión
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 Id. 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050 - Fech. Recepción - 09/03/2021 - Limite. Emisión - 09/03/2022

RECIBO

Por Lps. 150,370.74


Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 74/100 (**Lps. 150,370.74**) por concepto de Primer pago según Estimación de Avance de Obra del **“PROYECTO DE PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE 116 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO A=6.30 M Y DE 20 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA,** para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 18 de Enero del 2022.


Ing. Jose Edgardo Leiva
Contratista
Ident. # 1606-1987-00048



Resumen Financiero	
Primer pago.....Lps.	203,892.54
Menos:	
Retención Del Anticipo..... Lps.	40,778.51
Retención De Calidad De Obra...Lps.	10,194.63
Retención Del ISR.....Lps.	2,548.66
Monto a Pagar.....Lps.	150,370.74



**COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE HONDURAS**



Jose Edgardo Leiva Rivera
Ingeniero Civil
1606-1987-00040

Firma del Portador

No. CICH: 6492

El portador del presente carnet es miembro inscrito del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, en consecuencia está facultado para ejercer todos los derechos inherentes a su Titulo en toda la República.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

INFORME TECNICO 1

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE 116.00 ML
DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO
CON ANCHO DE 6.30 Y $e=0.20$ M, CALLE EN
BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE TRINIDAD.**

Trinidad Santa Bárbara, Enero 2022.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

INFORME TECNICO No.1 **Ejecución De Obra**

PROYECTO: Construcción De 116.00 ml de pavimento de concreto ciclópeo con ancho=6,30 m, e=0,20 m.

UBICACIÓN:

Este proyecto está ubicado en la Calle del Barrio San Juan II, Casco Urbano, del Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara

FECHA DE INFORME: Viernes 21 de Enero del 2022.

ALCANCE DEL PROYECTO:

El Proyecto consiste en la ejecución de todas aquellas obras necesarias para alcanzar las condiciones óptimas para el tránsito de vehículos y de peatones en la Calle, con la construcción del Pavimento, beneficiando así a los vecinos.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El objetivo estructural del proyecto fue obtener una capa de rodadura en las más óptimas condiciones tomando en cuenta la calidad de los materiales y la ejecución adecuada del proyecto, el objetivo fundamental del proyecto fue solucionar los problemas que presentaba la calle ya que es el principal acceso a dicho Barrio, y en tiempo de invierno debido a las lluvias se vuelve lodosa debido al tipo de terreno, formación de grandes charcos y así avanza el deterioro de la calle, misma que presenta dificultad para transitar de manera peatonal, de igual manera para los vehículos y moto taxis que circulan a diario.

Entre las actividades que se están realizando durante el tiempo de la construcción del Proyecto se encuentran las siguientes:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

TRAZO Y MARCADO CON TEODOLITO:

MATERIALES: Madera rústica de pino, clavos, crayolas, cuerda de nylon.

MANO DE OBRA: Maestro de obra, albañil, ayudantes, peones.

HERRAMIENTAS: Almádana, martillo, escuadra, plomada, metro, nivel, equipo topografía.

PROCEDIMIENTO: Se deberá colocar estacas en los puntos identificados para nivelación del terreno donde se encuentre corte o relleno, así como el marcaje de la línea central y del marcaje de ambas trochas, estas actividades realizadas con equipo de topografía.

EXCAVACIÓN TIPO I (EN MATERIAL COMÚN):

MANO DE OBRA: Maestro de obra, ayudantes, peones.

HERRAMIENTAS: Palas, piochas, barras.

PROCEDIMIENTO: Con las cuerdas puestas en las niveletas se proyectará una marca inicial en la tierra, para que el peón o ayudante inicien la excavación.- Las caras verticales de la excavación deberán quedar a plomo y el fondo a nivel y completamente plano.- Para revisar la exactitud se colocarán las cuerdas.

Se cuantificará por M3.

ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO:

PROCEDIMIENTO: todo el material excedente producto de la excavación se deberá de retirar en volqueta a un depósito fuera del proyecto y donde no cause ningún riesgo o daño a propiedades.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

CONFORMACIÓN Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

Descripción. Este trabajo consistirá en la compactación y perfilado de la subrasante de un camino para la construcción inmediata de un recubrimiento. Se considerará como subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento para el recubrimiento a construir. Esta superficie puede resultar de movimientos de tierra efectuados con anterioridad, de excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 cms.:

MATERIALES: Material selecto de procedencia local.

MANO DE OBRA: Maestro de obra, ayudantes, peones.

HERRAMIENTAS: Compactador de rodo, de plato o bailarina, pisones, palas, reglones de madera 2"x4", nivel.

PROCEDIMIENTO: El suelo natural deberá quedar consistente y se colocará una capa de material selecto de 10 cms.; ambos debidamente compactados, a satisfacción del Supervisor.- Los peones y ayudantes regarán el selecto uniformemente en toda el área que se necesite.- Luego se colocarán reglas laterales de 1"x4" como guías para nivelar y definir el bombeo del 2% con rastras de madera de 2"x4". El espesor del relleno será de 10 cms. Ya compactado. Se cuantificará por M3 .

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN PRIMERA ESTIMACION:

Trazado y Marcado Con Teodolito	Global	1.00
Excavación Tipo I (Material Común)	M3	167.76
Acarreo de Material (Desperdicio)	M3-km	872.35
Conformación Y Compactación de Sub-rasante	M2	559.20
Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	83.88

AVANCE FISICO DE OBRA: 25.38%

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

- La contratación del personal estuvo a cargo del Contratista, el cual es responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal.
- El contratista es el encargado de la compra de materiales y contratación de mano de obra calificada y no calificada.
- La supervisión está a cargo de al Secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento SEDECOAS.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.


IMAGENES



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

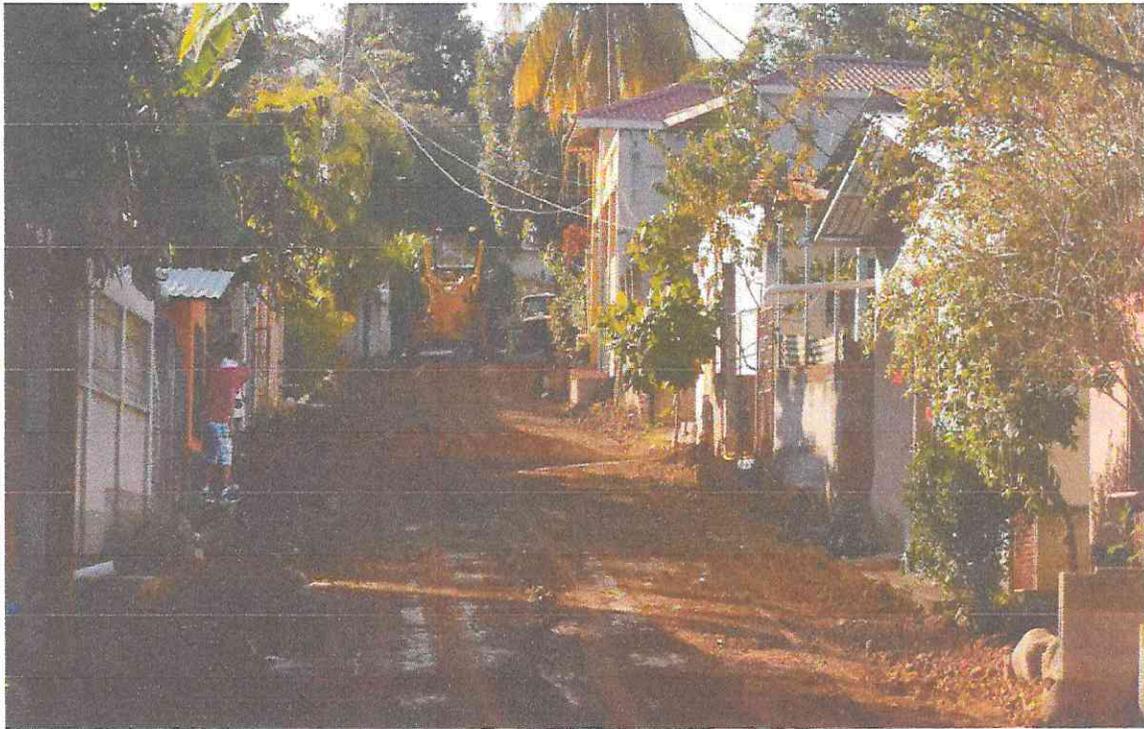

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

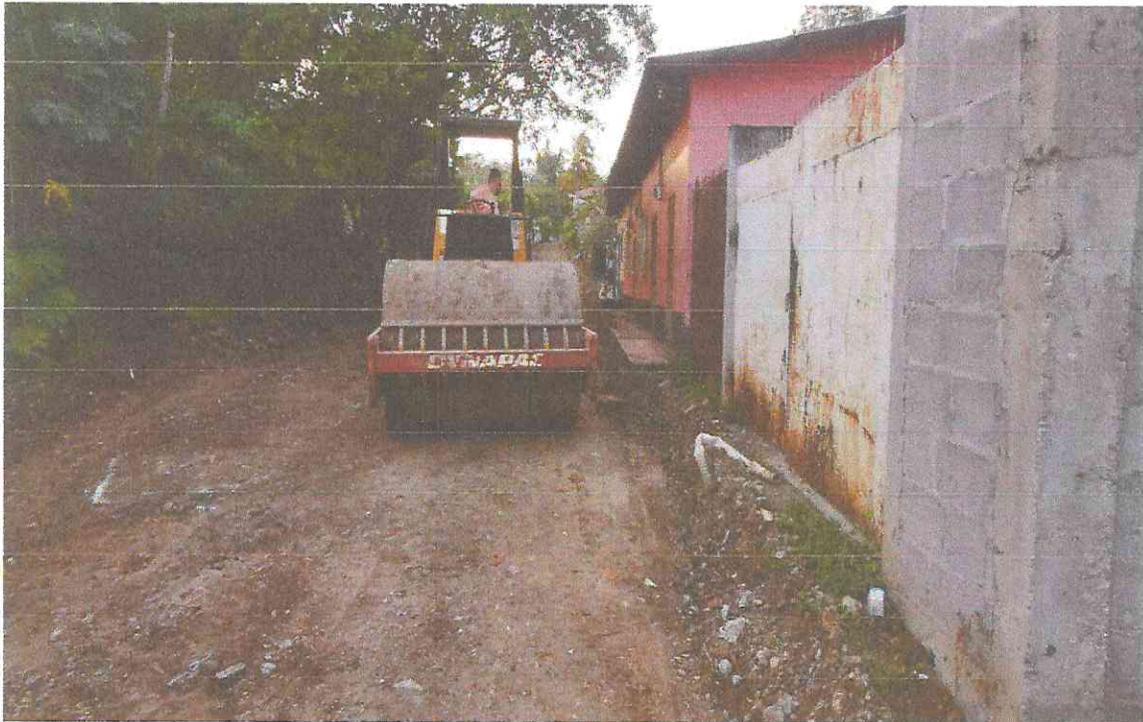

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.




MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

