




# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Ciudad Universitaria  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

## Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura SEAPI

OFICIO SEAPI No. 1382 -2016  
12 de agosto de 2016

MSc.  
**FERNANDO SERMEÑO**  
Comisionado Coordinador  
Comisión de Control de Gestión, UNAH.  
Su Oficina



Estimado MSc. Sermeño:

Reciba mis atentos saludos en ocasión de sustituir el OFICIO SEAPI No. 1295-2016 y remitir los **Formularios de Seguimiento de Proyectos con la información adicional solicitada**, listados en el cuadro abajo descrito, en los que se informa de la situación actual de los proyectos que se están ejecutando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de esta Secretaría Ejecutiva, con la información adicional solicitada por ustedes. **El informe corresponde al mes de marzo de 2016.**

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	No. FOLIOS
1	Construcción Edificio Ciencias de la Salud UNAH VS	5
2	Construcción Edificio Rectoría Administrativo, Ciudad Universitaria, José Triinidad Reyes	5
3	Readecuación del Espacio Físico para el Laboratorio de Servicios Genéticos	3
4	Obras de Infraestructura Edificios de Odontología, biblioteca e IUDPAS	3
5	Readecuación y Mejoramiento de S.S. y Sistema de Distribución Eléctrica de los Edificios No.1, No.2, No.4 y Biblioteca en UNAH-VS.	3

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración.

Atentamente,

  
**ING. CARMEN LASTENIA FLORES SANTOS**  
SECRETARIA EJECUTIVA

cc: Ing. Virginia Margarita Valle Agüiluz, SEAPI-UNAH  
cc: Ing. Juana Elisa Granados Rodríguez, SEAPI-UNAH  
cc: Ing. Iván Castro Sierra, SEAPI-UNAH  
cc: Expediente, SEAPI-UNAH  
vmva





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**  
**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**  
 Situación de avance al 31 de marzo de 2016

Información General del Proyecto					
Nombre del Proyecto:		Construcción Edificio Ciencias de la Salud, UNAH-VS			
Ubicación:		San Pedro Sula, Ciudad Universitaria			
Responsable del Diseño y Especificaciones Técnicas:		Arquitecto Marlon Urtecho, Diseño Estructural: Ing. Rafael Rivera Medina Especificaciones Técnicas, Diseño Eléctrico e Hidrosanitario: la SEAPI			
Estructura Presupuestaria:		Presupuesto Aprobado Según Fuente de Financiamiento (en Lempiras)		Fuente 11:	Año 2012= 30,600,000.00
				Fuente 12:	Año 2012= 103,500,000.00 Año 2013= 105,986,611.59 Solicitado Año 2014= 218,644,661.00 Solicitado Año 2015= 143,239,067.59 Solicitado Año 2016= 100,692,613.35
Año de Aprobación del Proyecto:		2011	Tipo de Proceso (Licitación Pública, Privada, Contratación Directa, Por Administración, Etc.):		Licitación Pública Nacional
Descripción del Proyecto:		Construcción de cuatro edificios de tres niveles para aulas y laboratorios de la Escuela de Ciencias de la Salud, Medicina, Odontología y Enfermería		META/M <sup>2</sup>	
				Contratado	12,000.00 m <sup>2</sup>
				Avance Actual	9,480.00
Propósito del Proyecto		El propósito del proyecto es dotar de instalaciones, laboratorios y aulas adecuados al Área de Ciencias de la Salud UNAH VS y Vinculación Universidad - Sociedad con la prestación de servicios del Área de Ciencias de la Salud.		Sector	Educación
				Subsector	Educación Superior
Impacto Ambiental		Durante la fase de construcción, se presentarán impactos negativos temporales, recuperables y de baja intensidad en su mayoría, presentándose: alteraciones en las calidades del aire, ocasionadas por el polvo que generan las actividades de construcción y por movimiento vehicular propio de la obra y externas a la misma, alteraciones en los niveles sonoros. Se identificó que habrá desaparición de flora (árboles, arbustos y hierba) y afección de la fauna asociada, lo que conlleva a cambios y deterioros en el paisaje. El proyecto generará desechos sólidos y posibles derrames de las maquinarias (aceites, etc.). En la fase de operación, se identificaron impactos positivos en su mayoría. El impacto negativo identificado durante la operación es el manejo de las aguas residuales que contienen sustancias químicas provenientes de Clínicas Odontológicas y Necroteca, para los cuales se utilizarán tratamientos puntuales y no se descargarán en el sistema de alcantarillado sanitario. De acuerdo con la legislación ambiental y la Tabla de Categorización Ambiental de MIAMBIENTE (Acuerdo No. 1714-2010) el proyecto es de Categoría 2. En este caso, el proyecto cuenta con Autorización Ambiental emitida por la División Municipal Ambiental DIMA de San Pedro Sula, siendo factible el proyecto ambientalmente bajo el cumplimiento de las medidas de mitigación del Informe Técnico LAS-AA-047-12. El personal técnico especializado en el área ambiental realiza las actividades de control y seguimiento para velar por el cumplimiento de las medidas de mitigación.			
Impacto en el Terreno y Asentamientos		El proyecto está ubicado en un área que anteriormente estaba destinado para uso deportivo dentro del campus de UNAH Valle de Sula, convirtiéndose esta área específicamente para el área de la salud lo que viene a organizar el uso de suelo del campus. Debido a que se encuentra a aproximadamente 80 metros del edificio más cercano, no causa ningún impacto en la población durante la etapa de construcción. Durante la etapa de operación, el edificio contará con acceso desde el lado oeste del campus, brindando mejor accesibilidad a la población.			
Alcance de Proyecto		Dar mayor acceso a la ciudadanía a la educación superior			
Proceso de Adjudicación de Construcción					
Número de Licitación o del Tipo de Proceso:		LPN- UNAH-SEAPI-04-2011		Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a licitar:	
				19 y 20 de octubre/2011	
Fecha de Apertura de Ofertas:		16 de diciembre del 2011	Número de Empresas que Retiraron Bases:		4
				Número de Empresas que Presentaron Ofertas:	
				4	
Fecha y No. de Acuerdo de nombramiento de la Comisión Evaluadora:		2295-2011 16/12/2011	Empresa Adjudicada:	Constructora Kosmax S. de R.L. de C.V.	Valor Adjudicado:
				L. 244913,204.95	
Fecha Firma del Contrato:		16 de mayo del 2012	No. de Contrato:	No.CC-04-2012 SEAPI UNAH	Plazo del Contrato:
				Inicial 18 meses calendario	
				Modificado 47.5 meses calendario	
Garantías de Construcción					
Tipo de Garantía		Número	Valor	Periodo de Validez	Fecha de Vencimiento
Garantía de Anticipo		No. 1-56582	L. 36736,980.74	579 días del 06/06/2012 al 06/01/2014	06/01/2014
Garantía de Anticipo		Endoso No. 7/2013		579 días del 16/07/2012 al 15/02/2014	15/02/2014
Garantía de Anticipo		Endoso No. 8/2014	L. 23807,009.84	28 días del 16/02/2014 al 16/03/2014	16/03/2014
Garantía de Anticipo		Endoso No. 13/2014	L. 23377,251.32	213 días del 17/03/2014 al 16/10/2014	16/10/2014
Garantía de Anticipo		Certificado de Renovación No. 46-2014	L. 19504,307.45	487 días del 17/10/2014 al 16/02/2016	16/02/2016
Garantía de Anticipo		Endoso No. 12/2016	L. 5377,267.11	134 días del 17/02/2016 al 30/06/2016	30/06/2016
Garantía de Cumplimiento		No. 1-56583	L. 36736,980.74	669 días del 06/06/2012 al 06/04/2014	06/04/2014
Garantía de Cumplimiento		Endoso No. 8/2013		669 días del 16/07/2012 al 16/05/2014	16/05/2014
Garantía de Cumplimiento		Endoso No. 7/2014	L. 23807,009.84	31 días del 16/05/2014 al 16/06/2014	16/06/2014
Garantía de Cumplimiento		Endoso No. 14/2014	L. 24764,303.52	213 días del 17/06/2014 al 16/01/2015	16/01/2015
Garantía de Cumplimiento		Certificado de Renovación No. 47/2014	L. 24750,000.00	485 días del 17/01/2015 al 16/05/2016	16/05/2016
Garantía de Cumplimiento		Endoso No. 13/20164	L. 13310,580.19	123 días del 17/05/2016 al 17/09/2016	17/09/2016
El contratista presentó la ampliación de las garantías de anticipo y cumplimiento. La garantía de anticipo se desafectó.					
Garantía de Calidad					
Proceso de Adjudicación de Supervisión					

MAPFRE/HONDURAS







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**

**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**

**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

Número de Concurso o del Tipo de Proceso:		Concurso Público Nacional CPN-UNAH-SEAPI-01-2012 Paquete 1		Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a Concurso:		12 y 13 de marzo/2012		
Fecha de Apertura de Ofertas:		19/04/2012	Número de Empresas que Retiraron Bases:		4	Número de Empresas que Presentaron Ofertas:		4
Fecha y No. de Acuerdo de nombramiento de la Comisión Evaluadora:		692-2012 20/04/2012	Empresa Adjudicada:		Gabinete Técnico S.A. de C.V.	Valor Adjudicado:		14701,877.51
Fecha Firma del Contrato:		12/06/2012	No. de Contrato:		No. CS-01-2012 SEAPI-UNAH	Plazo del Contrato:		Inicial: 19 meses calendario Modificado: 28 meses calendario
Garantías de Supervisión								
Tipo de Garantía		Número		Valor		Periodo de Validez		Fecha de Vencimiento
Garantía de Cumplimiento		51-10625		L. 271,699.78		699 días del 12/06/2012 al 12/05/2014		12/05/2014
Endoso No. 1, Garantía de Cumplimiento		51-10625		L. 287,890.84		61 días del 13/05/2014 al 12/07/2014		12/07/2014
Endoso No. 2, Garantía de Cumplimiento		51-10625		L. 338,019.66		Del 12/07/2014 al 02/02/2015		02/02/2015
								Seguros Continental S.A.
Seguimiento del Proyecto								
Concepto			Construcción			Supervisión		
Fecha Orden de Inicio			16/07/2012			02/07/2012		
Fecha de Finalización contractual			16/01/2014			02/02/2014		
Fecha de Finalización con ampliaciones			30/06/2016			02/11/2014		
Tiempo Transcurrido (Días, meses)			43 meses, 15 días			28 meses		
Tiempo Disponible (Días, meses)			4 meses, 0 días			0 días		
Ampliaciones de Tiempo (Días, meses)			29 meses, 15 días calendario			9 meses		
% de Tiempo Ejecutado			91.00%			100.00%		
Valor del Contrato			L. 244913,204.95			L. 14701,877.51		
Valor Modificado acumulado			L. 297801,958.60			L. 18372,416.74		
Valor Ejecutado Acumulado hasta el año anterior al 31 de diciembre de 2014			L. 144259,040.03			L. 18146,201.79		
Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha hasta estimación No. 47			L. 221563,715.07			L. 18146,201.79		
Saldo del Contrato			L. 76238,243.53			L. 226,214.95		
% de Valor Contratado Ejecutado a la Fecha			74.40%			L. 0.99		
% de Obra Física Ejecutada			79.00%					
Número de Libros de Bitácora			16025,16165,16166,16167,16168, 16785,16786,16787,16788,16346, 16347, 17702, 18307) CICH y (054) CIMECH					
El valor reportado como ejecutado en el año anterior y ejecutado a la fecha se ha considerado en base al valor del contrato, sin incluir el valor ejecutado por cláusula escalatoria. Se calcula con los valores netos recibidos por el Contratista incluyendo el anticipo								
Modificaciones al Contrato de Construcción								
Tipo de Modificación		Fecha		Descripción		Valor de Modificación		Ampliación de plazo
Orden de Cambio No.1		21/12/2012		Modificación por disminución del valor del contrato		-L. 2462,763.62		No
Orden de Cambio No.2		19/03/2013		Aumento del valor del contrato		L. 1111,587.60		No
Orden de Cambio No.3		23/04/2013		Aumento del valor del contrato		L. 1431,458.22		No
Modificación No.1		19/07/2013		Aumento del valor del contrato y tiempo		L. 310,772.95		2 meses
Modificación No. 2		24/09/2013		Aumento del valor del contrato		L. 7865,834.76		No
Modificación No. 3		31/10/2013		Disminución del valor del contrato		-L. 53,134.65		No
Modificación No. 4		13/12/2013		Aumento del valor del contrato		L. 1043,259.18		No
Modificación No. 5		14/03/2014		Aumento del valor del contrato		L. 954,765.98		7 meses
Modificación No. 6		10/04/2014		Aumento del valor del contrato		L. 2712,733.47		No
Modificación No. 7		24/07/2014		Disminución del valor del contrato		-L. 220,475.33		No
Modificación No. 8		13/10/2014		Aumento del valor del contrato y tiempo		L. 3999,515.82		16 meses
Modificación No. 9		27/02/2014		Aumento del valor del contrato		L. 25136,885.49		
Modificación No. 10		30/06/2015		Aumento del valor del contrato		L. 1379,024.19		
Modificación No. 11		30/09/2015		Aumento del valor del contrato		L. 3695,365.46		
Modificación No. 12		11/02/2016		Aumento del valor del contrato		L. 5983,924.13		4 meses 15 días
Total						L. 52888,753.65		29 meses 15 días
Seguimiento Financiero Contrato de Construcción								
# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado Solo estimaciones	Retenciones			Pago Neto	No. de Cheque	Reconocimiento de Mayores Costos
			Anticipo	Especial	Impuesto S/Renta			
	Anticipo					L. 36736,980.74	307396	







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**  
**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**  
 Situación de avance al 31 de marzo de 2016

1	16/07/12 al 31/07/2012	L. 2622,202.11	393,330.32			L. 2228,871.79	317491	L. 33,759.23
2	01/08/12 al 31/08/2012	L. 962,721.72	144,408.26			L. 818,313.46	318472	L. 23,494.17
3	01/09/12 al 31/09/2012	L. 1164,844.38	174,726.66			L. 990,117.72	320920	L. 25,004.65
4	01/10/12 al 31/10/2012	L. 1767,749.88	265,162.48			L. 1502,587.40	321125	L. 39,012.47
5	01/11/12 al 31/11/2012	L. 1738,683.66	260,802.55			L. 1477,881.11	322613	L. 36,230.24
6	01/12/12 al 31/12/2012	L. 2465,737.10	369,860.57			L. 2095,876.53	328956	L. 57,800.96
7	01/01/13 al 31/01/2013	L. 2390,190.85	358,528.63			L. 2031,662.22	329384	L. 82,638.96
8	01/02/13 al 28/02/2013	L. 2656,347.85	398,452.18			L. 2257,895.67	334222	L. 88,474.18
9	01/03/13 al 31/03/2013	L. 5172,127.46	775,819.12			L. 4396,308.34	335615	L. 133,161.36
10	01/04/13 al 30/04/2013	L. 13461,855.45	2019,278.32			L. 11442,577.13	337044	L. 97,238.25
11	01/05/13 al 31/05/2013	L. 2582,908.87	387,436.33			L. 2195,472.54	338122	L. 38,640.69
12	01/06/13 al 31/06/2013	L. 9571,124.83	1435,668.72			L. 8135,456.11	343435	L. 1504,224.50
13	01/07/13 al 31/07/2013	L. 5543,210.66	831,481.60			L. 4711,729.06	343915	L. 195,414.55
14	01/08/13 al 31/08/2013	L. 1969,402.39	295,410.36			L. 1673,992.03	345324	L. 79,483.31
15	01/09/13 al 30/09/2013	L. 11624,500.98	1743,675.15			L. 9880,825.83	345971	L. 317,827.58
16	01/10/13 al 31/10/2013	L. 8807,605.93	1321,140.89			L. 7486,465.04	350430	L. 671,888.58
17	01/11/13 al 30/11/2013	L. 5010,479.09	751,571.86			L. 4258,907.23	352086	L. 328,766.26
18	01/12/13 al 31/12/2013	L. 6606,762.78	991,014.42			L. 5615,748.36	352084	L. 208,090.25
19	01/01/14 al 31/01/2014	L. 2428,185.45	364,227.82			L. 2063,957.63	352914	L. 93,998.11
20	01/02/14 al 28/02/2014	L. 518,221.18	77,733.18			L. 440,488.00	369011	L. 44,190.47
21	01/03/14 al 31/03/2014	L. 6516,229.53	977,434.43			L. 5538,795.10	366687	L. 209,121.46
22	01/04/14 al 30/04/2014	L. 3326,362.07	498,954.31			L. 2827,407.76	373923	L. 217,536.73
23	01/05/14 al 31/05/2014	L. 4051,815.55	607,772.33			L. 3444,043.22	377555	L. 295,653.10
24	01/06/14 al 30/06/2014	L. 1402,487.52	210,373.13			L. 1192,114.39	380542	L. 124,612.54
25	01/07/14 al 31/07/2014	L. 6202,322.42	L. 930,348.36			L. 5271,974.06	383440	L. 372,614.18
26	01/08/14 al 31/08/2014	L. 4320,408.74	L. 648,061.31			L. 3672,347.43	385057	L. 335,132.44
27	01/09/14 al 30/09/2014	L. 2770,757.05	L. 415,613.56			L. 2355,143.49	389343	L. 259,547.26
28	01/10/14 al 31/10/2014	L. 4167,029.41	L. 625,054.41			L. 3541,975.00	391588	L. 487,003.96
29	01/11/14 al 30/11/2014	L. 4674,265.46	L. 701,139.82			L. 3973,125.64	396309	L. 304,234.48
30	01/12/14 al 31/12/2014	L. 5199,528.42	L. 779,929.26			L. 4419,599.16	397542	L. 249,510.97
31	01/01/15 al 31/01/2015	L. 3155,664.52	L. 473,349.68			L. 2682,314.84	399121	L. 273,404.34
32	01/02/15 al 28/02/2015	L. 6585,314.03	L. 987,797.10			L. 5597,516.93	405507	L. 283,483.63
33	01/03/15 al 31/03/2015	L. 7253,180.30	L. 1087,977.05			L. 6165,203.25	406565	L. 238,921.32
34	01/04/15 al 15/04/2015	L. 3640,607.49	L. 546,091.12			L. 3094,516.37	407838	L. 213,028.36
35	16/04/15 al 30/04/2015	L. 5366,129.13	L. 804,919.37			L. 4561,209.76	411550	L. 298,725.67
36	01/05/15 al 31/05/2015	L. 5919,096.15	L. 887,864.42			L. 5031,231.73	416332	L. 293,931.04
37	01/06/15 al 30/06/2015	L. 5370,196.78	L. 805,529.52			L. 4564,667.26		L. 197,458.68
38	01/07/15 al 15/07/2015	L. 3854,486.07	L. 578,172.91			L. 3276,313.16	421595	L. 245,727.74
39	16/07/15 al 31/07/2015	L. 7378,552.44	L. 1106,782.87			L. 6271,769.57	426470	L. 66,849.82
40	01/08/15 al 31/08/2015	L. 1976,150.50	L. 296,422.58			L. 1679,727.92	428246	L. 110,236.95
41	01/09/15 al 30/09/2015	L. 5145,183.58	L. 771,777.54			L. 4373,406.04		L. 339,817.74
42	01/10/15 al 31/10/2015	L. 3955,957.07	L. 593,393.56			L. 3362,563.51		L. 172,849.96
43	01/11/15 al 30/11/2015	L. 7348,350.46	L. 1102,252.57			L. 6246,097.89		L. 223,808.98
44	01/12/15 al 15/12/2015	L. 6324,896.89	L. 948,734.53			L. 5376,162.36		L. 349,745.79
45	15/12/15 al 31/12/2015	L. 1563,771.13	L. 234,565.67			L. 1329,205.46		
46	01/01/16 al 31/01/2016	L. 2531,152.00	L. 379,672.80			L. 2151,479.20		
47	01/02/16 al 15/02/2016	L. 8378,459.56	L. 1256,768.93			L. 7121,690.63		
<b>Totales</b>		<b>L. 217443,216.89</b>	<b>L. 32616,482.56</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 88641,024.25</b>	<b>L. 221563,715.07</b>		<b>L. 10262,295.91</b>

**Requerimientos Para el Año 2016**      **L. 88641,024.25**      Saldo incluye saldo de Construcción y enlaces de campo

**Modificaciones al Contrato de Supervisión**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
Modificación No. 01-2014	13/02/2014	Aumento del valor del contrato y ampliación de plazo.	L. 889,964.71	2 meses	
Modificación No. 02-2014	05/05/2014	Aumento del valor del contrato y ampliación de plazo.	L. 2780,574.52	7 meses	
<b>Total</b>			<b>L. 3670,539.23</b>	<b>9 meses</b>	

El Contrato de Supervisión finalizado el 02 de noviembre de 2014 no fué renovado y en vista que el incremento acumulado de las modificaciones suscritas llegaron al tope del 25% del valor inicial del Contrato de Servicios de Supervisión suscrito, el mismo se dió por finalizado el 02 de noviembre de 2014. A partir del 03 de noviembre de 2014 mediante oficio No. 1214-2014, se le asignó la supervisión del proyecto al Arquitecto Mauricio Sierra López y a partir del 11 de diciembre de 2014 mediante Acuerdo de Rectoría No. 2967-2014 se le nombró Supervisor del Proyecto.

**Seguimiento Financiero al Contrato de Supervisión**

# Pag.	Periodo del Informe	Valor Facturado	Retenciones		Pago Neto	No. Cheque	Observaciones
			Impuesto S/Renta	10% Retención de Honorarios			
1	02/07/2012 al 31/07/12	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	316349	
2	01/08/2012 al 31/08/12	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	318474	
3	01/09/2012 al 30/09/12	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	320381	
4	01/10/2012 al 31/10/12	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	320382	
5	01/11/2012 al 31/11/12	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	320919	
6	01/12/2012 al 31/12/12	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	328458	
7	01/01/2013 al 31/01/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	329007	
8	01/02/2013 al 28/02/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	334019	
9	01/03/2013 al 31/03/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	335641	
10	01/04/2013 al 30/04/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	336770	
11	01/05/2013 al 30/05/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	341418	
12	01/06/2013 al 30/06/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	343342	
13	01/07/2013 al 31/07/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	343905	
14	01/08/2013 al 31/08/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	345326	
15	01/09/2013 al 30/09/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	347613	
16	01/10/2013 al 31/10/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	349206	
17	01/11/2013 al 30/11/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	350590	
18	01/12/2013 al 31/12/13	L. 773,783.02		L. 9,533.33	L. 764,249.69	352107	
19	01/01/14 al 02/02/14	L. 619,487.66		L. 7,520.78	L. 611,966.88	368507	
20	01/02/2014 al 02/03/14	L. 522,130.10		L. 6,543.95	L. 515,586.15	369009	
21	01/03/2014 al 02/04/14	L. 522,130.10		L. 6,432.64	L. 515,697.46	367122	
22	03/04/2014 al 30/04/14	L. 426,772.19		L. 5,236.49	L. 421,535.70	372224	
23	01/05/2014 al 31/05/14	L. 426,772.17		L. 5,236.49	L. 421,535.68	377252	
24	01/06/2014 al 30/06/14	L. 406,113.19		L. 4,983.01	L. 401,130.18	380525	
25	01/07/14 al 31/07/2014	L. 406,113.19		L. 4,983.01	L. 401,130.18	363672	
26	01/08/14 al 31/08/2014	L. 406,113.19		L. 4,983.01	L. 401,130.18	384302	
27	01/09/14 al 30/09/2014	L. 392,996.32		L. 4,822.06	L. 388,174.26	389304	
28	01/10/14 al 02/11/2014	L. 315,694.27		L. 3,873.57	L. 311,820.70	Pendiente	
<b>Totales</b>		<b>L. 18372,416.74</b>		<b>L. 226,214.95</b>	<b>L. 18146,201.79</b>		







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**  
**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**  
 Situación de avance al 31 de marzo de 2016

Disponibilidad Para el Año 2016 L. 361,214.95 Saldo de supervisión y Supervisor de SEAPI



**OBSERVACIONES**

**ESTIMACIONES DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE**


# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado	Retenciones			Pago Neto	Reconocimiento de Mayores Costos	Estatus
			Anticipo	Especial	Impuesto S/Renta			
42	01/10/15 al 31/10/2015						L. 14,231.30	En revisión SEAPI ISV
44	01/12/15 al 15/12/2015						L. 349,745.79	En revisión SEAPI Cibusula
48	16/02/16 al 29/02/2016	L. 2153,270.33	L. 322,990.55			L. 1830,279.78		En revisión SEAPI
<b>Total</b>						<b>L. 1830,279.78</b>	<b>L. 363,977.09</b>	

**MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
<b>Total</b>			<b>L. 0.00</b>		



**Módulo C: Colocación de Ducto de Aire Acondicionado en oficinas administrativas del tercer nivel**



**Módulo D: Paredes de tabla yeso en biblioteca 3er nivel.**



**Sistema Contra Incendio: Instalación de tubería exterior**



**Obras Exteriores: Construcción de acera perimetral en módulo B.**

Enlace:

Ing. Nora Judith Alemán Castillo

**Detalle de Contacto**

Ing. Virginia Margarita Valle Aguiluz  
 Directora de Control y Seguimiento de Proyectos  
 Correo Electronico vimavalle@yahoo.com.mx  
 Telefono 22170000- ext 110469





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**  
**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

Información General del Proyecto						
<b>Nombre del Proyecto:</b> "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO RECTORÍA-ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA JOSÉ TRINIDAD REYES"						
<b>Ubicación:</b> PLAZA FUNDACIONAL CIUDAD UNIVERSITARIA, JOSÉ TRINIDAD REYES						
<b>Responsable del Diseño y Especificaciones Técnicas:</b> Diseño Arquitectónico: Jorge Luciano Jacinto Durón Bustillo, CAH: 003, Diseño Estructural: Ing. Rafael Rivera Medina Especificaciones Técnicas, Diseño Eléctrico e Hidrosanitario: la SEAPI						
<b>Estructura Presupuestaria:</b>	PROGRAMA: 03.01.01; CÓDIGO: 81	Presupuesto Aprobado Según Fuente de Financiamiento (en Lempiros):	Fuente 11:	Año 2012+ 68,500,000.00		
	OBJETO DEL GASTO 47100.01		Fuente 12:	Año 2013+ 127,857,216.97 Solicitado Año 2014 + 222,923,538.54 Solicitado Año 2015+ 342,390,967.76 Solicitado Año 2016+ 86,787,864.22		
<b>Año de Aprobación del Proyecto:</b>	2012	<b>Tipo de Proceso (Licitación Pública, Privada, Contratación Directa, Por Administración, Etc.):</b>	Licitación Pública			
<b>Descripción del Proyecto:</b>	Es una edificación que consta de trece distintos niveles, con un área total de 30,000.00 mts <sup>2</sup> de construcción, en el que se ubicarán todas las áreas administrativas de la Universidad: contará con un auditorio para más de 200 personas, estacionamiento para 103 vehículos, obras exteriores, rampas, calles de acceso y ambientes especiales de cafetería.		<b>Contratado:</b>	META/M <sup>2</sup> 30,000.00 m <sup>2</sup>		
	En respuesta al Plan Maestro de Ciudad Universitaria se construye el Edificio de Rectoría Administrativa para contar con un espacio físico de acuerdo a lo requerido para que puedan funcionar eficientemente las oficinas de las Autoridades Universitarias, Académicas, Administrativas y poder brindar una mejor atención a la Comunidad Universitaria y público en general. Recuperar los espacios que estas dependencias han venido utilizando para aulas y el Edificio que originalmente fue diseñado para la Biblioteca Central.		<b>Avance Actual:</b>	26,100.00 m <sup>2</sup>		
<b>Propósito:</b>	Durante la fase de construcción, se presentarán impactos negativos temporales, recuperables y de baja intensidad en su mayoría, presentándose: alteraciones en las calidades del aire, ocasionadas por el polvo que generan las actividades de construcción y por movimiento vehicular propio de la obra y externas a la misma, alteraciones en los niveles sonoros. Se identificó que habrá desaparición de flora (árboles, arbustos y hierba) y afección de la fauna asociada, lo que conlleva a cambios y deterioros en el paisaje. El proyecto generará desechos sólidos y posibles derrames de las maquinarias (aceites, etc.). En la fase de operación, se identificaron impactos positivos en su mayoría debido a que cuenta con sistemas automatizados para garantizar el ahorro energético. De acuerdo con la legislación ambiental y la Tabla de Categorización Ambiental de la AMDC (Plan de Arbitrios 2012) el proyecto es de Categoría 2. En este caso, el proyecto cuenta con Autorización Ambiental emitida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, siendo factible el proyecto ambientalmente bajo el cumplimiento de las medidas de mitigación del Contrato de Medidas de Mitigación emitido con la Constancia No. C2-17-12. Se elaboró un Plan de Gestión Ambiental.		<b>Sector:</b>	Educación		
	El proyecto está ubicado en un área que anteriormente estaba destinado para estacionamiento. Este proyecto se desarrolló verticalmente a partir del terreno natural en nueve niveles, para cubrir la necesidad de espacios para todas las autoridades académicas y administrativas, además de la oferta de servicios al estudiantado y público general.		<b>Subsector:</b>	Educación Superior		
<b>Impacto Ambiental:</b>	Durante la fase de construcción, se presentarán impactos negativos temporales, recuperables y de baja intensidad en su mayoría, presentándose: alteraciones en las calidades del aire, ocasionadas por el polvo que generan las actividades de construcción y por movimiento vehicular propio de la obra y externas a la misma, alteraciones en los niveles sonoros. Se identificó que habrá desaparición de flora (árboles, arbustos y hierba) y afección de la fauna asociada, lo que conlleva a cambios y deterioros en el paisaje. El proyecto generará desechos sólidos y posibles derrames de las maquinarias (aceites, etc.). En la fase de operación, se identificaron impactos positivos en su mayoría debido a que cuenta con sistemas automatizados para garantizar el ahorro energético. De acuerdo con la legislación ambiental y la Tabla de Categorización Ambiental de la AMDC (Plan de Arbitrios 2012) el proyecto es de Categoría 2. En este caso, el proyecto cuenta con Autorización Ambiental emitida por la Alcaldía Municipal del Distrito Central, siendo factible el proyecto ambientalmente bajo el cumplimiento de las medidas de mitigación del Contrato de Medidas de Mitigación emitido con la Constancia No. C2-17-12. Se elaboró un Plan de Gestión Ambiental.					
<b>Impacto en el terreno y Asentamientos:</b>	El proyecto está ubicado en un área que anteriormente estaba destinado para estacionamiento. Este proyecto se desarrolló verticalmente a partir del terreno natural en nueve niveles, para cubrir la necesidad de espacios para todas las autoridades académicas y administrativas, además de la oferta de servicios al estudiantado y público general.					
<b>Alcance:</b>	Centralizar el área administrativa para eficientar su desempeño.					
Proceso de Adjudicación de Construcción						
<b>Número de Licitación o del Tipo de Proceso:</b>	No de Licitación LPN-UNAH-SEAPI-03-2012	<b>Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a Licitación:</b>		17/08/2012; 20/08/2012		
<b>Fecha de Apertura de Ofertas:</b>	01/10/2012	<b>Número de Empresas que Retiraron Bases:</b>	5	<b>Número de Empresas que Presentaron Ofertas:</b>	4	
<b>Fecha y No. de Acuerdo de la Comisión Evaluadora:</b>	Acuerdo No 1583-2012, con fecha 27/08/2012	<b>Empresa Adjudicada:</b>	SATO S. de R. L. de C.V.	<b>Valor Adjudicado:</b>	449,326,841.58	
<b>Fecha Firma del Contrato:</b>	23/11/2012	<b>No. de Contrato:</b>	CC-08-2012-SEAPI-UNAH	<b>Plazo del Contrato:</b>	CONTRATADO: 24 MESES MODIFICADO: 43 MESES, 27 DIAS	
Garantías de Construcción						
<b>Tipo de Garantía</b>	<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Periodo de Validez</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Empresa Emisora de la Garantía</b>	
Garantía de Anticipo	No. 219/2012	L. 67,399,026.23	12/12/2012 al 12/01/2015	12/01/2015	Banco LAFISE S.A.	
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 219/2012	L. 66,648,683.48	12/12/2012 al 12/01/2015	12/01/2015		
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 219/2012	L. 62,632,433.87	12/12/2012 al 12/01/2015	12/01/2015		
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 101510016999	L. 59,700,696.17	12/12/2012 al 12/01/2015	12/01/2015		
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 101510016999	L. 51,807,294.55	12/12/2012 al 12/01/2015	12/01/2015		
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 101510016999	L. 46,152,451.38	12/12/2012 al 12/01/2015	12/01/2015		
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 101510016999	L. 42,375,489.90	12/12/2012 al 12/01/2015	12/01/2015		
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 101510016999	L. 38,688,108.57	12/12/2012 al 30/06/2015	30/06/2015		
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 101510016999	L. 27,477,638.66	30/06/2015 al 30/09/2015	30/09/2015		
Adendum de Garantía de Anticipo	No. 101510016999	L. 8,158,483.29	30/09/2015 al 31/12/2015	31/12/2015		
Garantía de Cumplimiento	No. 218/2012	L. 67,399,026.23	12/12/2012 al 12/04/2015	12/04/2015		
Adendum de Garantía de Cumplimiento	No. 101510016998	L. 54,643,443.42	12/12/2012 al 30/09/2015	30/09/2015		
Adendum de Garantía de Cumplimiento	No. 101510016998	L. 43,545,378.14	12/12/2012 al 31/12/2015	31/12/2015		
Adendum de Garantía de Cumplimiento	No. 101510016998	L. 23,000,000.00	12/12/2012 al 31/03/2016	31/03/2016		
Adendum de Garantía de Cumplimiento	No. 101510016998	L. 10,700,000.00	12/12/2012 al 31/05/2016	31/05/2016		
Garantía de Calidad	La garantía de calidad entra en vigencia cuando el proyecto finaliza.					

J S



de



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS					
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI					
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS					
Situación de avance al 31 de marzo de 2016					
Proceso de Adjudicación de Supervisión					
Número de Concurso o del Tipo de Proceso:	CPN-UNAH-SEAPI-01-2012, PAQUETE 2		Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a Concursar:	12 y 13/03/2012	
Fecha de Apertura de Ofertas	19/04/2012	Número de Empresas que Retiraron Bases:	8	Número de Empresas que Presentaron Ofertas:	5
Fecha y No. de Acuerdo de La Comisión Evaluadora:	No 692-2012 de fecha 20/04/2012		Empresa Adjudicada:	SAYBE & ASOCIADOS S. de R.L.	Valor Adjudicado:
Fecha Firma del Contrato	23/11/2012		No. de Contrato:	CS-03-2012-SEAPI-UNAH	Plazo del Contrato:
CONTRATADO: 25 MESES MODIFICADO: 40 MESES, 10 DIAS					
Garantías de Supervisión					
Tipo de Garantía	Número	Valor	Periodo de Validez	Fecha de Vencimiento	Empresa Emisora de la Garantía
Garantía de Cumplimiento	FI-1040215-308-0	459,092.30	23/11/2012 al 23/11/2015	23/11/2015	Seguros LAFISE Honduras
Garantía de Cumplimiento por la Ampliación del valor del contrato según Modificación No. 1 al contrato original	300384092	25,253.74	22/04/2013 al 21/04/2015	21/04/2015	BAC Honduras
Garantía de Cumplimiento por la Ampliación del valor del contrato según Modificación No. 2 al contrato original	300384822	571,958.56	19/01/2015 al 15/06/2015	15/06/2015	BAC Honduras
Garantía de Cumplimiento por la Ampliación del valor del contrato según Modificación No. 3 al contrato original	300384822	571,958.56	15/06/2015 al 15/10/2015	15/10/2015	BAC Honduras
Garantía de Cumplimiento por la Ampliación del valor del contrato según Modificación No. 4 al contrato original	300385028	578,159.96	13/07/2015 al 15/01/2016	15/01/2016	BAC Honduras
Garantía de Cumplimiento por la Ampliación del valor del contrato según Modificación No. 4 al contrato original	300385028	578,159.96	16/01/2016 al 31/03/2016	31/03/2016	BAC Honduras
Seguimiento del Proyecto					
Concepto	Construcción		Supervisión		
Fecha Orden de Inicio	4 de enero 2013		21 de diciembre 2012		
Fecha de Finalización Contractual	4 de enero de 2015		21 de enero de 2015		
Fecha de Finalización con ampliaciones	30 de agosto de 2016		30 de abril de 2016		
Tiempo Transcurrido (Días, meses)	38 meses, 27 días		39 meses, 10 días		
Tiempo Disponible (Días, meses)	5 mes, 0 días		1 mes, 0 días		
Ampliaciones de Tiempo (Días, meses)	19 meses, 27 días		15 meses, 10 días		
% de Tiempo Ejecutado	88.61%		96.69%		
Valor del Contrato	L. 449,326,841.58		L. 26,047,856.23		
Valor Modificado acumulado	L. 556,096,668.66		L. 32,559,819.78		
Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha	L. 502,690,796.36		L. 32,174,379.81		
Saldo del Contrato	L. 53,405,872.30		L. 385,439.97		
% del Valor Contratado Ejecutado a la Fecha	90.40%		98.82%		
% de Obra Física Ejecutada	87.00%				
Número de Libros de Bitácora	7 libros de bitácora con números 16584, 17048, 17572, 18415, 19303, 20043 y 21204 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.				
El valor reportado como ejecutado en el año anterior y ejecutado a la fecha se ha considerado en base al valor del contrato, sin incluir el valor ejecutado por cláusula escalatoria.					
Modificaciones al Contrato de Construcción					
Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
Orden de Cambio No. 1	17/06/2013	Aumento de valor del contrato	L. 2,403,856.55		Se incorporaron obras nuevas para áreas de parques adicionales y aumento de obra en actividades ya contratadas.
Orden de Cambio No. 2	10/10/2013	Aumento de valor del contrato	L. 5,190,593.18		Aumento de elementos de cimentación y otras elementos estructurales y obras nuevas: modificación de elementos estructurales, mejoramiento del suelo y red de salida de aguas lluvias.
Orden de Cambio No. 3	16/12/2013	Disminución de valor del contrato	-L. 5,807,811.70		Disminución de elementos estructurales, aumento en obras de cerco provisional y elementos estructurales del primer nivel y obra nueva de modificaciones en elementos estructurales y cerco perimetral.
Orden de Cambio No. 4	20/01/2014	Aumento de valor del contrato	L. 7,386,162.86		Aumento de obras contratadas y obras nuevas para la construcción del segundo acceso al sótano.
Orden de Cambio No. 5	31/03/2014	Aumento de valor del contrato	L. 3,229,468.53		Aumento de obras contratadas y obras nuevas para la construcción de elementos estructurales y sustitución de tipo de vidrio o utilizar en las ventanales.
Orden de Cambio No. 6	04/07/2014	Disminución de valor del contrato	-L. 7,868,529.92		Reconocimiento de acero en elementos estructurales, disminución de cantidades de obra en actividades varias.
Orden de Cambio No. 7	01/12/2014	Aumento de valor del contrato	L. 3,405,496.37		Disminución de obras contratadas. Aumento de obras contratadas y obras nuevas de albañilería, elementos estructurales y cerámica de baños.
Modificación No.1	19/12/2014	Aumento de valor del contrato y ampliación de tiempo	L. 98,462,886.29	5 meses, 27 días	Disminución de obras contratadas. Aumento de obras contratadas y obras nuevas varias, entre ellas Sistema de red, Estaciones de Trabajo y Generador Eléctrico.
Modificación No.2	27/05/2015	Aumento de valor del contrato	-L. 4,933,305.92		Disminución de obras contratadas. Aumento de obras contratadas y obras nuevas.
Modificación No.3	30/06/2015	Aumento de valor del contrato	L. 5,649,336.73	92 días	Disminución de obras contratadas. Aumento de obras contratadas y obras nuevas.
Modificación No.4	30/09/2015	Disminución de valor del contrato	-L. 8,539,879.11	92 días	Disminución de obras contratadas. Aumento de obras contratadas y obras nuevas.
Modificación No.5	22/12/2015	Disminución de valor del contrato	-L. 519,353.88	60 días	Disminución de obras contratadas. Aumento de obras contratadas y obras nuevas.
Modificación No.6	01/03/2016	Aumento de valor del contrato	L. 8,710,797.10	6 meses	Disminución de obras contratadas. Aumento de obras contratadas y obras nuevas.
Total			L. 106,769,827.08	19 meses, 27 días	
El valor del incremento acumulado de los órdenes de cambio y modificaciones realizadas a la fecha en el valor original del Contrato de Construcción es de 23.76%.					



J D

h



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**

**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

**Seguimiento Financiero Contrato de Construcción**

# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado, solo estimaciones		Retenciones		Pago Neto	No. de Cheque	Reconocimiento de Mayores Costos	
		Obra	Material Almacenado	Anticipo	Material Puesto en el Sitio				
	Anticipo					L. 67,399,026.23	60478, 320360		
1	04/01/2013 al 31/01/2013	L. 5,002,284.98	L. 5,382,725.31	L. 750,342.75		L. 9,634,667.54	329440	L. 73,997.82	
2	01/02/2013 al 28/02/2013	L. 11,390,168.53		L. 1,708,525.28	L. 1,370,223.88	L. 8,311,419.37	334020	L. 73,318.23	
3	01/03/2013 al 31/03/2013	L. 6,036,641.50	L. 2,295,119.02	L. 905,496.23	L. 889,482.91	L. 6,536,781.38	335617	L. 65,365.26	
4	01/04/2013 al 30/04/2013	L. 9,348,187.35		L. 1,402,228.10	L. 2,496,277.60	L. 5,449,681.65	338119	L. 76,251.47	
5	01/05/2013 al 31/05/2013	L. 3,961,239.04	L. 4,126,107.17	L. 594,185.86	L. 619,686.46	L. 6,873,473.89	341902	L. 37,188.47	
6	01/06/2013 al 17/06/2013	L. 2,080,585.66		L. 312,087.85		L. 1,768,497.81	342163	L. 42,323.77	
7	18/06/2013 al 30/06/2013	L. 6,031,632.12		L. 904,744.82	L. 778,311.36	L. 4,348,575.94	343335	L. 60,667.95	
8	1/07/2013 al 31/07/2013	L. 7,471,461.17		L. 1,120,719.18	L. 575,320.47	L. 5,775,421.52	344564	L. 78,252.49	
9	1/08/2013 al 31/08/2013	L. 10,010,926.97		L. 1,501,839.05	L. 1,692,454.94	L. 6,816,832.98	346360	L. 112,194.02	
10	1/09/2013 al 30/09/2013	L. 7,824,474.74	L. 3,156,478.13	L. 1,173,671.21	L. 1,183,067.26	L. 6,624,214.40	346884	L. 80,987.65	
11	01/10/2013 al 15/10/2013	L. 4,020,195.86		L. 603,029.38	L. 802,688.15	L. 2,614,478.33	348189	L. 64,204.23	
12	16/10/2013 al 31/10/2013	L. 9,748,128.22	L. 3,592,161.40	L. 1,462,219.33	L. 1,496,952.52	L. 10,381,117.87	350171	L. 94,006.10	
13	01/11/2013 al 30/11/2013	L. 10,876,128.04		L. 1,631,419.21	L. 1,524,986.95	L. 7,719,721.88	351383	L. 203,838.50	
14	01/12/2013 al 31/12/2013	L. 10,142,823.52	L. 1,730,027.72	L. 1,521,423.53	L. 1,484,687.65	L. 8,866,740.05	351986	L. 205,906.15	
15	01/01/2014 al 31/01/2014	L. 15,197,607.43	L. 5,566,059.41	L. 2,279,641.31	L. 1,937,322.76	L. 16,546,702.97	360616	L. 498,011.77	
16	01/02/2014 al 28/02/2014	L. 9,417,214.96	L. 6,727,398.40	L. 1,432,582.24	L. 1,182,441.89	L. 7,494,930.73	362628	L. 316,695.63	
17	01/03/2014 al 31/03/2014	L. 10,846,195.68	L. 1,005,201.13	L. 1,626,926.35	L. 1,319,625.01	L. 8,904,842.45	366517	L. 444,361.60	
18	01/04/2014 al 30/04/2014	L. 8,904,603.13		L. 1,335,690.47	L. 549,291.21	L. 7,019,621.45	372920	L. 390,616.58	
19	01/05/2014 al 31/05/2014	L. 4,007,466.44	L. 3,308,102.57	L. 601,119.67	L. 41,757.57	L. 16,472,691.47	379703	L. 207,084.51	
20	01/06/2014 al 15/07/2014	L. 14,505,610.01		L. 2,175,841.30	L. 4,562,249.80	L. 7,737,518.71	381268	L. 689,025.54	
21	16/07/2014 al 31/07/2014	L. 2,657,033.87		L. 398,535.08	L. 812,551.13	L. 1,445,927.66	384025	L. 129,063.54	
22	01/08/2014 al 31/08/2014	L. 3,644,705.21		L. 546,705.78	L. 1,343,456.00	L. 1,754,543.43	386683	L. 186,456.25	
23	01/09/2014 al 30/09/2014	L. 9,686,026.83	L. 415,170.00	L. 1,452,904.02	L. 3,686,287.48	L. 4,962,005.33	392165	L. 217,129.44	
15-19	01/01/2014 al 31/05/2014						393584	L. 636,051.47	
24	01/10/2014 al 31/10/2014	L. 1,785,142.40		L. 260,271.36	L. 538,809.93	L. 946,061.11	393995	L. 75,016.45	
25	01/11/2014 al 15/12/2014	L. 6,892,967.30	L. 954,535.39	L. 1,033,945.10	L. 1,283,200.61	L. 5,530,356.98	396726	L. 284,451.61	
26	16/12/2014 al 31/12/2014	L. 12,287,876.42		L. 1,325,531.95	L. 1,843,181.46	L. 648,272.37	L. 11,121,954.54	398652	L. 271,109.99
27	01/01/2015 al 31/01/2015	L. 10,786,815.72	L. 8,252,546.09	L. 1,615,022.36	L. 3,585,200.49	L. 13,809,138.96	405390	L. 300,495.16	
20-22	01/06/2014 al 31/08/2014						401945	L. 226,421.26	
28	01/02/2015 al 28/02/2015	L. 30,280,788.13		L. 4,542,118.22	L. 8,318,877.83	L. 17,415,792.08	406306	L. 167,200.78	
29	01/03/2015 al 31/03/2015	L. 14,106,230.17		L. 2,115,994.53	L. 1,516,524.97	L. 10,473,770.67	411330	L. 425,450.37	
23-26	01/09/2014 al 31/12/2014						411451	L. 113,480.67	
30	01/04/2015 al 30/04/2015	L. 7,761,422.25	L. 41,510,654.20	L. 1,089,213.34	L. 1,356,261.55	L. 46,326,601.56	416328	L. 219,465.78	
31	01/05/2015 al 31/05/2015	L. 15,720,135.76	L. 690,214.50	L. 2,358,020.36	L. 1,707,545.66	L. 12,344,784.24	418990	L. 581,033.49	
27	01/01/2015 al 31/01/2015						423684	L. 67,030.31	
32	01/06/2015 al 30/06/2015	L. 29,661,425.74	L. 1,582,151.85	L. 4,449,213.86	L. 3,632,259.08	L. 23,162,104.65	426945	L. 657,722.11	
33	01/07/2015 al 31/08/2015	L. 83,406,140.98		L. 12,510,921.15	L. 23,193,833.77	L. 47,701,386.06	427887	L. 245,748.55	
34	01/08/2015 al 30/09/2015	L. 27,323,911.31		L. 4,098,586.70	L. 1,749,420.22	L. 21,475,904.39	433382	L. 715,645.52	
28-29	01/02/2015 al 31/03/2015						435752	L. 84,353.60	
35	01/08/2015 al 30/09/2015	L. 53,927,986.01		L. 4,060,896.59	L. 10,876,405.69	L. 38,990,683.73	Pendiente		
30-32	01/04/2015 al 30/06/2015						Pendiente	L. 115,676.72	
36	01/11/2015 al 31/12/2015	L. 19,928,827.85		L. 0.00		L. 19,928,827.85	Pendiente		
	<b>Totales</b>	<b>L. 496,111,006.29</b>	<b>L. 95,365,525.24</b>	<b>L. 67,399,026.23</b>	<b>L. 88,785,735.17</b>	<b>L. 502,690,796.36</b>		<b>L. 9,534,500.20</b>	

En las estimaciones de la 15 a la 32 correspondientes a los meses de enero de 2014 a junio de 2015, para reconocimiento de mayores costos por el incremento del impuesto sobre ventas se pagó la cantidad de L. 1,176,883.67, atendiendo lo establecido en el Decreto No. 278-2013 que contiene la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antivención publicado el 30 de diciembre de 2014 y que en el artículo 16 modifica la tasa del Impuesto sobre Ventas incrementándolo del 12% a 15%.

**Requerimientos Para el Año 2016**

L. 64738308.5, Solicitado POA 2016

**Modificaciones al Contrato de Supervisión**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
Modificación No. 1-2013	17/06/2013	Aumento valor del contrato	L. 614,641.40	No	Se incorporó al personal clave un Ing. Ambiental y de Seguridad Ocupacional.
Modificación No. 2-2015	19/01/2015	Aumento valor del contrato	L. 5,559,933.83	Si	Se amplió el periodo de supervisión debido a la ampliación del tiempo de ejecución.
Modificación No. 3-2015	19/07/2015	Aumento valor del contrato	L. 337,408.32	Si	Se amplió el periodo de supervisión debido a la ampliación del tiempo de ejecución.
Modificación No. 4-2015	14/10/2015	Ampliación de tiempo	L. 0.00	Si	Se amplió el periodo de supervisión sin aumento al valor del contrato debido a la ampliación del tiempo de ejecución.
Modificación No. 5-2015	22/12/2015	Ampliación de tiempo	L. 0.00	Si	Se amplió el periodo de supervisión sin aumento al valor del contrato debido a la ampliación del tiempo de ejecución.
		<b>Total</b>	<b>L. 6,511,983.55</b>		







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

**Seguimiento Financiero al Contrato de Supervisión**

# Pag.	Periodo del Pago	Valor Facturado	Retenciones		Pago Neto	No. Cheque	Observaciones	
			Impuesto S/Renta	10% Retención de Honorarios				
1	21/12/2012 al 20/01/2013	L. 1,041,914.24		L. 12,242.46	L. 1,029,671.78	333754		
2	21/01/2013 al 20/02/2013	L. 1,041,914.24		L. 12,242.46	L. 1,029,671.78	333765		
3	21/02/2013 al 20/03/2013	L. 1,041,914.24		L. 12,242.46	L. 1,029,671.78	335637		
4	21/03/2013 al 20/04/2013	L. 1,041,914.24		L. 12,242.46	L. 1,029,671.78	336766		
5	21/04/2013 al 20/05/2013	L. 1,041,914.24		L. 12,242.46	L. 1,029,671.78	341426		
6	21/05/2013 al 20/06/2013	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	341792		
7	21/06/2013 al 20/07/2013	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	343862		
8	21/07/2013 al 20/08/2013	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	343913		
9	21/08/2013 al 20/09/2013	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	346688		
10	21/09/2013 al 20/10/2013	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	349213		
11	21/10/2013 al 20/11/2013	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	351380		
12	21/11/2013 al 20/12/2013	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	352082		
13	21/12/2013 al 20/01/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	368519		
14	21/01/2014 al 20/02/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	367630		
15	21/02/2014 al 20/03/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	372226		
16	21/03/2014 al 20/04/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	373918		
17	21/04/2014 al 20/05/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	380524		
18	21/05/2014 al 20/06/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	383673		
19	21/06/2014 al 20/07/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	383673		
20	21/07/2014 al 20/08/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	387204		
21	21/08/2014 al 20/09/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	389788		
22	21/09/2014 al 20/10/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	394667		
23	21/10/2014 al 20/11/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	397460		
24	21/11/2014 al 20/12/2014	L. 1,072,646.31		L. 12,643.31	L. 1,060,003.00	397540		
25	21/12/2014 al 20/01/2015	L. 1,072,646.54		L. 12,643.31	L. 1,060,003.23	402439		
26	21/01/2015 al 20/02/2015	L. 957,540.72		L. 12,101.00	L. 945,439.72	405656		
27	21/02/2015 al 20/03/2015	L. 957,540.72		L. 12,100.89	L. 945,439.83	407672		
28	21/03/2015 al 20/04/2015	L. 957,540.72		L. 12,100.89	L. 945,439.83	412556		
29	21/04/2015 al 20/05/2015	L. 957,540.72		L. 12,100.89	L. 945,439.83	419134		
30	21/05/2015 al 20/06/2015	L. 957,540.72		L. 12,100.89	L. 945,439.83	423064		
31	21/06/2015 al 20/07/2015	L. 772,210.23		L. 6,722.64	L. 765,487.59	428228		
32	21/07/2015 al 20/08/2015	L. 224,988.88		L. 2,756.18	L. 222,232.70	432489		
33	21/07/2015 al 20/09/2015	L. 112,469.44		L. 1,378.09	L. 111,091.35	Pendiente		
<b>Totales</b>		<b>L. 32,559,819.78</b>		<b>L. 385,439.97</b>	<b>L. 32,174,379.81</b>			
			Requerimientos Para el Año 2015		L. 385439.97, Solicitado POA 2015			
<b>OBSERVACIONES</b>								
<b>ESTIMACIONES DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE DE PAGO</b>								
# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado		Retenciones		Pago Neto	Reconocimiento de Mayores Costos	Estatus
		Obra	Material Almacenado	Anticipo	Material Puesto en el Sitio			
	<b>Totales</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>
<b>PAGOS DE LA SUPERVISIÓN EN TRÁMITE</b>								
# Pag.	Periodo del Pago	Valor Facturado	Retenciones		Pago Neto	No. Cheque	Observaciones	
			Impuesto S/Renta	10% Retención de Honorarios				
	<b>Totales</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>			
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE</b>								
Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones			
	<b>Totales</b>		<b>L. 0.00</b>					
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EN TRÁMITE</b>								
Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones			
Modificación No. 6-2016		Ampliación de obra y tiempo	L. 0.00	SI	En trámite de formalización			
	<b>Totales</b>		<b>L. 0.00</b>					

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*







UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

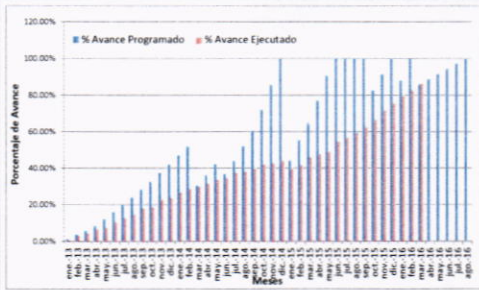

AVANCE FÍSICO

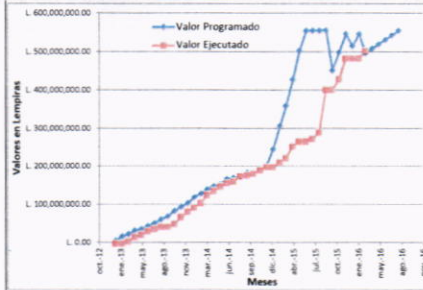

AVANCE FINANCIERO



Compactación de Acceso Este al Sótano.




Instalación de barandal de vidrio en gradas de Planta Baja.



Instalación de dispositivos de seguridad.



Instalación de acabados en Noveno Nivel.

  
Enlace de Oficina: Arq. Jacobo Edmundo Bertrand

  
Asistente de Enlace de Oficina: Ing. Leonardo José Cruz

Detalle de Contacto

Ing. Virginia Margarita Valle Aguiluz  
Directora de Control y Seguimiento de Proyectos  
Correo Electrónico [vimavalle@yahoo.com.mx](mailto:vimavalle@yahoo.com.mx)  
Teléfono 2216-6100 ext.110469







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

Información General del Proyecto							
Nombre del Proyecto:		READECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO PARA EL LABORATORIO DE SERVICIOS GENÉTICOS					
Ubicación:		Edificio J-1, Ciudad Universitaria					
Responsable del Diseño y Especificaciones Técnicas:		Diseño y Especificaciones Técnicas, responsable: Arq. Onasis Isai Moncada Aguilera. Diseño Eléctrico y Especificaciones Eléctricas, responsable: Ing. José Gabriel Zorto Aguilera.					
Estructura Presupuestaria:		PROGRAMA: 03.01.01; CÓDIGO: 132 OBJETO DEL GASTO: 47100.01	Presupuesto Aprobado Según Fuente de Financiamiento (en Lempiras):			Fuente 11:	Año 2014= 3,800,000.00 Año 2015= 4,326,824.36 Año 2016= 850,811.66
Año de Aprobación del Proyecto:		2014	Tipo de Proceso (Licitación Pública, Privada, Contratación Directa, Por Administración, Etc.):			Licitación Pública	
Descripción del Proyecto:		El proyecto consiste en la readequación de un área ubicada en el 2do nivel del edificio de Ciencias Biológicas, para el funcionamiento del Laboratorio de Servicios Genéticos, el cual contará con: área blanca, área gris, área negra, cultivo de células, bodega, área de muestras, consejería, área de espera y áreas complementarias.				META/M <sup>2</sup>	
Propósito del Proyecto		Readecuar y adaptar las condiciones del espacio para poner a funcionar un laboratorio que dará servicio a la comunidad, incluyendo acabados especiales que permitan ambientes con la mayor esterilidad posible, de acuerdo a las recomendaciones del Manual de Bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud				Contratado: 284.71 Avance Actual: 284.71	
Impacto ambiental		Durante la fase de construcción, se presentarán impactos negativos temporales, recuperables y de baja intensidad en su mayoría, presentándose aumento de sólidos en suspensión producto de las demoliciones y actividades de construcción, así como alteraciones en los niveles sonoros y generación de desechos sólidos. Se identificó que habrá desaparición de flora (arbustos y hierba). En la etapa de operación, se identificaron impactos positivos generados por la investigación en el área Genética. En este caso, por ser las actividades categorizadas de bajo impacto ambiental, no se elaborará un Plan de Gestión Ambiental, sin embargo, se deberá cumplir con las medidas de mitigación ambiental que se presentan en las Especificaciones Técnicas. El personal técnico especializado en el área ambiental realiza las actividades de control y seguimiento para velar por el cumplimiento de las medidas de mitigación.				Sector: Educación Subsector: Educación Superior	
Impacto en el terreno y asentamientos		El proyecto se desarrolla dentro del edificio J1, por lo que no habrá impacto en el terreno					
Alcance del Proyecto		Dar el servicio a la ciudadanía de realizar análisis genéticos y además desarrollar trabajos de investigación en este campo					
Proceso de Adjudicación de Construcción							
Número de Licitación o del Tipo de Proceso:		LPN-UNAH-SEAPI-No.02-2014		Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a licitar:		4 y 5 de Septiembre de 2014	
Fecha de Apertura de Ofertas:		24/09/2014	Número de Empresas que Retiraron Bases:		12	Número de Empresas que Presentaron Ofertas: 4	
Fecha y No. de Acuerdo de la Comisión Evaluadora:		Fecha 24/09/2014 / 2219 - 2014		Empresa Adjudicada: Construcciones Rodriguez S. de R. L. de C.V.		Valor Adjudicado: L. 3,935,294.87	
Fecha Firma del Contrato:		05/12/2014		No. de Contrato: CC-02-2014-SEAPI-UNAH		Plazo Original del Contrato: 150 días calendario	
Garantías de Construcción							
Tipo de Garantía		Número	Valor	Período de Validez	Fecha de Vencimiento	Fecha Endoso de garantía	Monta de endoso de garantía
Garantía de Anticipo		140121	L. 590,294.23	9 meses del 17/12/2014 al 17/09/2015	17/09/2015	19/10/2015 19/12/2015	
Garantía de Cumplimiento		140375	L. 590,294.23	9 meses del 17/12/2014 al 17/09/2015	17/09/2015	17/12/2015 18/01/2016	L. 577,500.00
Garantía de Calidad		FB-150330	L. 208,533.00	24/11/15 al 24/11/16	24/11/2016		
Proceso de Adjudicación de Supervisión							
Número de Concurso o del Tipo de Proceso:		N/A		Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a Concurrir:		N/A	
Fecha de Apertura de Ofertas:		N/A		Número de Empresas que Retiraron Bases:		N/A	
Fecha y No. de Acuerdo de la Comisión Evaluadora:		N/A		Empresa Adjudicada:		N/A	
Fecha Firma del Contrato:		N/A		No. de Contrato:		N/A	
Garantías de Supervisión							
Tipo de Garantía		Número	Valor	Período de Validez	Fecha de Vencimiento	Empresa Emisora de la Garantía	
Garantía de Cumplimiento		N/A				N/A	
Seguimiento del Proyecto							
Concepto				Construcción		Supervisión	
Fecha Orden de Inicio				02-ene-15			
Fecha de Finalización Original				31-may-15			
Fecha de Finalización modificada				01-oct-15			
Fecha de Finalización real*				23 de Octubre			
Nuevo plazo de entrega del Proyecto				273 días calendario			
Tiempo Transcurrido (Días, meses)				333 días calendario			
Tiempo Disponible (Días, meses)				0 día calendario			
Ampliaciones de Tiempo (Días, meses)				123 días calendario			
% de Tiempo Ejecutado				100.00%			
Valor del Contrato Original				L. 3935,294.87			
Valor Modificado acumulado (Mod. 1, 2, 3,4,5,6)				L. 4170,660.03			
Valor Ejecutado Acumulado hasta el año anterior				L. 590,294.23			
Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha				L. 4170,660.03			
Saldo del Contrato				L. 0.00			
% del Valor Contratado Ejecutado a la Fecha				100.00%			
% de Obra Física Ejecutada				100.00%			
Número de Libros de Bitácora				Libro de bitácora con número 19544, 20126, 21036 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.			

\* El contratista se atrasó en la entrega de las obras 22 días calendario, por lo que se le aplicará una multa por L. 147,180.00



La Supervisión está a cargo de la Ing. Sandra Maria Abrego Falck por parte de SEAPI a partir del 02 de enero de 2015, mediante acuerdo de Rectoría No. 013-2015





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

**Modificaciones al Contrato de Construcción**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
Modificación No. 1	27 de mayo	Modificación de 50 días de plazo adicionales	L. 0.00	50 días calendario	El plazo contractual se amplía a 200 días calendario
Modificación No. 2	06 de julio	Modificación de Monto del Contrato de Obra Pública	L. 16,341.20	0	-
Modificación No. 3	13 de julio	Modificación de Monto y Plazo al Contrato de Obra Pública	L. 144,975.48	33 días calendario	El plazo contractual se amplía a 233 días calendario
Modificación No. 4	21 de agosto	Modificación de Monto y Plazo al Contrato de Obra Pública	L. 110,631.79	26 días calendario	El plazo contractual se amplía a 259 días calendario
Modificación No. 5	16 de septiembre	Modificación de Monto y Plazo al Contrato de Obra Pública	L. 35,076.35	14 días calendario	El plazo contractual se amplía a 273 días calendario
Modificación No. 6	01 de octubre	Modificación de Monto al Contrato de Obra Pública	-L. 71,659.66	0	-
<b>Total</b>			<b>L. 235,365.16</b>		

**Seguimiento Financiero Contrato de Construcción**

# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado solo estimaciones		Retenciones		Pago Neto	Pago neto (Menos multa=L.6690.00 x 22 días)	No. de Cheque
		Obra	Material Almacenado	Anticipo	Material Puesto en el Sitio			
<b>Anticipo</b>						L. 590,294.23		393672
No. 1	02 al 31 de enero de 2015	L. 195,063.39		L. 29,259.51		L. 165,803.88		402449
No. 2	01 al 28 de febrero de 2015	L. 283,825.79		L. 42,573.87		L. 241,251.92		406218
No. 3	01 al 31 de marzo 2015	L. 78,957.40		L. 11,843.61		L. 67,113.79		412634
No. 4	01 de abril al 30 de junio 2015	L. 274,837.10		L. 41,225.57	L. 92,556.22	L. 326,167.75		423033
No. 5	01 al 31 de julio 2015	L. 516,586.36		L. 77,487.95		L. 439,098.41		427024
No. 6	2 al 31 de agosto 2015	L. 616,750.91		L. 92,512.64		L. 524,238.27		429600
No. 7	01 sept al 01 de oct 2015	L. 1353,827.42		L. 203,074.11	-L. 92,556.22	L. 1058,197.09		434201
No. 8	02 al 23 de oct 2015	L. 850,811.66		L. 92,316.97		L. 758,494.69	L. 611,314.69	
<b>Totales</b>		<b>L. 4170,660.03</b>		<b>L. 590,294.23</b>	<b>L. 92,556.22</b>	<b>L. 4170,660.03</b>	<b>L. 4023,480.03</b>	

Requerimientos Para el Año 2016 L. 850,811.66 Solicitado POA 2016

**OBSERVACIONES**

**ESTIMACIONES DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE DE PAGO**

# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado		Retenciones		Pago Neto	Reconocimiento de Mayores Costos	Estatus
		Obra	Material Almacenado	Anticipo	Material Puesto en el Sitio			
<b>Totales</b>		<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	<b>L. 0.00</b>	

**MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
<b>Totales</b>			<b>L. 0.00</b>		







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**

**FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

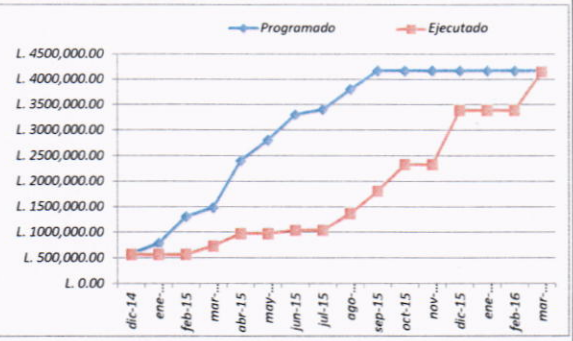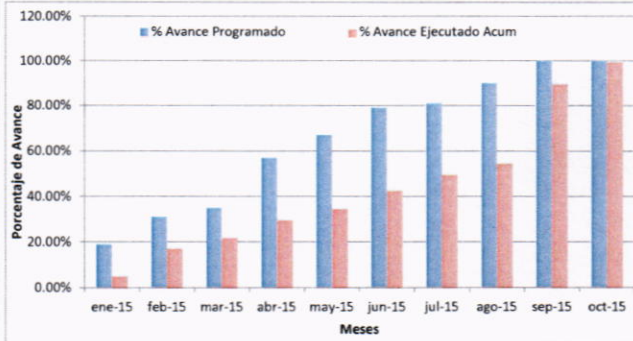

**AVANCE FÍSICO**



Vista de mueble con superficie de acero inoxidable


**AVANCE FINANCIERO**



Vista de tapadera de caja eléctrica en exterior del Edificio J-1



Caseta del Generador para Laboratorio de Servicios Genéticos

Supervisor del Proyecto:  Ing. Sandra María Abrego Falck

Persona Contacto: Ing. Virginia Valle  
 Directora de Control y Seguimiento de Proyectos  
 Correo electrónico: vimavalle@yahoo.com.mx  
 Tel SEAPI: 2216-6100 ext 110469





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS					
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI					
FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS					
Situación de avance al 31 de marzo de 2016					
<b>Información General del Proyecto</b>					
Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LOS EDIFICIOS DE: ODONTOLOGÍA, BIBLIOTECA E IUDPAS				
Ubicación:	Ciudad Universitaria José Trinidad Reyes, M. D. C.				
Responsables del Diseño y Especificaciones Técnicas:	Diseño y Especificaciones Técnicas, responsables: Arq. Nadya Maritza Morazán Coello, Arq. Onasis Isai Moncada Agullera, Arq. Emilio José Maldonado Suazo. Diseño Eléctrico y Especificaciones Eléctricas, responsable: Ing. Bernardo Antonio Ávila Andrade.				
Estructura Presupuestaria:	PROGRAMA: 3.01.01; CÓDIGO: 131	Presupuesto Aprobado Según Fuente de Financiamiento (en Lempras):	Fuente 12B:	Año 2015 = L. 10,564,310.11	
Año de Aprobación del Proyecto:	2014	Tipo de Proceso (Licitación Pública, Privada, Contratación Directa, Por Administración, Etc.):	Licitación Pública		
Descripción del Proyecto:	El proyecto consiste en la construcción de un cuarto de máquinas en el Edificio G1 de la Facultad de Odontología; un elevador panorámico en el Edificio de la Biblioteca; y la instalación de un generador eléctrico en el Edificio IUDPAS.				
			Contratado:	100.00 m <sup>2</sup>	
			Avance Actual:	100.00 m <sup>2</sup>	
Propósito:	En el Cuarto de Máquinas de la Facultad de Odontología se alojarán los compresores existentes y nuevo, además del tanque pulmón para purificar el aire comprimido utilizado en la sillas odontológicas. En cumplimiento de la "Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad", se mejorará la infraestructura existente del Edificio de la Biblioteca, mediante la instalación de un elevador con capacidad para transportar ocho personas. En el caso de fallas en el suministro de energía eléctrica, se instalará un grupo generador que suministrará energía eléctrica de emergencia al Edificio IUDPAS.				Sector:
Impacto Ambiental:	Durante la fase de construcción, se presentarán impactos negativos temporales, recuperables y de baja intensidad en su mayoría, presentándose aumento de sólidos en suspensión producto de las demoliciones y actividades de construcción, así como generación de desechos sólidos. En este caso, por ser las actividades categorizadas de bajo impacto ambiental, no se elaborará Plan de Gestión Ambiental, sin embargo, se deberá cumplir con las medidas de mitigación ambiental que se presentan en las Especificaciones Técnicas.				Subsector:
Impacto en el terreno y Asentamientos:	El proyecto consiste en estructuras de tamaño reducido anexas a los edificios existentes, por lo que no se presentan alteraciones en el terreno de alto impacto.				
Alcance:	Construir instalaciones para mejorar el proceso académico y dar accesibilidad a la comunidad universitaria.				
<b>Proceso de Adjudicación de Construcción</b>					
Número de Licitación o del Tipo de Proceso:	LPN-UNAH-SEAPI No.03-2014		Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a licitar:	18 y 19 de noviembre de 2014	
Fecha de Apertura de Ofertas:	10/12/2014	Número de Empresas que Retiraron Bases:	11	Número de Empresas que Presentaron Ofertas:	2
Fecha y No. de Acuerdo de la Comisión Evaluadora:	Fecha 08/12/2014 / 2830 - 2014	Empresa Adjudicada:	Construcciones Rodríguez S. de R. L. de C.V.	Valor Adjudicado:	L. 8,451,448.09
Fecha Firma del Contrato:	04/02/2015	No. de Contrato:	CC-01-2015-SEAPI-UNAH	Plazo del Contrato:	CONTRATADO: 180 días calendario MODIFICADO: 223 días calendario
<b>Garantías de Construcción</b>					
Tipo de Garantía	Número	Valor	Período de Validez	Fecha de Vencimiento	Empresa Emisora de la Garantía
Garantía de Anticipo	150019	L. 1,267,717.21	12 meses del 23/02/2015 al 23/02/2016	23/02/2016	Seguros del País
Garantía de Cumplimiento	150049	L. 1,267,717.21	12 meses del 23/02/2015 al 23/02/2016	23/02/2016	
Garantía de Calidad	160021	L. 416,353.56	12 meses del 08/01/2016 al 08/01/2017	19/01/2016	
<b>Proceso de Adjudicación de Supervisión</b>					
Número de Concurso o del Tipo de Proceso:	N/A		Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a Concursar:	N/A	
Fecha de Apertura de Ofertas:	N/A	Número de Empresas que Retiraron Bases:	N/A	Número de Empresas que Presentaron Ofertas:	N/A
Fecha y No. de Acuerdo de la Comisión Evaluadora:	N/A	Empresa Adjudicada:	N/A	Valor Adjudicado:	N/A
Fecha Firma del Contrato:	N/A	No. de Contrato:	N/A	Plazo del Contrato:	N/A
<b>Garantías de Supervisión</b>					
Tipo de Garantía	Número	Valor	Período de Validez	Fecha de Vencimiento	Empresa Emisora de la Garantía
Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Seguimiento del Proyecto</b>					
Concepto	Construcción			Supervisión	
Fecha Orden de Inicio	6 de marzo 2015				
Fecha de Finalización Contractual	1 de septiembre de 2015				
Fecha de Finalización con Ampliaciones	14 de octubre de 2015				
Tiempo Transcurrido (Días, meses)	308 días				
Tiempo Disponible (Días, meses)	0 días				
Ampliaciones de Tiempo (Días, meses)	43 días				
% de Tiempo Ejecutado	138.12%				
Valor del Contrato	L. 8,451,448.09			La Supervisión está a cargo del Ing. Leonardo José Cruz Zelaya por parte de SEAPI, mediante acuerdo de Rectoría No. 140-2015	
Valor Modificado acumulado	L. 124,376.81				
Valor del Contrato Modificado	L. 8,327,071.28				
Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha	L. 7,318,467.19				
Saldo del Contrato	L. 1,008,604.09				
% del Valor Contratado Ejecutado a la Fecha	87.89%				
% de Obra Física Ejecutada	100.00%				
Número de Libros de Bitácora	2 libros de bitácora con números 19848 y 20749 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.				
El proyecto fue entregado el 07 de enero del 2016. El Contratista presentó un atraso de 86 días en la entrega del proyecto, tiempo por el cual fue multado según el Contrato.					
<b>Modificaciones al Contrato de Construcción</b>					
Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
Modificación No. 1		Ampliación de tiempo		15 días	Ampliación de tiempo en 75 días para el Cuarto de Máquinas de Odontología y Generador del IUDPAS y 15 días para Biblioteca.
Modificación No. 2		Aumento de valor del contrato y ampliación de tiempo	L. 42,991.21	28 días	Ampliación de tiempo en 25 días para el Cuarto de Máquinas de Odontología, 15 días para Biblioteca y 14 para el Generador del IUDPAS.
Modificación No. 3		Ampliación de tiempo		0 días	Ampliación de tiempo en 14 días para Biblioteca.
Modificación No. 4		Disminución de valor del contrato	L. -167,368.02	0 días	Disminución, eliminación y aumento de obras e incorporación de nuevas actividades.
Total			L. -124,376.81		



*Handwritten signature or initials.*



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI**

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

**Seguimiento Financiero Contrato de Construcción**

# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado, solo estimaciones		Retenciones		Pago Neto	No. de Cheque	Reconocimiento de Mayores Costos
		Obra	Material Almacenado	Anticipo	Material Puesto en el Sitio			
	Anticipo					L. 1,267,717.21	399129	
1	06/01/2015 al 06/05/2015	L. 376,719.53	L. -	L. 49,007.83	L. -	L. 277,711.60	412554	L. 5,844.35
2	07/05/2015 al 06/07/2015	L. 394,000.51	L. -	L. 58,100.08	L. -	L. 334,900.43	422977	L. 5,498.02
3	07/07/2015 al 31/08/2015	L. 396,637.66	L. -	L. 59,495.65	L. -	L. 337,142.01	428549	
4	01/09/2015 al 15/10/2015	L. 4,248,720.86	L. -	L. 637,308.13	L. -	L. 3,611,412.73	Pendiente	L. 36,643.68
5	16/10/2015 al 15/11/2015	L. 1,752,430.84	L. -	L. 262,867.63	L. -	L. 1,489,563.21	Pendiente	L. 3,403.80
	<b>Totales</b>	<b>L. 7,118,529.40</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 1,067,779.42</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 7,318,467.19</b>		<b>L. 51,389.85</b>
Requerimientos Para el Año 2015						L. 3,194,453.07		



**OBSERVACIONES**


**ESTIMACIONES DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE DE PAGO**

# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado		Retenciones		Pago Neto	Reconocimiento de Mayores Costos	Estatus
		Obra	Material Almacenado	Anticipo	Material Puesto en el Sitio			
6	16/11/2015 al 07/01/2016	L. 1,188,809.87	L. -	L. 399,937.79	L. -	L. 988,872.08		En preparación por el Contratista
	<b>Totales</b>	<b>L. 1,188,809.87</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 399,937.79</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 988,872.08</b>	<b>L. -</b>	

**MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
			L. -		
<b>Totales</b>			L. -		

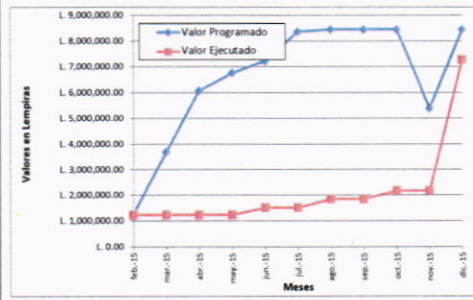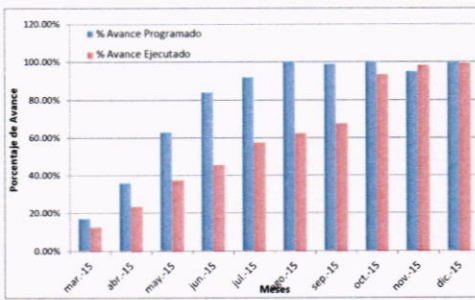

  
 Supervisor : Ing. Leonardo José Cruz Zelaya

Detalle de Contacto

Ing. Virginia Margarita Valle Aguiluz  
 Directora de Control y Seguimiento de Proyectos  
 Correo Electrónico [vimavalle@yahoo.com.mx](mailto:vimavalle@yahoo.com.mx)  
 Teléfono 2216-6100 ext.110469







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

Información General del Proyecto					
Nombre del Proyecto:		Readecuación y Mejoramiento de S.S. y Sistema de Distribución Eléctrica de los Edificios No.1, No.2, No.4 y Biblioteca en UNAH-VS.			
Ubicación:		UNAH-VS, San Pedro Sula, Cortes.			
Responsables del Diseño y Especificaciones Técnicas:		Diseño Arquitectónico: Arq.Argen Perdomo, Ing. Edgardo Avila , Diseño Eléctrico: Ing. Gabriel Zorto Diseño Hidrosanitario: Ing. Pedro Castro, Especificaciones Técnicas: Arq. Maria de los Angeles Hernández			
Estructura Presupuestaria:		PROGRAMA: 3.01.01; CÓDIGO: 134 OBJETO DEL GASTO: 47100-01	Presupuesto Aprobado Según Fuente de Financiamiento (en Lempiras):	Fuente 12B:	Año 2016 = L. 26391473.20
Año de Aprobación de Proyecto:		2015	Tipo de Proceso (Licitación Pública, Privada, Contratación Directa, Por Administración, Etc.):	Licitación Pública	
Descripción del Proyecto:		El proyecto consiste en la readecuación de los módulos sanitarios existentes en los Edificios No.1, No.2 y No.4, renovando todos los aspectos del espacio físico: piso, paredes, cerámica de pared, divisiones de baños, urinales e inodoros con sistema ahorro de agua, lavamanos, iluminación, tubería de agua potable, tubería de agua residual, pintura general, etc. y la readecuación del sistema eléctrico, aire acondicionado y ventanas del edificio de la biblioteca		Contratado	3760.00 m <sup>2</sup>
				Avance Actual:	3,384.00
Propósito del proyecto:		El propósito del proyecto es proporcionar Servicios Sanitarios adecuados para los estudiantes universitarios, personal docente y administrativo de UNAH-VS			
Impacto Ambiental		Durante la fase de construcción, se presentarán impactos negativos temporales, recuperables y de baja intensidad en su mayoría, presentándose alteraciones en las calidades del aire, ocasionadas por el polvo que generan las actividades de demolición y en los niveles sonoros. El proyecto generará desechos sólidos y posibles derrames de las maquinarias (aceites, etc.). En la etapa de operación, se identificaron impactos positivos en el ahorro del agua y energía, accesibilidad universal y mejor funcionamiento del sistema. En este caso, por ser las actividades categorizadas de bajo impacto ambiental, no se elaboró un Plan de Gestión Ambiental, sin embargo, se deberá cumplir con las medidas de mitigación ambiental que se presentan en las Especificaciones Técnicas.			
Impacto en el Terreno y Asentamientos		El proyecto consiste en la readecuación y mejoramiento de los servicios sanitarios en las áreas destinadas para el mismo uso, por lo que no se presentarán alteraciones en el terreno.			
Alcance del Proyecto		Readecuar y Mejorar los Servicios Sanitarios y Sistema de Distribución Eléctrica de los Edificios No.1, No.2, No.4 y Biblioteca.			
Proceso de Adjudicación de Construcción					
Número de Licitación o del Tipo de Proceso:		LPN-UNAH-SEAPI. No.01-2015	Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a licitar:	24 y 25 de febrero de 2015	
Fecha de Apertura de Ofertas:		24/03/2015	Número de Empresas que Retiraron Bases:	5	Número de Empresas que Presentaron Ofertas: 4
Fecha y No. de Acuerdo de la Comisión Evaluadora:		Fecha 20/03/2015 / 486 - 2015	Empresa Adjudicada:	Ingeniería Electromecánica y Construcción de obras Civiles S de R.L. de C.V.	Valor Adjudicado: L. 32466,910.72
Fecha Firma del Contrato:		25/05/2015	No. de Contrato:	CC-03-2015-SEAPI-UNAH	Plazo del Contrato: 120 días calendario
Garantías de Construcción					
Tipo de Garantía		Número	Valor	Periodo de Validez	Fecha de Vencimiento
Garantía de Anticipo		2015-61-299003510	4,870,036.61	120 días del 02/03/2015 al 31/10/2015	21/10/2015
		201661299003903	1,584,357.43	31/03/2016- 30/06/2016	30/06/2016
Garantía de Cumplimiento		2015-61-299003515	5,450,000.00	7 Meses del 03/06/2015 al 20/04/2016	20/04/2016
Garantía de Calidad		La garantía de calidad entra en vigencia cuando el proyecto finaliza.			
Proceso de Adjudicación de Supervisión					
Número de Concurso o del Tipo de Proceso:		CPN No.1-2015-SEAPI-UNAH	Fecha de Publicación del Aviso de Invitación a Concursar:	25 y 26 de marzo de 2015	
Fecha de Apertura de Ofertas		23/04/2015	Número de Empresas que Retiraron Bases:	4	Número de Empresas que Presentaron Ofertas: 1
Fecha y No. de Acuerdo de la Comisión Evaluadora:		17/04/2015 611-2015	Empresa Adjudicada:	SAYBE Y ASOCIADOS S. de R. L.	Valor Adjudicado: 2,853,821.03
Fecha Firma del Contrato		08 de junio 2015	No. de Contrato:	CS-01-2015-SEAPI-UNAH	Plazo del Contrato: 5 meses
Garantías de Supervisión					
Tipo de Garantía		Número	Valor	Periodo de Validez	Fecha de Vencimiento
Garantía de Cumplimiento		2N-FC-50542-2015	52,368.28	08/06/2015- 08/03/2016	08/03/2016
					Seguros Crefisa
Seguimiento del Proyecto					
Concepto		Construcción		Supervisión	
Fecha Orden de Inicio		23 de junio de 2015		23 de junio 2015	
Fecha de Finalización contractual		20 de octubre de 2015		23 de noviembre de 2015	
Fecha de Finalización con ampliaciones		06 de abril de 2016		30 de abril de 2016	
Tiempo Transcurrido (Días, meses)		282 días		9.25 meses	
Tiempo Disponible (Días, meses)		6 días		1 mes	
Ampliaciones de Tiempo (Días, meses)		169.00		4.25 meses	
% de Tiempo Ejecutado		97.58%		90.24%	
Valor del Contrato		L. 32466,910.72		L. 2853,821.03	
Valor Modificado acumulado		L. 37124,236.93		L. 3556,676.51	
Valor Ejecutado Acumulado hasta el año anterior		L. 14929,932.87		L. 2853,821.03	
Valor Ejecutado Acumulado hasta la fecha		L. 23763,594.74		L. 3556,676.51	
Saldo del Contrato		L. 13360,642.19		L. 0.00	
% del Valor Contratado Ejecutado a la Fecha		64.01%		100%	
% de Obra Física Ejecutada		90.00%		90%	



el





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

Número de Libros de Bitácora tres bitácoras: No 20234, No 20559 Y 21076 del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras

**Modificaciones al Contrato de Construcción**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	valor de modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
Modificación No. 1 al Contrato	20/10/2015	Aumento del valor del contrato	L 1593,161.82	30 días	Aumento de actividades contratadas e incorporación de obras nuevas en electricidad y techos de los edificios.
Modificación No. 2 al Contrato	18/11/2015	Aumento del valor del contrato	L 1971,470.91	60 días	Aumento de actividades en biblioteca.
Modificación No.3 al Contrato	18/01/2016	Aumento del valor del contrato	L 187,740.00	34 días	Instalación de padmouted e instalación de piso en pasillo de edificio No.1.
Modificación No.4 al Contrato	19/02/2016	Aumento del valor del contrato	L 904,953.48	45 días	suministro e instalación de muebles pijos, fabricación e instalación de divisiones de vidrio templado.
<b>Total</b>			<b>L 4657,326.21</b>		

**Seguimiento Financiero Contrato de Construcción**

# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado		Retenciones		Pago Neto	No. de Cheque	Reconocimiento de Mayores Costos
		Obra	Material Almacenado	Anticipo	Material Puesto en el Sitio			
	Anticipo							
1	23 de junio-30 de julio 2015	L 1172,917.54	L 1116,553.98	L 175,937.63		L 4870,036.61	414671	
2	31 de julio-31 de agosto 2015	L 1243,852.51	L 969,707.81	L 186,577.88	L 47,031.55	L 1379,950.89	428416	
3	01 de sep -30 de sep 2015	L 2954,298.68		L 443,144.80	L 17,512.90	L 2493,640.98	434206	
4	01 de oct -20 de nov 2015	L 5146,660.04	L 0.00	L 771,999.01	L 301,890.53	L 4072,770.50	438962	
5	21 de nov-10 de enero 2016	L 5949,674.75		L 861,671.21	L 699,877.83	L 4388,125.71	440584	
6	11 de enero-15 de febrero 2016	L 5642,324.34	L 0.00	L 846,348.65	L 350,439.53	L 4445,536.16	444628	
	<b>Totales</b>	<b>L 22109,727.86</b>	<b>L 1486,261.79</b>	<b>L 3285,679.18</b>	<b>L 1416,752.34</b>	<b>L 23763,594.74</b>		<b>L -</b>
				Requerimientos Para el Año 2016		L 25643,105.75	solicitado POA 2016.	

**Seguimiento Financiero Contrato de Supervisión**

# Pag.	Periodo de Pago	Valor Facturado	Retenciones		Pago Neto	No. Cheque	Observaciones	
			Impuesto S/Renta	10% Retención de Honorarios				
1	23/06/2015 al 22/07/2015	L 570,764.20		L 6,982.44	L 563,781.76	426907		
2	23/07/2015 al 22/08/2015	L 570,764.20		L 6,982.44	L 563,781.76	428420		
3	23/08/2015 al 22/09/2015	L 570,764.20		L 6,982.44	L 563,781.76	433385		
4	23/09/2015 al 22/10/2015	L 570,764.20		L 6,982.44	L 563,781.76	438959		
5	23/10/2015 al 22/11/2015	L 570,764.23		L 6,982.43	L 563,781.80	442182		
6	23/11/2015 al 22/12/2015	L 560,613.61		L 6,942.47	L 553,671.14	N/D		
7	23/12/2015 al 31/12/2015	L 142,241.87		L 1,761.48	L 140,480.39	N/D		
	<b>Totales</b>	<b>L 3556,676.51</b>		<b>L 41,854.66</b>	<b>L 3513,060.37</b>			
				Requerimientos Para el Año 2016		54,215.92		

**OBSERVACIONES**

**ESTIMACIONES DEL CONTRATISTA EN TRÁMITE DE PAGO**

# Est.	Periodo de Estimación	Valor Facturado		Retenciones		Pago Neto	Estatus	Reconocimiento de Mayores Costos
		Obra	Material Almacenado	Anticipo	12.5% ISR			
	<b>Totales</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>		<b>L -</b>

**PAGOS DE LA SUPERVISIÓN EN TRÁMITE**

# Pag.	Periodo de Pago	Valor Facturado	Retenciones		Pago Neto	No. Cheque	Observaciones
			Impuesto S/Renta	10% Retención de Honorarios			
	<b>Totales</b>	<b>L 0.00</b>		<b>L 0.00</b>	<b>L 0.00</b>		

**MODIFICACIONES AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN TRÁMITE**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones
Modificación No.5 al Contrato	14/03/2016	Aumento al contrato respecto al original	L 36975,878.39	22 días	Instalación de paredes de tablayeso.
<b>Totales</b>			<b>L 36975,878.39</b>		

**MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EN TRÁMITE**

Tipo de Modificación	Fecha	Descripción	Valor de Modificación	Ampliación en tiempo	Observaciones



el







UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEAPI

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

Situación de avance al 31 de marzo de 2016

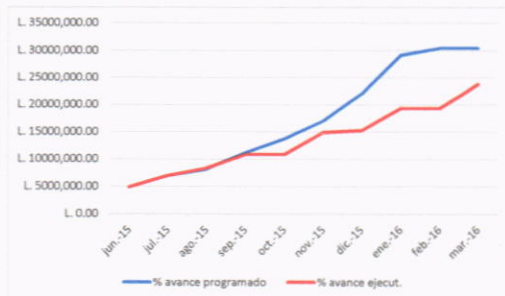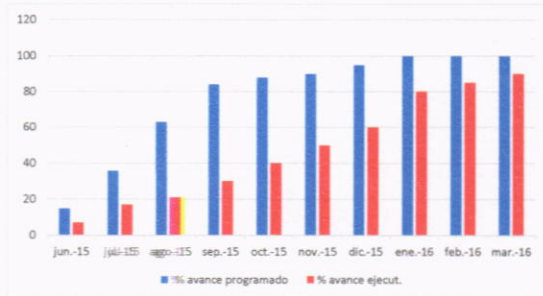

Construcción de colector de aguas lluvias edif. No.2



Instalación de louvers en cubo de gradas del edificio No.4



Construcción de paredes de tablados en biblioteca



Pintura de fachada en módulo oeste edificio No. 4

*[Handwritten Signature]*

Enlace de Oficina : Ing. Delia Maritza Valladares Canales

Contacto: Ing. Virginia Margarita Valle Aguiluz  
Correo Electrónico: vimavalle@yahoo.com.mx  
Tel: 22166100 ext 110469

