



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Municipalidad de Cane, Departamento La Paz
Proyectos Municipales en Materia de Transparencia

Identificación del Proyecto	
1. Propietario del Proyecto:	CONSTRUCTORA INGENIUM S DE R.L.
2. Sector o Sub sector:	BARRIO LA VIOLETA
3. Nombre del Proyecto:	"RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL I ETAPA, UBICADO EN EL BARRIO LA VIOLETA, CANE, LA PAZ."
4. Ubicación Geográfico del Proyecto:	Casco urbano del Municipio
5. Objetivo General del Proyecto:	Beneficiar a 5190 habitantes del municipio de Cane
6. Objetivos Específicos del Proyecto	• Mejorar el acceso recreativo de las personas • Reconstrucción del parque central.
7. Descripción del Proyecto:	El proyecto de reconstrucción del parque central del municipio de Cane, consiste en demolición de áreas existentes, explanación del terreno, pared de bloques para jardinería, fuentes y cisternas, estampado, kiosco centra, instalaciones eléctricas.
Elaboración del Proyecto	
1. Alcance del Proyecto (Principal Producto):	Beneficiar a 5190 habitantes
2. Impacto en las planificaciones institucionales	No aplica
3. Detalles de Contacto:	El contrato se firmó el 03 de Julio del 2023, teniendo una vigencia de 150 días calendario a partir de la orden de inicio
4. Fuente de Financiamiento:	Alcaldía municipal de Cane
6. Costo del Proyecto (En caso de no tener un costo	Lps. 2,985,607.92




LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

exacto, mostrar una proyección del mismo):				
7. Fecha de Finalización:	02/12/2023			
Detalles del Proyecto				
Etapas del Proyecto	Descripción de la Etapa	Periodo de Implementación	Responsable	Indicador de Cumplimiento
EJECUCION	Estampado	17/09/2023 al 14/12/2023	Luis Fernando Martínez	Tramos planeados culminados
Ejecución y Seguimiento del Proyecto				
1. Estado del Proyecto (Actual):	Ejecutado aproximadamente en un 58.13%			
2. Relación de lo planificado con los productos entregados trimestralmente:	NO APLICA			
3. Variación en el costo del Proyecto:	NO APLICA			
4. Variaciones en el alcance y durabilidad del Proyecto:	El proyecto presenta una ampliación de tiempo, con un plazo de 50 días			
5. Razones de los cambios antes mencionados:	NO APLICA			



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org


Luis Fernando Martínez
Desarrollo Comunitario Y Proyectos





Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2023

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: CA.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16596

L.: 741,369.06

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 12925Fecha de Emisión: 19/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 08019018064932La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de segunda Estimación del Proyecto Deconstrucción del Parque Municipal I Etapa, ubicado en el Barrio La Violeta, Cane La Paz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 000 001 47110 11-001-01	Reconstrucción Y Mejoras Del Parque Municipal	741,369.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	741,369.06
Monto Total:		741,369.06

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	741,369.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	741,369.06

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcy/LQzMdGuQ2WiggyzA99QNh3+EWZbt1x94li6NRzZE6btADgbrCDEaJPoEY8HZFI5vulTsLT2YmLkeUX8fPu4ncqoXjfkYLq70vuEnDvHctnCKiwMadp8R
xapLzgZD1XGt6l8Qj8bBg==

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR-CANE-01-2023
NOMBRE DEL PROYECTO:	"PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PARQUE MUNICIPAL, I ETAPA".
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	CANE
ALDEA:	"BARRIO LA VIOLETA"

FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEGUNDA ESTIMACION DEL:	17/9/2023	AL:	14/12/2023
------------------------	---------------	-------------------------	-----------	-----	------------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 2,985,607.92
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 447,841.19
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 2,985,607.92
Monto de SEGUNDA Estimacion	L 972,287.29

VoBo

SUPERVISOR MANCOMUNIDAD



VoBo

SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

Retencion Sobre Anticipo	L 972,287.29	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
	L 2,985,607.92	32.57%	1.25	40.71%	L 447,841.19	L 182,303.87

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Retencion de Calidad de obra	L 972,287.29	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
	L 2,985,607.92	1.050	5.00%	L 972,287.29	L 48,614.36

RESUMEN

Monto Estimado	L 972,287.29
Menos Deduccion de Anticipo	L 182,303.87
Menos Deduccion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 48,614.36
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	L 741,369.06

Monto del Anticipo	L 447,841.19	100.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L 143,088.04	31.95%
AMORTIZACION 2da. ESTIMACION	L 182,303.87	40.71%
TOTAL AMORTIZADO	L 325,391.91	72.66%
FALTA POR AMORTIZAR	L 122,449.28	27.34%

MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: UBICACIÓN: B° LA VIOLETA, CANE, LA PAZ
EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.
ESTIMACION Nº 2
PERIODO: 17/9/2023 AL 14/12/2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
0												
	MODULO: DEMOLICIONES Y DESMONTAJE											
1	CERCA PERIMETRAL PROVISIONAL CON LAMINA ZINC/MADERA	M.L.	185.23	L 294.98	L 54,639.15	185.23	L 54,639.15	0.00	L -	185.23	L 54,639.15	100.00%
2	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (PISO)	M2	904.26	L 52.80	L 47,744.93	904.26	L 47,744.93	0.00	L -	904.26	L 47,744.93	100.00%
3	DESMONTAJE DE POSTES DE LAMPARAS EXISTENTES	UNID	36.00	L 67.38	L 2,425.68	36.00	L 2,425.68	0.00	L -	36.00	L 2,425.68	100.00%
4	DESMONTAJE DE TECHO DE CASETA, KIOSKO	M2	65.45	L 53.90	L 3,527.76	65.45	L 3,527.76	0.00	L -	65.45	L 3,527.76	100.00%
5	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	191.57	L 185.20	L 35,478.76	191.57	L 35,478.76	0.00	L -	191.57	L 35,478.76	100.00%
SUB TOTAL DEL MODULO DEMOLICIONES					L 143,816.27		L 143,816.27		L -		L 143,816.27	100.00%
	MODULO: EXPLANACION DEL TERRENO											
6	CORTE DE MATERIAL CON RETROEXCAVADORA	M3	45.21	L 361.20	L 16,329.85	45.21	L 16,329.85	0.00	L -	45.21	L 16,329.85	100.00%
7	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	58.77	L 185.20	L 10,884.20	58.77	L 10,884.20	0.00	L -	58.77	L 10,884.20	100.00%
8	RELLENO COMP. MATERIAL SELECTO	M3	90.42	L 688.70	L 62,272.25	81.38	L 56,046.41	9.04	L 6,225.85	90.42	L 62,272.25	100.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: EXPLANACION DEL TERRENO					L 89,486.31		L 89,486.31		L 6,225.85		L 89,486.31	100.00%
	MODULO: PARED DE BLOQUE PARA JARDINERAS											
9	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	301.41	L 33.85	L 10,202.73	301.41	L 10,202.73	0.00	L -	301.41	L 10,202.73	100.00%
10	DEMOLICION DE PARED DE BLOQUE	M2	180.85	L 66.00	L 11,936.10	180.85	L 11,936.10	0.00	L -	180.85	L 11,936.10	100.00%
11	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	12.06	L 211.20	L 2,547.07	12.06	L 2,547.07	0.00	L -	12.06	L 2,547.07	100.00%
12	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	15.67	L 185.20	L 2,902.08	15.67	L 2,902.08	0.00	L -	15.67	L 2,902.08	100.00%
13	SOLERA 15X20 4 N°3 Y N°2 @ 20	ML	301.41	L 252.58	L 76,130.14	301.41	L 76,130.14	0.00	L -	301.41	L 76,130.14	100.00%
14	CASTILLO 15X15 4 N°3 Y No. 3 @ 15	ML	64.59	L 310.37	L 20,046.80	64.59	L 20,046.80	0.00	L -	64.59	L 20,046.80	100.00%
15	PARED DE BLOQUE 15 CMRELLENO DE CONCRETO	M2	195.92	L 710.12	L 139,126.71	150.82	L 107,100.30	45.10	L 32,026.41	195.92	L 139,126.71	100.00%
16	SOLERA SUPERIOR DE 7.00X30.00 CM, 3#3 Y #2@15CM	ML	301.41	L 447.91	L 135,004.55	120.56	L 54,000.03	180.85	L 81,004.52	301.41	L 135,004.55	100.00%
17	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	391.83	L 221.51	L 86,794.26	391.83	L 86,794.26	0.00	L -	391.83	L 86,794.26	100.00%
18	PINTURA DE ACEITE	M2	391.83	L 78.07	L 30,590.17	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: PARED DE BLOQUE JARDIN DE ARBOLES					L 515,280.62		L 371,659.51		L 113,030.94		L 484,690.45	94.06%
	MODULO DE FUENTES Y CISTERNA											
19	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	83.20	L 33.85	L 2,816.32	23.20	L 785.32	60.00	L 2,031.00	83.20	L 2,816.32	100.00%
20	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	7.49	L 211.20	L 1,581.89	7.49	L 1,581.89	0.00	L -	7.49	L 1,581.89	100.00%
21	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	9.73	L 185.20	L 1,802.00	9.73	L 1,802.00	0.00	L -	9.73	L 1,802.00	100.00%
22	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL	M3	21.07	L 688.70	L 14,510.91	0.00	L -	21.07	L 14,510.91	21.07	L 14,510.91	100.00%
23	LOSA DE CIMENTACION e=7CM, 3#3@8CM	M2	15.08	L 928.56	L 14,002.68	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
24	SOLERA 15X15 4 N°3 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	16.34	L 252.58	L 4,127.16	0.00	L -	16.34	L 4,127.16	16.34	L 4,127.16	100.00%
25	PARED DE LADRILLO RAFON A TEZON	M2	9.80	L 808.37	L 7,922.03	0.00	L -	-	L -	0.00	L -	0.00%
26	REPELLO DE PAREDES MORTERO 1:4 e= 2 CMS	M2	19.60	L 125.87	L 2,467.05	0.00	L -	19.60	L 2,467.05	19.60	L 2,467.05	100.00%
27	PULIDO DE PAREDES e=0.5 CM	M2	9.80	L 99.99	L 979.90	0.00	L -	9.80	L 979.90	9.80	L 979.90	100.00%
28	SOLERA SUPERIOR DE 7.00X30.00 CM, 3#3 Y #2@15CM	ML	16.34	L 432.27	L 7,063.29	0.00	L -	16.34	L 7,063.29	16.34	L 7,063.29	100.00%
29	AZULEJOS COLOR AZUL PARA FUENTE	M2	24.88	L 722.14	L 17,966.84	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
30	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	ML	54.00	L 50.10	L 2,705.40	0.00	L -	-	L -	0.00	L -	0.00%
31	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	54.00	L 16.57	L 894.78	0.00	L -	-	L -	0.00	L -	0.00%

MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: UBICACIÓN: B° LA VIOLETA, CANE, LA PAZ
EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.
ESTIMACION Nº 2
PERIODO: 17/9/2023 AL 14/12/2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
32	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 1" SDR 26	ML	54.00	L 38.41	L 2,074.14	0.00	L -	54.00	L 2,074.14	54.00	L 2,074.14	100.00%
33	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1" SDR 26	ML	54.00	L 11.12	L 600.48	0.00	L -	54.00	L 600.48	54.00	L 600.48	100.00%
34	CAJA DE REGISTRO DE 65X65X90 CM	UNID	1.00	L 3,489.67	L 3,489.67	0.00	L -	1.00	L 3,489.67	1.00	L 3,489.67	100.00%
35	CAJA DE VALVULA 0.70X0.60X0.60	UNID	1.00	L 2,109.25	L 2,109.25	0.00	L -		L -	0.00	L -	0.00%
36	ACCESORIOS CONEXIONES	GLB	1.00	L 891.00	L 891.00	0.00	L -	1.00	L 891.00	1.00	L 891.00	100.00%
37	BOMBA PARA SISTEMA DE RIEGO CON ACCESORIOS	GLB	1.00	L 5,609.00	L 5,609.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
38	PEDESTALES DE CONCRETO DE 25X25X50 CM	UNID	3.00	L 777.34	L 2,332.02	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
39	SISTEMA PARA FUENTES CON ACCESORIOS INCLUIDO	GLB	1.00	L 20,470.00	L 20,470.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
40	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	12.00	L 33.85	L 406.20	12.00	L 406.20	0.00	L -	12.00	L 406.20	100.00%
41	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI DURO)	M3	54.76	L 330.00	L 18,070.80	54.76	L 18,070.80	0.00	L -	54.76	L 18,070.80	100.00%
42	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	5.50	L 688.70	L 3,787.85	0.00	L -	5.50	L 3,787.85	5.50	L 3,787.85	100.00%
43	CAMA ARENA COMPAC. E= 5 CM	M3	0.68	L 627.96	L 427.01	0.68	L 427.01	0.00	L -	0.68	L 427.01	100.00%
44	LOSA DE CONCRETO E=20 CM, #4 @ 10 A.S.	M2	10.89	L 1,811.05	L 19,722.12	10.89	L 19,722.12	0.00	L -	10.89	L 19,722.12	100.00%
45	PARED DE CONCRETO REF. e=15 CM, #3 @ 15 a.s.	M2	48.00	L 1,418.99	L 68,111.52	21.12	L 29,969.07		L -	21.12	L 29,969.07	44.00%
46	ENCOFRADO DE LOSA SUPERIOR	M2	10.89	L 959.68	L 10,450.92	0.00	L -	10.89	L 10,450.92	10.89	L 10,450.92	100.00%
47	LOSA DE CONCRETO e= 15 CMS N°4 a/c 12 CMS a/s	M2	10.89	L 3,277.36	L 35,690.45	0.00	L -		L -	0.00	L -	0.00%
48	REPELO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	M2	58.89	L 232.09	L 13,667.78	0.00	L -	58.89	L 13,667.78	58.89	L 13,667.78	100.00%
49	TAPADERA DE CONCRETO CISTERNA 60X60 CM	UNID	1.00	L 748.40	L 748.40	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
50	ACCESORIOS PARA CISTERNA Y FUENTE	UNID	1.00	L 18,818.00	L 18,818.00	0.00	L -	1.00	L 18,818.00	1.00	L 18,818.00	100.00%
51	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	8.10	L 211.20	L 1,710.72	0.00	L -	8.10	L 1,710.72	8.10	L 1,710.72	100.00%
52	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M3	90.00	L 156.98	L 14,128.20	0.00	L -		L -	0.00	L -	0.00%
53	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M3	90.00	L 21.83	L 1,964.70	0.00	L -		L -	0.00	L -	0.00%
54	SUM/INST DE LUZ SPOT EN FUENTE	UNID	6.00	L 1,394.00	L 8,364.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: FUENTES Y CISTERNA					L 332,484.48		L 72,764.40		L 86,669.87		L 159,434.27	47.95%
MODULO: ESTAMPADO												
55	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	150.20	L 33.85	L 5,084.27	0.00	L -	150.20	L 5,084.27	150.20	L 5,084.27	100.00%
56	CONCRETO HIDRAULICO e=10 CM DE 250 KG/CM2	M3	90.43	L 5,462.29	L 493,954.88	0.00	L -	49.43	L 270,000.99	49.43	L 270,000.99	54.66%
57	ESTAMPADO EN CONCRETO	M2	904.26	L 758.08	L 685,501.42	0.00	L -	494.27	L 374,696.20	494.27	L 374,696.20	54.66%
SUB TOTAL DEL MODULO: ESTAMPADO					L 1,184,540.58		L -		L 649,781.47		L 649,781.47	54.86%
MODULO: KIOSKO CENTRAL												
58	TRAZADO Y MARCADO CON ESTACION TOTAL	ML	25.16	L 33.85	L 851.67	25.16	L 851.67	0.00	L -	25.16	L 851.67	100.00%
59	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	8.05	L 211.20	L 1,700.16	8.05	L 1,700.16	0.00	L -	8.05	L 1,700.16	100.00%
60	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	10.47	L 185.20	L 1,939.04	10.47	L 1,939.04	0.00	L -	10.47	L 1,939.04	100.00%
61	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC.)	M3	31.02	L 688.70	L 21,363.47	15.51	L 10,681.74	15.51	L 10,681.74	31.02	L 21,363.47	100.00%
62	MURO DE CONTENCIÓN PARA CONTORNO DE KIOSKO	M3	29.28	L 2,156.36	L 63,138.22	29.28	L 63,138.22	0.00	L -	29.28	L 63,138.22	100.00%
63	GRADAS DE CONCRETO A=1.25m,HUELLA 30cm,CH=15cm	M2	5.78	L 2,929.42	L 16,932.05	2.89	L 8,466.02	2.89	L 8,466.02	5.78	L 16,932.05	100.00%
64	SOLERA 15X15 3 N°3, N°2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	ML	25.16	L 213.13	L 5,362.35	0.00	L -	25.16	L 5,362.35	25.16	L 5,362.35	100.00%
65	COLUMNA METALICA 6X6", CON PINTURA COLOR	UNID	6.00	L 9,544.75	L 57,268.50	0.00	L -	6.00	L 57,268.50	6.00	L 57,268.50	100.00%
66	PEDESTALES DE CONCRETO DE 25X25X50 CM	UNID	6.00	L 777.34	L 4,664.04	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%

MUNICIPALIDAD DE CANE
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
UBICACIÓN: UBICACIÓN: 8° LA VIOLETA, CANE, LA PAZ
EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.
ESTIMACION Nº 2
PERIODO: 17/9/2023 AL 14/12/2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
67	REPELO DE PARED 2 CM CON MORTERO 1:6	M2	42.65	L 113.92	L 4,858.69	42.65	L 4,858.69	0.00	L -	42.65	L 4,858.69	100.00%
68	TECHO CON LAMINA EUROTEJA Y ESTRUCTURA METALICA CON TUBO DE 2X6" PARA KIOSKO	M2	45.68	L 1,317.31	L 60,174.72	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
69	ENCIELADO VIGA VISTA	M2	45.68	L 934.52	L 42,688.87	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
70	PISO DE CONCRETO @=8CM, DE 150 KG/CM2, CON VARILLA DE ¼ @ 25 CM	M3	2.55	L 4,004.44	L 10,211.32	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
71	ESTAMPADO EN CONCRETO	M2	31.84	L 758.08	L 24,137.27	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
72	BARANDAL METALICO SEGÚN DISEÑO	ML	25.16	L 1,143.36	L 28,766.94	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
73	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP. PVC	ML	25.00	L 95.41	L 2,385.25	0.00	L -	25.00	L 2,385.25	25.00	L 2,385.25	100.00%
74	LAMPARA CENTRAL PARA KIOSKO CENTRAL	UNID	1.00	L 4,810.26	L 4,810.26	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
75	GRAMA ARTIFICIAL	M2	26.30	L 936.38	L 24,626.79	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: KIOSKO CENTRAL					L 375,879.62		L 91,635.54		L 84,163.86		L 175,799.40	46.77%
MODULO: INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES												
76	ACOMETIDA ELECTRICA	ML	80.54	L 122.03	L 9,828.30	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
77	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP. PVC	ML	80.67	L 95.41	L 7,696.72	0.00	L -	80.67	L 7,696.72	80.67	L 7,696.72	100.00%
78	CIRCUITO DE FUERZA, HASTA 20 AMP. PVC	ML	80.32	L 145.68	L 11,701.02	0.00	L -	80.32	L 11,701.02	80.32	L 11,701.02	100.00%
79	PEDESTALES DE CONCRETO DE 25X25X50 CM	UNID	18.00	L 777.34	L 13,992.12	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
80	FAROL TIPO POSTE	UNID	18.00	L 5,882.96	L 105,893.28	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
81	EXCAVACION MATERIAL TIPO I	M3	0.50	L 211.20	L 105.60	0.00	L -	0.50	L 105.60	0.50	L 105.60	100.00%
82	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	0.70	L 185.20	L 129.64	0.00	L -	0.70	L 129.64	0.70	L 129.64	100.00%
83	CIRCUITO DE FUERZA HASTA 35 AMPERIOS	ML	89.15	L 143.38	L 12,782.33	0.00	L -	89.15	L 12,782.33	89.15	L 12,782.33	100.00%
84	TOMA CORRIENTE PARA INTERPERIE	UNID	18.00	L 296.10	L 5,329.80	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
85	CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS	UNID	1.00	L 8,419.75	L 8,419.75	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: INSTALACIONES ELECTRICAS GENERALES					L 175,878.56		L -		L 32,415.31		L 32,415.31	18.43%
MODULO: GENERALES												
86	PLANTAS ORNAMENTALES	GBL	1.00	L 79,158.00	L 79,158.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
87	BANCAS METALICAS	UNID	11.00	L 8,098.50	L 89,083.50	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL DEL MODULO: GENERALES					L 168,241.50		L -		L -		L -	0.00%
COSTO PROYECTO					L 2,985,607.92		L 763,136.19		L 972,287.29		L 1,735,423.48	58.13%

EJECUTOR		SUPERVISION UTI MANCER		UNIDAD TECNICA MUNICIPAL		ALCALDE MUNICIPAL DE CANE	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L. CALLE 10 N. 10018054502 LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS		NOMBRE ING. MAURO OSORIO INFRAESTRUCTURA HONDURAS, C.A.		NOMBRE ING. LUIS FERNANDO MARTINEZ		NOMBRE PROF. FRANCISCO BUSTILLO GONZALES	
				Jueves 14 de diciembre de 2023			

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Cane, la Paz 14 de diciembre 2023

FRANCICO BSUTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
DE CANE, LA PAZ
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: "CONSTRUCCION DE PARQUE
MUNICIPAL."

Estimada doctora:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME 2, del proyecto en mención; comprende el periodo del 17 de septiembre de 2023 al 14 de diciembre 2023

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING MAURO RENE OSORIO
Supervisor De Infraestructura
Mamcepez.



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



RESUMEN EJECUTIVO.

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA
CODIGO:	
UBICACIÓN:	CASCO URBANO, CANE, DEPARTAMENTO LA PAZ.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la construcción de primera etapa del parque municipal del municipio de cane
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD.

INVERSION DEL PROYECTO:

CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	APORTE	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L2,985,607.92	L. 0.00	L. 0.00	L2,985,607.92
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L2,985,607.92

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	CONSTRUCTORA INGENIUM
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: MAURO RENE OSORIO MALDONADO
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	3 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	16 DE AGOSTO 2023
FECHA DE ORDEN DE INICIO	06 DE JULIO 2023
PLAZO CONTRACTUAL	150 DIAS
AMPLIACION	SI HABRA AMPLIACION DE TIEMPO.
FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA	22 DE ENERO DE 2024

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se prepara el informe que corresponde a la estimación número 2 del proyecto del parque municipal el cual presenta un avance a la fecha del 58.13% de las actividades del proyecto realizadas las cuales fueron supervisadas y corroboradas en campo para proceder al pago de la estimación.



Observaciones

- Se construyo de la manera correcta y establecida en los planos y actividades contratadas.

Situaciones presentadas

- Se presento la problemática de los cambios climáticos los cuales por la lluvia se dio una ampliación de tiempo

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ingeniero civil con experiencia en el ramo de la construcción, a la fecha se observa una planificación adecuada al proyecto, con un desempeño apto para ejecutar obras de construcción.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. ING RESIDENTE (1)
2. MAESTRO DE OBRA (2)
3. ALBAÑILES (5)
4. AYUDANTE (7)

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVICION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
4. Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
5. Apertura de Bitácora.
6. Verificar calidad de materiales
7. Evaluar el personal contratado.

CONCLUSIONES.

1. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
2. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
3. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Observaciones

- Se construyo de la manera correcta y establecida en los planos y actividades contratadas.

Situaciones presentadas

- Se presento la problemática de los cambios climáticos los cuales por la lluvia se dio una ampliación de tiempo

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un ingeniero civil con experiencia en el ramo de la construcción, a la fecha se observa una planificación adecuada al proyecto, con un desempeño apto para ejecutar obras de construcción.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. **ING RESIDENTE (1)**
2. **MAESTRO DE OBRA (2)**
3. **ALBAÑILES (5)**
4. **AYUDANTE (7)**

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVICION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
4. Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
5. Apertura de Bitácora.
6. Verificar calidad de materiales
7. Evaluar el personal contratado.

CONCLUSIONES.

1. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
2. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
3. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

FOTOGRAFIAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO





Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz




Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Mancomunidad de Municipios del Centro de La Paz

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz

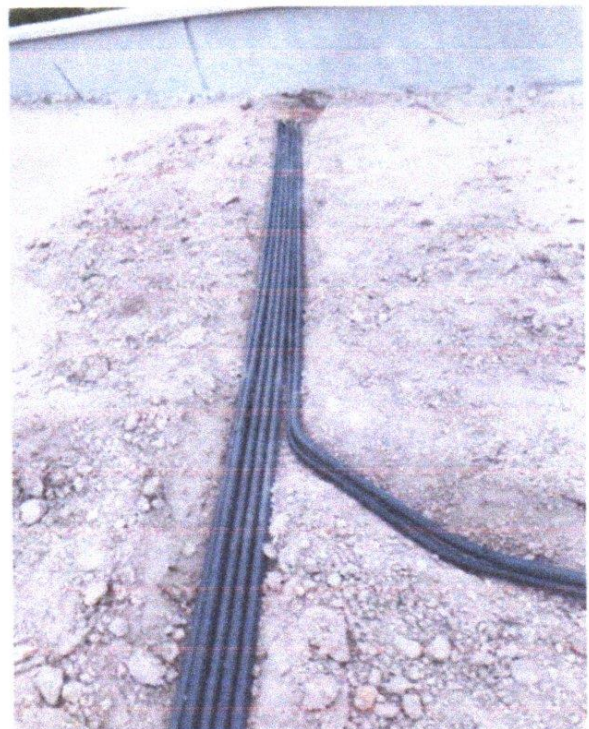

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE 2023

Hoja

Nº 000017

NOB ENCONTRAMOS UN DIA SOLADO

EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO ES EL
SIGUIENTE:

- 1 MAESTRO DE OBRA

- 9 ALBAÑILES

- 12 AYUDANTES

SE ENCONTRABAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

1) EN EL MODULO DE JARDINERAS

SE CONTINUO REPELLANDO PAREDES INTERIORES
Y EXTERIORES.

2)

EN EL MODULO DEL KIOSKO SE CONTINUO CON EL REPELLO
DEL MURO DE CONTENCIÓN.

3) EN EL MODULO DE LA CISTERNA:

TOMANDO EN CUENTA QUE SE REALIZO UNA ORDEN DE
CAMBIO EN ALGUNAS ACTIVIDADES, SE CAMBIO LA

ACTIVIDAD DE PARED DE CONCRETO RLT. E. 15 CM.

#3 @ 15 CM ALS POR LA ACTIVIDAD NUEVA DE PARED

DE BLOQUE FUNDIDO DE 15 CM CON REFUERZO

VERTICAL Y HORIZONTAL #3 @ 40 CM.

YA QUE LA PARED ES DE PLOQUE SE AGREGARON LAS
ACTIVIDADES DE SOLERA INTERIOR DE 15 X 20 CM

(#4 #3 @) 4 #3 Y #2 @ 15 CM CON UNA LONGITUD DE

13.20 ML SE AGREGARON 4 CUSTILOS DE 15 X 20 CM

4 #3 Y #2 @ 15 CM.

Bitácora Nº 038724

SE ACABO LA ACTIVIDAD DE
SOLERA SUPERIOR DE 15X20 CM
CON REFORZO 4#3 Y #2@15CM

Y TAMBIEN SE ACABO LA ACTIVIDAD DE SOLERA AEREO
DE 15X20 CM Y 4#4 Y #2@15CM ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS ACTIVIDADES NUEVAS QUE SE REALIZARON
ESTA SEMANA

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOY ENCONTRAMOS UN DIA SOLEADO

EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO ES EL
SIGUIENTE: 1 INCO. RESIDENTE

1 MAESTRO DE OBRA

- 6 ALBAÑILES

- 14 AYUDANTES

SE ENCUENTRAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

1) EN EL MODULO DEL KIOSKO CONTINUAN FUNDIENDO
LAS GRADAS DE ACCESO AL KIOSKO.

2) EN EL MODULO DE LAS JARDINERAS SE CONTINUA CON
EL REPELLO Y PULIDO DE PAREDES INTERIORES Y
EXTERIORES

VIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE 2023

Hoja

Nº 000020

NOS ENCONTRAMOS UN CLIMA
NUBLADO CON PROBABILIDADES DE LLUVIA.

EN EL PROYECTO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO:

- 1 ING. RESIDENTE
- 1 MAESTRO DE OBRA
- 4 ALBAÑILES
- 14 AYUDANTES

1) EN EL MODULO DE JARDINERAS: SE INICIO A
ENCOFRAR LA SOLEDA SUPERIOR DE 7×30 CM Y
SE COLOCO LA ARMADURA DE ACERO $\#13$ Y $\#2 @ 15$ CM

2) EN EL MODULO DEL ROSCO:

SE FUNDIO LA SOLEDA INFERIOR DE 15×15 CM Y SE
COLOCARON LAS COLUMNAS METALICAS DE 6×6
PULCARAS.

3) MODULO DE LA FUENTE:

SE CONTINUO CON LA PARED DE MORTERO LAFON Y
SE FUNDIERON LOS 4 CISTERNOS.

4) EN EL MODULO DE LA CISTERNA: SE ENCOFRE Y SE
FUNDIO LA LOSA SUPERIOR SIENDO EN UNA ALTURA
QUE LA LOSA DE CONCRETO $L=10$ CM (EL VEL $\#2 @ 40$ Y $\#1 @ 40$ CM)
CON REFUERZO $\#3 @ 15$ CM A/S.

LOS DIAS JUEVES, VIERNES Y SABADO NO SE TRABAJÓ
POR EL FERIADO MORAZANICO.

Bitácora Nº 038724

3) EN EL MODULO DE LA CISTERNA
SE ENCONTRO LA SOLERA SUPERIOR
PERIMETRAL Y LA SOLERA HERRA
Y LUEGO SE FUNDIO.

DE RELLENO CON MATERIAL SELETO UNA CANTIDAD DE
31 m³ DE MATERIAL NECESITANDO 9.93 m³
MAS DE LO QUE ESTABA CONTEMPLADO.
TAMBIEN SE REPELO Y FULTO.

4) MODULO DE LA FUENTE

SE INICIO CON EL TRAZADO Y MARCADO DE LA FUENTE
SE EXCAVO MATERIAL TIPO I Y SE ACARRO EL
MATERIAL DE DESPERDICIO.

NOTA EN ESTE MODULO NO ESTABA CONTEMPLADO LA
ACTIVACION DE MAMPOSTERIA POR LO QUE SE
REALIZO ESTA NUEVA ACTIVACION CON LOS SIGUIENTES
ONTOS:

$$\text{FUENTE} = 10.34 \times 0.40 \times 0.40 = 3.92 \text{ m}^3$$

$$\text{Cuadrado \#1} = 35.40 \times 0.30 \times 0.20 = 2.12 \text{ m}^3$$

$$\text{Cuadrado \#2} = 31.40 \times 0.60 \times 0.20 = 3.77 \text{ m}^3$$

CON UN VOLUMEN TOTAL DE = 9.91 m³ POR ESTA
RAZON EL RELLENO CON MATERIAL SELETO
AUMENTO UN 47%.

EN ESTE MODULO SE REALIZO ORDEN DE CAMBIO
EN LA PARED DE LADRILLO RAFON A YESO
DEBIDO A QUE LA PARED QUEDABA DEMASIADO
ANCHA SE CAMBIO POR PARED DE LADRILLO
RAFON A SOCA Y SE COLOCARON 4
CISTILLOS DE 15X20 CM #13 Y #12@20CM

VIERNES 13 DE OCTUBRE 2023

Hoja

Nº 000021

NOS ENCONTRAMOS CON UN CLIMA
GRACIO.

EN EL PROYECTO SE ENCONTRAN TRABAJANDO:

- 1 JNO RESIDENTE
- 1 MAESTRO DE OBRA
- 4 ALBAÑILES
- 13 AYUDANTES

~~NO~~

1) MODULO DE LAS JARDINERAS:

SE CONTINUA ENCOFRANDO Y FUNDIENDO SOLERA
SUPERIOR DE 7x30 CM.

NOTA:

COMO ORDEN DE CAMBIO SE CONSTRUIRA UN NUEVO
PASTILLO EN LA JARDINERA MAS GRANDE CON UN
ANCHO DE 1.74 ML Y UN LARGO DE 9.95 ML
CON LAS SIGUIENTES NUEVAS ACTIVIDADES:

- DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO.
- TRAZADO Y MARCADO DE 23.38 ML
- EXCAVACION DE MATERIAL TIPO J
- CARGUEO DE MATERIAL TIPO J) DE DESPELLO
- CIMENTACION DE MAMPOSTERIA
- SOLERA INFERIOR DE 15x20 CM

2) MODULO DE LA FUENTE SE REFINO Y ALTO.

~~NO~~

3) MODULO DE LA CISTERNA SE DESENCOFRÓ LA LOSA
SUPERIOR.

VIERNES 20 DE OCTUBRE 2023

Hoja

Nº 000022

NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA
NUBLADO CON PROBABILIDADES DE LUVIA

EN EL PROYECTO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO:

- 1 INCO. RESIDENTE
- 1 MAESTRO DE OBRA
- 4 ALBAÑILES
- 10 AYUDANTES

~~NO~~

REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

1) MODULO DE JARDINERAS: CONTINUAN FUNDIENDO
SOLETA SUPERIOR Y EMPIEZAN EL REPELLO DE
LA MISMA

2) EN EL PASTILLO NUEVO: SE ENCOFRE Y FUNDIO LA
SOLETA SUPERIOR DE 7X30 CM Y REPELLO Y
PULTO LA PARED Y LA SOLETA.

3) EN EL MODULO DEL KIOSKO SE CONSIDERA UNA
ORDEN DE CAMBIO EN LA ACTIVIDAD DE
TECHO CON LAMINA DE EUROTEJA Y ESTRUCTURA
METALICA CON TUBO DE 2X6 PULGADAS POR LA
ACTIVIDAD NUEVA DE TECHO CON ESTRUCTURA
METALICA Y TEJA CURVA EN LA CUAL SE
ESTA TRABAJANDO COLOCANDO LAS VIGAS
CON TUBO DE 2X6" Y LOS TUBO ESTRUCTURALES
DE 2X2 QUE SE VAN A UTILIZAR COMO
CLAVADORES. DEBIDO A ESTO CAMBIO

Bitácora Nº 038724

NOSES HA LLEVADO MAS TIEMPO
YA QUE SE UNCARON EN
SAN PEDRO Y LAS TUDAS A UTILIZAR
Y TARDAN 15 DIAS EN LLEGAR

Hoja

Nº 000023

A) EN EL MODULO DE EXPLANACION DEL TERRENO
YA QUE SE HABIA CONTENPLADO UN CORTI DE
MATERIAL DE 5 CM Y EN CAMPO FUE NECESARIO
CORTAR 17 CM EL RELENO CON MATERIAL SELECCIO
AUMENTO 6330 M3 MAS SE COMPACTO EL
MATERIAL CON EL TORITO. LLEVANDO MAS TIEMPO
DE 10 ESTIMADO PARA ESTA ACTIVIDAD.

SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE
NO SE TRABAJO DEBIDO AL MAL TIEMPO EN
LA ZONA CENTRAL.

SEMANA DEL 6 DE NOVIEMBRE AL SABADO
11 DE NOVIEMBRE NO SE TRABAJO PORQUE
CONTINUARON LAS FUERTES LLUVIAS

Bitácora Nº 038724

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE 2023

Hoja

Nº 000024

NOS ENCONTRAMOS CON UN DIA

NUBLADO CON PROBABILIDADES DE LLUVIA

EN EL PROYECTO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO:

- 1 INO RESIDENTE
- 1 MAESTRO DE OBRA
- 1 ALBAÑIL
- 8 AYUDANTES



REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

EN EL MODULO DE LA CISTERNA: SE APITCO

UN SELLADOR EN LA PARED Y PISO DE LA CISTERNA

CONIENDO ESTA COMO ACTIVIDAD NUEVA.

2) TRABAJO DE LA FUENTE: SE ENCOFRE Y FUNDIO
LA FUENTE Y LUEGO SE ROTO Y REPELO.

3) EN EL MODULO DE JARDINERA COMO ACTIVIDAD
NUEVA SE LOGRO EL CORTE Y CONFORMACION
A MANO. UN TOTAL DE 150.09 m³ CORIENDO Y
CONFORMANDO 18 cm DE CANTO EN LAON UNA
DE LAS JARDINERAS.

SE CONTINUAN LAS ACTIVIDADES
DEL ESTAMPADO EN LA PARTE O EL
AREA MAYOR DEL PABLOVE, UTILIZANDO EL
MOLDE EUROPEAN PAN (ABANTLO) Y EL
COLOR TERRACOTA CON REFESE CHARCOAL
SIEMPRE CORROBORANDO LOS NIVELES Y EL
ESPESOR DE 10 CM DEL CEMENTO.

LUNES 25 DE DICIEMBRE NO SE TRABAJO POR
FESTIVO NACIONAL.

LOS DIAS (LUNES) MARTES, MIERCOLES Y JUEVES
SE TRABAJO UNIFORMEMENTE EN LA COLOCACION DE
LA TEJA CURVA DEL TECHO DEL MUSKO Y LA
INSTALACION DEL ENCLAVADO VIGA VISTA.

NOTA: A SOLICITUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
DE CANE NO SE TRABAJO EN ACTIVIDADES DEL
ESTAMPADO YA QUE ESA SEMANA SE REALIZARAN
ACTIVIDADES ALUSIVAS A LA FIESTA NAVIDEÑA.

VIERNES 15 DE DICIEMBRE 2023

Hoja

Nº 000027

NOV ENCONTRAMOS UN CLIMA
SOLEADO

EN EL PROYECTO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO:

- 1 JNG RESIDENTE
- 1 MAESTRO DE OBRA
- 3 ALBAÑILES
- 4 AYUDANTES

SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DEL
ESTAMPADO FUNDIENDO CON CONCRETO DE
250 KG/CM² Y ESTAMPANDO LOS CORREDORES
CON UN MOLDE RANDOM SINE (PIEDRA) Y
COLOR BUFF CON RELEASE BUFF.

VIERNES 22 DE DICIEMBRE 2023

NOV ENCONTRAMOS CON UN CLIMA SOLEADO.

EN EL PROYECTO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO

- 1 JNG RESIDENTE
- 1 MAESTRO DE OBRA
- 4 ALBAÑILES
- 5 AYUDANTES

Bitácora Nº 038724

DEL DIA LUNES 20 DE NOVIEMBRE

AL SABADO 02 DE DICIEMBRE

Hoja

Nº 000026

SE PARARON LAS ACTIVIDADES

EN EL PROYECTO POR MOTIVOS DE RETRASO EN
LA ENTREGA DE LOS MATERIALES PARA EL ESTAMPADO
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, EN VISTA DE
QUE ESTOS PRODUCTOS SON TRÁFICOS DESDE EL
EXTRANJERO

EL DIA 20 DE NOVIEMBRE SE SOLICITO UNA AMPLIACION
DE TIEMPO DE 50 DIAS A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE
DE 2023

VIERNES 8 DE DICIEMBRE 2023

NOV ENCONTRAMOS CON UN DIA SOLEADO

EN EL PROYECTO SE ENCUENTRAN TRABAJANDO:

1 INGENIERO RESIDENTE

1 MAESTRO DE OBRAS

2 ALBAÑILES

7 AYUDANTES

EN EL MODULO DE ESTAMPADO:

SE INICIO CORROBORANDO LOS NIVELES PARA

EL ESTAMPADO Y ENCOFRANDO LA

PRIMERA PARTE QUE ES LA ALCEA PERIMETRAL
DEL PARQUE Y PARTE DE LOS CORREDORES.

LUEGO SE EMPESO CON LA FUNDICION DEL
CONCRETO Y EL ESTAMPADO DEL MISMO.

Bitácora Nº 038724

EN EL MÓDULO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS:

Hoja

Nº 000025

SE REALIZO LA EXCAVACION PARA
INSTALAR LA TUBERIA DONDE IRA EL SISTEMA
ELECTRICO.

SE INSTALO EL CIRCUITO DE ILUMINACION
SIENDO UN TOTAL DE 43850 ML Y EL
CIRCUITO DE FUERZA UN TOTAL DE 431 ML
SOBREPASANDO LO ESTIMADO Y LLEVANDO MAS
TIEMPO DE LO ESPERADO. SE UTILIZO TUBERIA PVC
CONJUNT.

SE DEJO INSTALADA LA TUBERIA PARA EL SISTEMA
DE CABLES Y SONDO PARA LA SEGUNDA ETAPA.
DEBIDO A QUE DESPUES NO SE PODIA ROMPER EL
ESTAMPADO.

EN EL MÓDULO DE PUENTE Y SISTEMA:

SE INSTALO LA TUBERIA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO DE LAS JARDINERAS Y LA TUBERIA PARA
EL LLENADO Y CONTROL DE LA PUENTE.

UTILIZANDO TUBERIA PVC 1" ROZILLO Y
COMO ACTIVIDAD NUEVA SE UTILIZO TUBERIA PVC
1 1/2", 1/2" y 3". ELIMINANDO LA ALTUDAD
11cm 30, 31, 52 Y 53 donde estaba contemplada
TUBERIA DE PVC 2" y 4".

SE CONSTITUYO LINEA DE ACISTAL DE 6X6X90 CM
Y COMO ACTIVIDAD NUEVA SE AGREGO UNA
CAJA DE 070X120X170 MIS.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-84044

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018064932**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84044 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417193794 de fecha 09/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35744284432, presentada el 13/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-84044** o mediante el siguiente código QR:



007614000218

ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
MUNICIPIO CANE LA PAZ, AL NORTE DE
PLAZA SAN FRANCISCO

CHEQUE No. 00011401

Cane, 19/12/2023
Lugar y Fecha

Yessica del Socorro Medina Chaves

L 741,369.06

Páguese a la orden de

Seis mil Cuatrocientos y un mil trescientos Setenta y nueve con 06/100 cts

Lempiras

Car d en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.



Firma(s)



⑆01001142⑆00007614000218⑈00011401

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz



Cane, la Paz, 20 de noviembre del 2023.

FRANCISCO BUSTILLO GONZALES
ALCALDE MUNICIPAL
CANE, LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **RECONSTRUCCIÓN DEL
PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA
ETAPA.**

Estimada Alcalde:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME DE AMPLIACION DE TIEMPO, del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

ING. Mauro Rene Osorio
Supervisor de Infraestructura.
Mamcepaz.

RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:		RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA.		
UBICACIÓN:		CASCO URBANO CANE, LA PAZ.		
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:		El proyecto conta de la reconstrucción del parque municipal de cane, primera etapa, el cual será llevado a cabo frente a la municipalidad del municipio		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión a nivel de inspectoría está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ		
INVERSIÓN DEL PROYECTO:				
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L 2,985,607.92	L 2,985,607.92	L. 0.00	L 2,985,607.92
ORDEN DE CAMBIO		L. 0.00		L. 0.00
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L 2,985,607.92

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.**JUSTIFICACIÓN**

se realiza el informe de ampliación de tiempo por el motivo que los cambios climáticos en la zona fueron variables presentando lluvias a nivel nacional lo cual interfirió un estimado de 15 días para retomar las actividades, también se encontró la problemática que algunos de los materiales para el estampado eran importados del exterior por lo tanto los proveedores tardaron cierto tiempo en hacerlos llegar al sitio siendo estos motivos loas cuales causaron el retraso de la ejecución.

SITUACIONES PRESENTADAS:

EL ejecutor presenta una buena ejecución de las actividades siguiendo los parámetros establecidos por el diseño.

El tiempo de cierre de proyecto se prolongó, por el estimado de 50 días hábiles después del 3 diciembre 2023 hasta el 22 de enero 2024.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Dar una ampliación de tiempo al proyecto.

CALIFICACIÓN AL CONTRATISTA:

El ejecutor es ingeniero civil cuenta con todas las herramientas y equipo necesario para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y se a observado suficiente material en la obra.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:


- 1 maestro de obra
- 2 albañiles
- 6 ayudantes
- 1 ingeniero residente

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.


1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.

1.5 fotografías del proyecto.

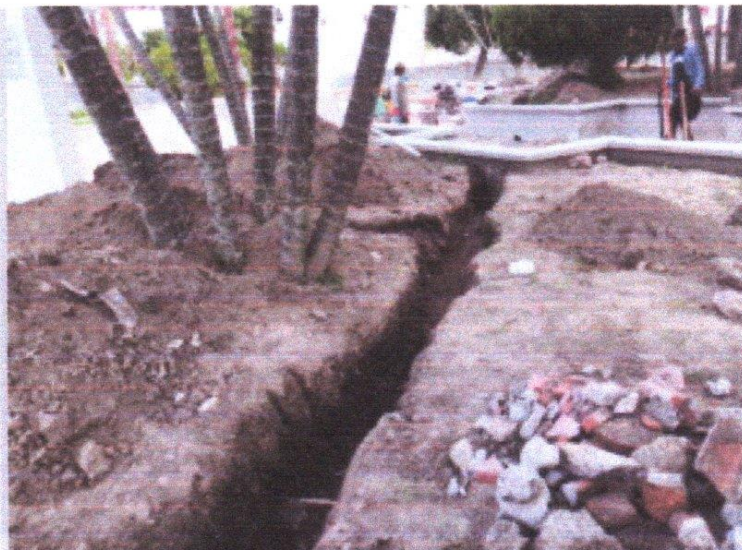


MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chinacla, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz

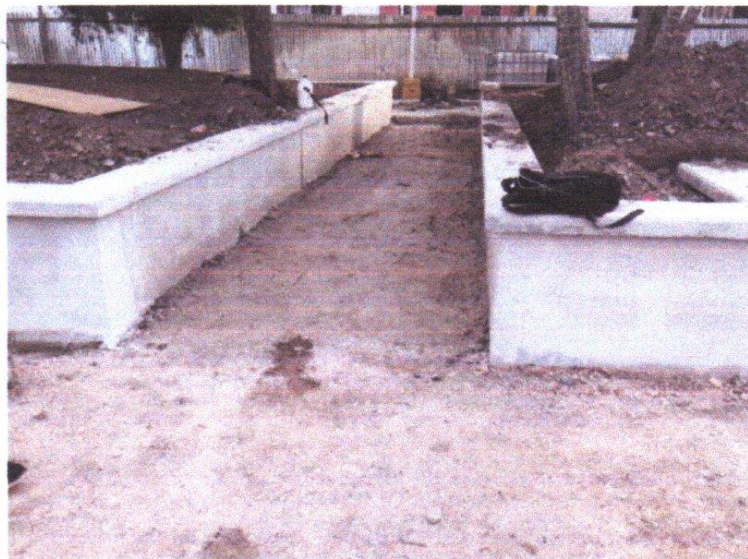

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

Marcala, Chinacá, San José, Santa María, San Pedro de Tutule, Santiago Puringla, Cane y La Paz

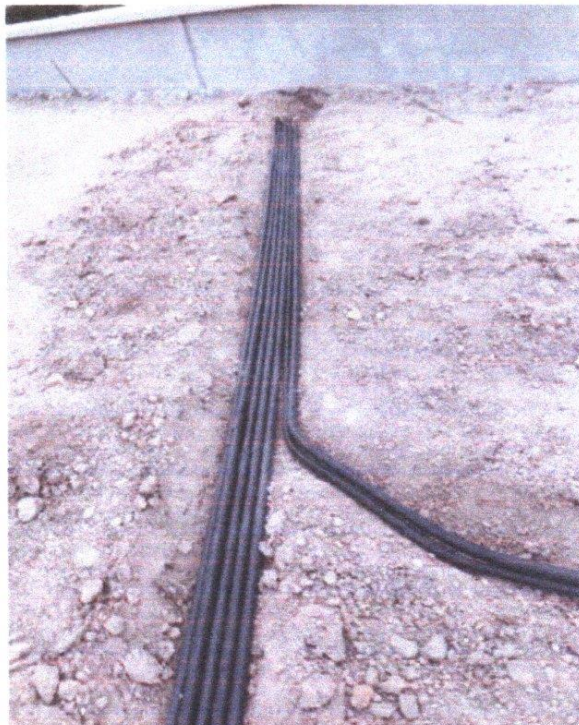

CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.

Barrio La Merced, La Paz

Constructoraingenium@hotmail.com

Tel. 2774-2008/3184-1319



La Paz, La Paz, 20 de noviembre de 2023

Ing. Mauro Osorio
Supervisor
UTI Mamcepaz
Su Oficina

Estimado Ingeniero Osorio:

En referencia al contrato N° **LPR-CANE-01-2023** Proyecto: **"RECONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL DE CANE, PRIMERA ETAPA"**. Tomando en consideración que el contrato tiene como fecha final la entrega del proyecto el tres (3) de diciembre de 2023, se presenta para su consideración la **solicitud de ampliación de tiempo por un plazo de 50 días a partir del tres de diciembre de 2023. Siendo la nueva fecha propuesta para la entrega del proyecto el 22 de enero de 2024.**

La solicitud de ampliación de tiempo se justifica debido a:

- Clima (lluvias a nivel nacional) mismas que se presentaron en la zona, desde mediados del mes de octubre y los primeros días de noviembre, presentando una complejidad para trabajar a un ritmo favorable. (quince días de retraso)
- El atraso en la entrega de los materiales por parte de los proveedores del material del estampado en vista de que estos productos son traídos del exterior (hardener, reléase, sellador y moldes) y que no estaba contemplado. (40 días de retraso)

Ante esto solicitamos de manera atenta la ampliación del contrato hasta el 22 enero del 2024, fecha en la cual estaríamos concluyendo el proyecto.

A la espera de su respuesta positiva.
Atte.



Yessica del Socorro Medina Claros
Constructora Ingenium S. de R.L.

Cco.
Ing. Luis Fernando Martínez
Unidad Técnica Municipal de Cane
