



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

**Informe Mensual De Proyectos En Ejecución/Ejecución De Proyectos
Departamento De Proyectos**

Periodo del 01 al 31 de OCTUBRE 2023

MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARÍA, CÓDIGO: LPR121702-2023 Orden De Cambio: No Hay Ampliación De Tiempo: No Hay
CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO: COT121715-2023 Orden De Cambio: No Hay Ampliación De Tiempo: No Hay
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2*2 DE UN CARRIL, LOS POSOS SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121711-2023 Orden De Cambio: No Hay Ampliación De Tiempo: No Hay
CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA HONDURAS, CAMALOTE 02 SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121713-2023 Orden De Cambio: No Hay Ampliación De Tiempo: No Hay
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA, LOS PLANES SANTA MARÍA CÓDIGO: COT121714-2023 Orden De Cambio: No Hay Ampliación De Tiempo: No Hay
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LOS PLANES SANTA MARÍA CÓDIGO: COT121716-2023 Orden De Cambio: No Hay Ampliación De Tiempo: No Hay

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
CÓDIGO: LPR121702- 2023	MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARÍA, CÓDIGO: LPR121702-2023	No Hay Impacto	No Hay Impacto	ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	Municipalidad De Santa María	03/01/2023	EJECUCIÓN	L. 2059,070.29	27/02/2024





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

**Informe Mensual De Proyectos En Ejecución/Ejecución De Proyectos
Departamento De Proyectos**

Periodo del 01 al 31 de OCTUBRE 2023

ÍTEM	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	DETALLES DEL ENCARGADO DEL PROYECTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN
CÓDIGO: COT121715-2023	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO: COT121715-2023	No Hay Impacto	No Hay Impacto	ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES	Municipalidad De Santa María	03/01/2023	EJECUCIÓN	L. 688,028.57	20/11/2023
CÓDIGO: COT121711-2023	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2*2 DE UN CARRIL, LOS POSOS SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121711-2023	No Hay Impacto	No Hay Impacto	ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	Municipalidad De Santa María	03/01/2023	EJECUCIÓN	L. 420,684.03	27/09/2023
CÓDIGO: COT121713-2023	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA HONDURAS, CAMALOTE 02 SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121713-2023	No Hay Impacto	No Hay Impacto	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	Municipalidad De Santa María	03/01/2023	EJECUCIÓN	L. 390,210.60	26/11/2023
CÓDIGO: COT121714-2023	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA, LOS PLANES SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121714-2023	No Hay Impacto	No Hay Impacto	ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES	Municipalidad De Santa María	03/01/2023	EJECUCIÓN	L. 741,751.80	20/11/2023
CÓDIGO: COT121716-2024	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LOS PLANES SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121716-2023	No Hay Impacto	No Hay Impacto	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	Municipalidad De Santa María	03/01/2023	EJECUCIÓN	L. 357,171.89	22/12/2023

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: LPR121702-2023	ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	Sector Obras Sociales/ MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARÍA, CÓDIGO: LPR121702-2023	MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARÍA, CÓDIGO: LPR121702-2023	CASCO URBANO SANTA MARÍA	MEJORAR LAS ÁREAS PARA REUNIONES EN LA COMUNIDAD	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD
CÓDIGO: COT121715-2023	CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO: COT121715-2023	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO: COT121715-2023	PAVITAS	MEJORAR LAS ÁREAS PARA REUNIONES EN LA COMUNIDAD	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución/Ejecución De Proyectos
Departamento De Proyectos

Periodo del 01 al 31 de OCTUBRE 2023

ÍTEM	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR/SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO: COT121711- 2023	ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2*2 DE UN CARRIL, LOS POSOS SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121711-2023	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE 2*2 DE UN CARRIL, LOS POSOS SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121711-2023	LOS POSOS	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CON LOSA DE 30 CM
CÓDIGO: COT121713- 2023	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTROYA	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA HONDURAS, CAMALOTE 02 SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121713-2023	CONSTRUCCIÓN AULA ESCUELA HONDURAS, CAMALOTE 02 SANTA MARÍA, CÓDIGO: COT121713-2023	CAMALOTE 02	MEJORAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR
CÓDIGO: COT121714- 2023	ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA, LOS PLANES SANTA MARÍA CÓDIGO: COT121714-2023	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA, LOS PLANES SANTA MARÍA CÓDIGO: COT121714-2023	LOS PLANES	MEJORAMIENTO CALLES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO
CÓDIGO: COT121716 2024	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTROYA	Sector Obras Sociales/ CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LOS PLANES SANTA MARÍA CÓDIGO: COT121716-2023	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, LOS PLANES SANTA MARÍA CÓDIGO: COT121716-2023	LOS PLANES	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE CON LOSA DE 30 CM



Ing. Luis Fernando Amador Portillo
Unidad De Proyectos
Municipalidad Santa María



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14044

L.: 308,860.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 256

Fecha de Emision: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00003004

Paguese a: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

Id/RTN: 10071973002203

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:


PAGO DE ANTICIPO DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #013 MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO, SANTA MARIA.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 013 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO SANTA MARIA	308,860.54


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	308,860.54
Monto Total:		308,860.54

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	308,860.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	308,860.54

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Elsa Victoria Santos

Identidad No.: 1007197300220

0s+js/9JmezATh86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bl5G12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6A17J+DSckTYhKU6OHwgrqVaHOMp KODtqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 88881210

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003004

SANTA MARÍA

19 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

L 308,860.54

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

1:0 130 20 79:00 1 130400006 1 1#00003004

N.º 00003004

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE ANTIPO DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #013 MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CASCO URBANO, SANTA MARÍA		
CONCEPTO DEL GASTO:			
256	11-304-000061-1		308,860.54
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	10071973002203	19 de octubre de 2023	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, miércoles, 18 de octubre de 2023

ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Su oficina.

Estimado:

Se remite la documentación de anticipo del proyecto **MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE SANTA MARÍA, CÓDIGO: LPR121702-2023**, de lo que se da fe que la documentación esta verificada. Actuando como supervisor Municipal de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Proyecto por un monto de **DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 29/100 (L. 2059,070.29)**. Cuya garantía de ANTICIPO es por un monto de **TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 54/100 (L. 308,860.54)**.

Contratista **ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES**

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA SANTA MARÍA

FIANZA -ZC-FC-100138-2023

FIANZA DE ANTICIPO

SEGUROS CREFISA, S.A. DE C.F., POR LA PRESENTE Y A PETICIÓN DE ELSA VICTORIA SANTOS MORALES, GARANTIZA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, QUE EL ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE SANTA MARIA, POR LA CANTIDAD DE L. 308,860.54 (TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 54/100)(15%), SERÁ INVERTIDO EN EL MISMO.


ESTA GARANTIA TENDRA CON UN PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DE 10/10/2023 HASTA 10/03/2024.


LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUIRIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

**En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:
TEGUCIGALPA, M.D.C 10 de octubre del 2023**


Firma Autorizada




Afianzado



FIANZA -ZC-FC-100142-2023


FIANZA DE CUMPLIMIENTO


SEGUROS CREFISA, S.A. DE C.F., POR LA PRESENTE Y A PETICIÓN DE ELSA VICTORIA SANTOS MORALES, GARANTIZA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FIRMADO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL, CON CÓDIGO LPR121702-2023, , UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, POR LA CANTIDAD DE L. 308,860.54 (TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 54/100) EQUIVALENTE AL 15% DEL MONTO DEL CONTRATADO.



ESTA GARANTIA TENDRA VIGENCIA A PARTIR DE 10/10/2023 HASTA 10/05/2024.

LA PRESENTE GARANTIA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUIRIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

**En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:
TEGUCIGALPA, M.D.C 10 de octubre del 2023**


Firma Autorizada


Afianzado

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 10071973002203

EL SA VICTORIA SANTOS MORALES
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110519

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974; reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 19 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 5 2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 10; publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1978.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cump con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: DEI-412-690663 Transacción: 0D48D9



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-84334

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SANTOS MORALES ELSA VICTORIA**
Con Registro Tributario Nacional: **10071973002203**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84334 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271016540 de fecha 28/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723435774, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , Ingresando el número **201-23-10500-84334** o mediante el siguiente código QR:





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidadhn.info
Tel. 9865-2258

CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL CONTRATISTA, FINANCIADO CON FONDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y FONDOS MUNICIPALES.

Yo, **GABINO ARGUETA GÁLVEZ**, alcalde de la Municipalidad de Santa María, departamento de La Paz mayor de edad, Hondureño, soltero, con tarjeta de identidad **No. 1218-1962-00057**, con domicilio y residencia en el municipio de Santa María, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, estando facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Santa María, Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, la señora **ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES**, mayor de edad, de profesión Ingeniero Civil, hondureña, casada, con tarjeta de identidad **No. 1007-1973-00220**, con domicilio en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, actuando en su condición de **Contratista Individual**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: DEFINICIONES: Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **LA UTI:** Es la Unidad Técnica, dependencia municipal encargada de administrar el ciclo de proyectos en lo que corresponde a la pre inversión, contratación, inversión, supervisión de la infraestructura y capacitación que el proyecto implica. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidadhn.info

Tel. 9865-2258

jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** Es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, **PROYECTO MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE SANTA MARÍA, LPR121702-2023, CÓDIGO: LPR121702-2023, SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman **EL PROYECTO** según los cuadros de cantidades de obra, precios unitarios y planos convenidos con **LA MUNICIPALIDAD. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de **DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 29/100 (L. 2059,070.29)** procedentes de la fuente Fondos Municipales y cualquier modificación futura que dicho Convenio conlleve mientras dure su ejecución. **CUARTA: ANTICIPO:** LA MUNICIPALIDAD, otorgará al CONTRATISTA un anticipo (*siempre y cuando el contratista lo requiera*) por un monto de **TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 54/100 (L. 308,860.54)** equivalente al 15% del monto total de este Contrato como lo estipula en las bases de licitación y conforme lo establece la Ley de Contratación del Estado en el artículo 105, bajo la cual se rige este contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, las correspondientes garantías que rinda el Contratista. **QUINTA: AMORTIZACION DEL ANTICIPO:** De cada estimación presentada por **EL CONTRATISTA** será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, **LA MUNICIPALIDAD** procederá a exigir su devolución a **EL CONTRATISTA** y ejecutará la correspondiente garantía de anticipo sin perjuicio de la rescisión del contrato a criterio de la





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidadfn.info

Tel. 9865-2258

Municipalidad. **SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal 15 días después de la entrega del cheque de anticipo por parte de **LA MUNICIPALIDAD** y de la recepción por parte de **EL CONTRATISTA**. Si pasados 15 días calendario, el **CONTRATISTA** no ha retirado el cheque de anticipo, **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso de adjudicación, sin responsabilidad alguna por su parte. **SÉPTIMA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está en la obligación de Cancelar a la Secretaria de administración de rentas de la obra en ejecución, el cual será calculado en base al 15% de Utilidad Generada del Proyecto. Impuesto que será deducido en cada una de las estimaciones presentadas en el transcurso del proceso de ejecución de la obra, posteriormente **LA MUNICIPALIDAD** está en la obligación de presentar dicho impuesto retenido al Contratista en la Agencia Bancaria que se estime conveniente en los próximos 10 días a la retención. SI EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA EXTENDIDA POR LA SAR HACER CASO OMISO A ESTA CLAUSULA DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA ESTA SUJETO AL PAGO DE TASA IMPUESTO MUNICIPAL **OCTAVA: DESEMBOLSOS:** **LA MUNICIPALIDAD**, además del anticipo efectuará pagos a **EL CONTRATISTA** de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por parte de **EL CONTRATISTA**, revisadas y autorizadas por **EL SUPERVISOR** municipal unidad de proyectos, y/o supervisor de la UTI. Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada por **LA MUNICIPALIDAD**. A las estimaciones se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás retenciones establecidas por Ley, Se hará supervisión por parte de gobernación de la cual dependerán los desembolsos. **NOVENA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de los **CIENTO VEINTE (120)** días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 84/100 (L. 2,573.84)** equivalente al **0.125%** sobre el monto del contrato





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidadhn.info

Tel. 9865-2258

por cada día de retraso. **DECIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, previo a la entrega del anticipo rendirá una Garantía de Anticipo equivalente al **100%** del valor del anticipo recibido que hace a **TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 54/100 (L. 308,860.54)** también rendirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al **15%** sobre el valor del Contrato, equivalente a **TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 54/100 (L. 308,860.54)** La Garantía de Cumplimiento de contrato estará vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al 5% del monto del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago de la última estimación y tendrá una vigencia de un año, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisional. Todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" Este Certificado de Incumplimiento será emitido por LA MUNICIPALIDAD.

DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO. Las cantidades de obra de EL PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, y por el COORDINADOR de LA UTI, podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo si supera el 10% del monto del contrato se deberá hacer un adendum al contrato. El valor de la





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidadfn.info

Tel. 9865-2258

modificaciones acumuladas no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato. **DÉCIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR:** EL SUPERVISOR dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de la obra. **DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL:** EL CONTRATISTA será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD y en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **DÉCIMA CUARTA: EMPLEO.** a) EL CONTRATISTA procurará emplear en actividades de la construcción (albañilería, fontanería básica, electricidad básica, entre otros) a personal de este municipio, **DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por LA MUNICIPALIDAD, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por EL SUPERVISOR o con base a las visitas que LA MUNICIPALIDAD lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de LA MUNICIPALIDAD o de EL CONTRATISTA, cuando las condiciones preexistentes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de LA MUNICIPALIDAD, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a EL CONTRATISTA de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidadhn.info

Tel. 9865-2258

LA MUNICIPALIDAD, e) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD** .- **DÉCIMA SEPTIMA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusula Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, a los diez (10) días del mes de octubre del 2023.



GABINO ARGUETA GALVEZ

Santa María, La Paz

Alcalde Municipal



ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

Contratista

CICH: 2164



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

ORDEN DE INICIO

Proyecto de Infraestructura

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto:

Proyecto: MEJORAMIENTO CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE SANTA MARÍA, LPR121702-2023, CÓDIGO: LPR121702-2023

Código: LPR121702-2023

Departamento: LA PAZ

Municipio: SANTA MARÍA

Aldea: SANTA MARIA

Ejecutor: ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES



Fuente: FONDOS MUNICIPALES

Se establece como fecha oficial de inicio el: **30 de octubre de 2023**

Fecha: 10 de OCTUBRE del 2023



Gabriel Argüeta Gálvez
ALCALDE MUNICIPAL



Ing. Luis Fernando Amador P.
UNIDAD PROYECTOS



ING. ELSA VICTORIA SANTOS MORALES
EJECUTOR



Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14043

L.: 138,239.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 255

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 0003003

Paguese a: PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES

Id/RTN: 1516198600114

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #002
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 000 001 47110 15-013-01	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS	138,239.18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	138,239.18
Monto Total:		138,239.18

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	138,239.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	138,239.18

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Alma Galano
Identidad No.: 2101996-00366



0s+js/f9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcvJEF+105042120201SNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKG0Q6A17J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMP
K0dTqowjWtp31/pAJYDvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003003

SANTA MARÍA

19 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

PAOLA NATIALLY CHAVEZ COLINDRES

L 138.239.18

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras


Banco de Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures and stamps]

⑆01302079⑆00113040000611⑆00003003

N.º 00003003

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS		
	CONCEPTO DEL GASTO:		
255	11-304-000061-1		138,239.18
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>Alba Chavez Colindres</i>
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES	1516198600114	19 de octubre de 2023	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	



2704904 M-0235 29

Tegucigalpa MDC
16 de octubre 2023

Ing. Luis Fernando Amador
Director de proyectos
Municipalidad de Santa María

Ref: AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE CHEQUE.

Estimado Ing. Amador

Por medio de la presente autorizo a la señora **ALMA YADIRA GALEANO GALO** con numero de identidad 1218199600366, a retirar los cheques de pago correspondiente al cobro de estimaciones de avance de obra de los proyectos:

1. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO: COT121714-2023; por un monto de L. 143,686.56.
2. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA IGLESIA CATÓLICA, LOS PLANES, CÓDIGO: COT121715-2023; por un monto de L. 296,124.43.

Condiciones de salud me impiden movilizarme a realizar el trámite correspondiente,

De antemano agradezco la atención prestada a la presente,

Cordial Saludo




Ing. Paola Chávez
Contratista individual
CICH: 6376

martes, 17 de octubre de 2023

CONSTRUCCIÓN CENTRO
COMUNAL, PAVITAS,
CÓDIGO: COT121714-2023

INFORME DE ESTIMACIÓN DE
PROYECTO



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, martes, 17 de octubre de 2023

ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Su oficina.

Estimado:

Se remite la documentación de estimación uno del proyecto **CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO: COT121714-2023.**, adjudicado a **ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES** de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL** Dicha documentación consta de:

- ESTIMACIÓN SOLICITADA
- INFORME DE ESTIMACIÓN
- TABLA DE RETENCIONES
- PAGO A CUENTA CON FECHAS VIGENTES
- FOTOCOPIA DE IDENTIDAD
- FOTOCOPIA DE RTN
- BOLETA CAI VIGENTE
- FOTOGRAFÍAS DETALLANDO EL AVANCE
- NOTA DE REMISIÓN A TESORERÍA POR LA SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN	MONTO PAGADO	RETENCIÓN CALIDAD DE OBRA	RETENCIÓN POR ANTICIPO	MONTO TOTAL	DE	AL
PRIMERA	L 284,897.89	L 18,681.83	L 70,056.86	L 373,636.58	22/08/2023	09/10/2023
TOTAL	L 284,897.89	L 18,681.83	L 70,056.86	L 373,636.58		

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA SANTA MARÍA



RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT121714-2023
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	SANTA MARIA
ALDEA:	PAVITAS

FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	22/08/2023	AL:	09/10/2023
--------------------------------------	-------------------------	------------	-----	------------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 688,028.57
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 103,204.29
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 688,028.57
Monto de Tercera Estimacion	L 181,297.28



VoBo
 SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

	L 181,297.28	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	L 688,028.57	26.35%	1.25	33%	103,204.29	33,993.24

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	L 181,297.28	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
Retencion de Calidad de obra	L 688,028.57	1.050	5.00%	181,297.28	9,064.86

RESUMEN

Monto Estimado	L 181,297.28
Menos Deducion de Anticipo	L 33,993.24
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 9,064.86
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	L 138,239.18

Monto del Anticipo	103,204.29	100.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	33,993.24	32.94%
		0.00%
		0.00%
TOTAL AMORTIZADO	33,993.24	32.94%
FALTA POR AMORTIZAR	69,211.05	67.06%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS
UBICACIÓN: COMUNIDAD DE PAVITAS, SANTA MARIA, LA PAZ
EJECUTOR: ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES
CODIGO: COT121714-2023

ESTIMACIO N° 1

PERIODO: martes 22 de agosto de 2023

A

lunes 09 de octubre de 2023




N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
CASA COMUNAL 12*8MTRS												
1	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO	DIA	1.00	L 500.00	L 500.00		L -	1.00	L 500.00	1	L 500.00	100%
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	40.00	L 18.00	L 720.00		L -	40.00	L 720.00	40	L 720.00	100%
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	23.67	L 125.00	L 2,958.75		L -	23.67	L 2,958.75	23.67	L 2,958.75	100%
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	15.40	L 20.20	L 311.08		L -	15.40	L 311.08	15.4	L 311.08	100%
5	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	28.36	L 1,820.00	L 51,615.20		L -	28.36	L 51,615.20	28.36	L 51,615.20	100%
6	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	10.00	L 1,820.00	L 18,200.00		L -	10.00	L 18,200.00	10	L 18,200.00	100%
7	DADO DE CONCRETO 40X50X50CM,4#3,#2@20,CONC 1:2:4	UND	10.00	L 448.00	L 4,480.00		L -	10.00	L 4,480.00	10	L 4,480.00	100%
8	COLUMNA 20X15CM, 4#4,#3@20CM, CONC 1:2:2	ML	23.44	L 415.00	L 9,727.60		L -	16.408	L 6,809.32	16.408	L 6,809.32	70%
9	SOLERA 15X20, 4#3, #2@20 CONCR1:2:2	M.L.	80.00	L 360.00	L 28,800.00		L -	80.00	L 28,800.00	80	L 28,800.00	100%
10	SOLERA 20X25, 4#3 2#4, #2@15, 1:2:2 P/TECHO,C/PERL	M.L.	22.20	L 430.44	L 9,555.77		L -		L -	0	L -	0%
11	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15CM	M2	108.69	L 600.00	L 65,214.00		L -	76.083	L 45,649.80	76.083	L 45,649.80	70%
12	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	217.38	L 169.62	L 36,872.00		L -		L -	0	L -	0%
13	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	33.31	L 445.00	L 14,822.95		L -		L -	0	L -	0%
14	TECHO CANALETA 6" LAMINA ALUMINIZADA INDUSTRIAL 8'	M2	150.67	L 698.40	L 105,227.93		L -		L -	0	L -	0%
15	VIGA METALICA, CANALETA DOBLE L=11.60, H=0.768M	unld	2.00	L 4,000.00	L 8,000.00		L -		L -	0	L -	0%
16	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15,CONCRETO 1:2:2	M.L.	8.48	L 340.75	L 2,889.56		L -		L -	0	L -	0%
17	CARGADOR DE 10X15 2#3,#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	13.00	L 200.00	L 2,600.00		L -		L -	0	L -	0%
18	JAMBA 10X15CM, 2#3, #2@15 CM, CONC 1:2:2	ML	34.92	L 210.00	L 7,333.20		L -	17.46	L 3,666.60	17.46	L 3,666.60	50%
19	BATIENTE DE 10X15 2 #3, #2@ 15 CONCR. 1:2:2	M.L.	9.80	L 221.89	L 2,174.52		L -		L -	0	L -	0%
20	ENTABICADO DE BLOQUE 15CM(INC.REPELLO/PULIDO)	ML	45.90	L 163.14	L 7,488.13		L -		L -	0	L -	0%
21	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 M	ML	43.82	L 45.00	L 1,971.90		L -		L -	0	L -	0%
22	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 M	ML	44.20	L 48.00	L 2,121.60		L -		L -	0	L -	0%
23	PISO GRANITO TERRAZO 30X30(ORINAL GRANITOS Y TERRAZOS)	M2	112.52	L 700.00	L 78,764.00		L -		L -	0	L -	0%
24	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 CMS.	M.L.	48.00	L 97.65	L 4,687.20		L -		L -	0	L -	0%
25	PINTURA ACRILICA PROPORCION 1:1	M2	232.83	L 78.08	L 18,179.37		L -		L -	0	L -	0%
26	PUERTA LAMINA TROQUELADA DE 1X2.10M (ECSA)	UND	1.00	L 4,146.97	L 4,146.97		L -		L -	0	L -	0%
27	PUERTA METALICA,LAM.TROQ. 1.50X2.1,DOBLE HOJA	UND	1.00	L 7,875.57	L 7,875.57		L -		L -	0	L -	0%
28	VENTANA DE CELOSIA (INCLUYE RESANES)	M2	11.13	L 2,800.00	L 31,164.00		L -		L -	0	L -	0%
29	BALCONES ANG 2X1 1/2,PLA,VAR 1/2 L	M2	11.13	L 1,300.00	L 14,469.00		L -		L -	0	L -	0%



SUB TOTAL				L 542,870.29	L -	L 163,710.75	L 163,710.75	30%		
SISTEMA ELECTRICO										
30	ACOMETIDA ELECT. CABLE 2THW #6,1 THW #8, EMT 1/2"	ML	25.00	L 119.00	L 2,975.00	L -	L -	0	L -	0%
31	LAMPARA INCANDESCENTE (SUM/INST)	UND	4.00	L 396.48	L 1,585.92	L -	L -	0	L -	0%
32	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP, TUBO PVC ø	ML	50.00	L 95.00	L 4,750.00	L -	L 2,375.00	25	L 2,375.00	50%
33	BASE PARA CONTADOR (100 AMPERIOS)	UND	1.00	L 980.00	L 980.00	L -	L -	0	L -	0%
34	CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS	UND	1.00	L 800.00	L 800.00	L -	L -	0	L -	0%
35	TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO (caja metal 2*4)	UND	8.00	L 125.00	L 1,000.00	L -	L -	0	L -	0%
36	INTERRUPTOR DOBLE (caja metal 2*4)	UND	2.00	L 244.07	L 488.14	L -	L -	0	L -	0%
37	CIRCUITO DE FUERZA. HASTA 20 AMP, POLIDUCTO ø	M.L.	120.00	L 95.45	L 11,454.00	L -	L 5,727.00	60	L 5,727.00	50%
SUB TOTAL					L 24,033.06	L -	L 8,102.00		L 8,102.00	34%
MODULO SANITARIO										
38	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	14.50	L 18.00	L 261.00	L -	L -	0	L -	0%
39	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	1.31	L 125.00	L 163.75	L -	L -	0	L -	0%
40	REMOCION DE CAPA VEGETAL	M3	1.20	L 69.30	L 83.16	L -	L -	0	L -	0%
41	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	3.13	L 58.35	L 182.64	L -	L -	0	L -	0%
42	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	0.21	L 445.00	L 93.45	L -	L -	0	L -	0%
43	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	0.93	L 1,820.00	L 1,692.60	L -	L -	0	L -	0%
44	DADOS DE CONCRETO 40X40X30CM.	UNIDAD	8.00	L 350.00	L 2,800.00	L -	L -	0	L -	0%
45	SOLERA INFERIOR S-9 (15X15)	ML	9.20	L 230.00	L 2,116.00	L -	L -	0	L -	0%
46	CASTILLO C-2 (15X15)	ML	19.20	L 350.00	L 6,720.00	L -	L -	0	L -	0%
47	SOLERA SUPERIOR S-2 (10X15)	ML	11.80	L 350.00	L 4,130.00	L -	L -	0	L -	0%
48	JAMBA VERTICAL J-1 (10X15)	ML	4.30	L 219.08	L 942.04	L -	L -	0	L -	0%
49	PAREDES DE BLOQUE DE 15 CM, INCLUYE ENTABICADO	M2	14.33	L 600.00	L 8,598.00	L -	L -	0	L -	0%
50	PUERTA METALICA P-7(0.80X2.15M),TUBO IND 3/4"	UNID	1.00	L 4,360.88	L 4,360.88	L -	L -	0	L -	0%
51	VENTANA DE TUBO INDUSTRIAL, CON ZARANDA	M2	0.60	L 944.47	L 566.68	L -	L -	0	L -	0%
52	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM	M2	2.00	L 411.95	L 823.90	L -	L -	0	L -	0%
53	TECHO CANALETA 6" LAMINA ALUMINIZADA INDUSTRIAL 8'	M2	3.90	L 698.40	L 2,723.76	L -	L -	0	L -	0%
54	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES E=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	37.08	L 169.62	L 6,289.51	L -	L -	0	L -	0%
55	PINTURA DE ACEITE	M2	37.08	L 78.08	L 2,895.21	L -	L -	0	L -	0%
56	LIMPIEZA FINAL DE AREAS EXTERIORES	m2	2.75	L 10.00	L 27.50	L -	L -	0	L -	0%
57	SUM. E INSTAL DE SERVICIOS SANITARIOS (INCL ACCESORIOS) (SE DEBE PONER LA MEJOR CALIDAD)	UNIDAD	2.00	L 5,500.00	L 11,000.00	L -	L -	0	L -	0%
58	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" PARA VENTILACION	UNIDAD	2.00	L 25.00	L 50.00	L -	L -	0	L -	0%
59	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	ML	4.00	L 25.00	L 100.00	L -	L -	0	L -	0%
60	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	ML	4.00	L 71.81	L 287.24	L -	L -	0	L -	0%
61	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	3.00	L 15.40	L 46.20	L -	L -	0	L -	0%
62	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41	ML	3.00	L 41.42	L 124.26	L -	L -	0	L -	0%
63	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	2.00	L 13.87	L 27.74	L -	L -	0	L -	0%
64	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	ML	2.00	L 19.20	L 38.40	L -	L -	0	L -	0%
65	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 1/2"	ML	6.00	L 9.28	L 55.68	L -	L -	0	L -	0%
66	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	ML	6.00	L 6.35	L 38.10	L -	L -	0	L -	0%
67	RELLENO Y COMPACTADO MATERIAL DEL SITIO	M3	0.88	L 50.00	L 44.00	L -	L -	0	L -	0%



68	CAJAS DE REGISTRO DE 40X40X60	UNIDAD	1.00	L	1,303.34	L	1,303.34	L	-	L	-	0	L	-	0%	
69	PILA CON RIVAL 1.30X0.90X1.00 EN MODULO SANITARIO, RIBAL DE ALUMINIO	UNIDAD	1.00	L	4,911.87	L	4,911.87	L	-	L	-	0	L	-	0%	
SUB TOTAL						L	63,496.91	L	-	L	-		L	-	0%	
TANQUE SEPTICO																
70	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	3.00	L	125.00	L	375.00	L	-	L	-	0	L	-	0%	
71	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	3.60	L	58.35	L	210.06	L	-	L	-	0	L	-	0%	
72	TANQUE SEPTICO 6M3 61-90 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA	1.00	L	21,823.95	L	21,823.95	L	-	L	-	0	L	-	0%	
73	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	2.00	L	1,334.84	L	2,669.68	L	-	L	-	0	L	-	0%	
74	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 3" RD-41	M.L.	5.00	L	41.42	L	207.10	L	-	L	-	0	L	-	0%	
75	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	M.L.	5.00	L	15.40	L	77.00	L	-	L	-	0	L	-	0%	
SUB TOTAL						L	25,362.79	L	-	L	-		L	-	0%	
ACERA PERRIMETRAL Y FRONTAL																
76	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	21.30	L	27.18	L	578.93	L	-	21.30	L	578.93	21.3	L	578.93	100%
77	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	1.16	L	125.00	L	145.00	L	-	1.16	L	145.00	1.16	L	145.00	100%
78	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	1.45	L	58.35	L	84.61	L	-	1.45	L	84.61	1.45	L	84.61	100%
79	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO	M2	2.88	L	600.00	L	1,728.00	L	-	2.88	L	1,728.00	2.88	L	1,728.00	100%
80	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	0.61	L	445.00	L	271.45	L	-	0.61	L	271.45	0.61	L	271.45	100%
81	SOLERA DE CONCRETO DE 10 X 15	ML	14.40	L	218.79	L	3,150.58	L	-	14.40	L	3,150.58	14.4	L	3,150.58	100%
82	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM	M2	8.19	L	430.52	L	3,525.96	L	-	8.19	L	3,525.96	8.19	L	3,525.96	100%
SUB TOTAL						L	9,484.53	L	-	L	9,484.53		L	9,484.53	100%	
MURO DE MAMPOSTERIA																
83	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	10.80	L	1,820.00	L	19,656.00	L	-		L	-	0	L	-	0%
84	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	9.00	L	125.00	L	1,125.00	L	-		L	-	0	L	-	0%
SUB TOTAL						L	20,781.00	L	-	L	-		L	-	0%	
ROTULO DE PROYECTO																
85	ROTULO FHIS METALICO 3'X8' INCLUYE PATAS	UNID	1.00	L	2,000.00	L	2,000.00	L	-		L	-	0	L	-	0%
SUB TOTAL						L	2,000.00	L	-	L	-		L	-	0%	
COSTO PROYECTO						L	688,028.57	L	-	L	181,297.28		L	181,297.28	26%	
MONTO A PAGAR PRIMERA				L									L	181,297.28		

 EJECUTOR: INGENIERO CIVIL 04-09-14 08-09-14 63376 NOMBRE: PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES	 SUPERVISION ALCALDIA MUNICIPAL UNIDAD DE PROYECTOS NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	 ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ
FECHA 15/10/2023 00:00		

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 15161986001146

PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión 20110627

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Profesión Social, Art. 17 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 44 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 731634 Transacción: D09C98



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-88398

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHAVEZ COLINDRES PAOLA NATHALY**
Con Registro Tributario Nacional: **15161986001146**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-88398 en fecha 17/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417375164 de fecha 17/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27722796796, presentada el 19/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-88398** o mediante el siguiente código QR:





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, martes, 17 de octubre de 2023

GABINO ARGUETA GÁLVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARÍA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCIÓN CENTRO**
COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO:
COT121714-2023

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, me permito entregar el INFORME N°1, para estimación del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Supervisor de infraestructura
ALCALDÍA



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

RÉSUMEN EJECUTIVO

1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	DEL	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO:	COT121714-2023	
UBICACIÓN:	PAVITAS, SANTA MARIA, LA PAZ			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de la de LA MUNICIPALIDAD . La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal.			
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO	APORTE	ORDEN DE CAMBIO	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCTURA	L. 688,028.57	L 0.00		L. 688,028.57
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 688,028.57

1.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):	ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES
SUPERVISIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
	CONTRATO ORIGINAL
FECHA DE ORDEN DE INICIO	martes, 22 de agosto de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	90 días





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se prepara el informe que corresponde a la estimación número UNO del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 26.00% de las actividades del proyecto.

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 26.00%

SITUACIONES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PROPUESTAS:

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

1.4 DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

2 CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO.	3
1.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.....	3
1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.	4
1.4 DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.....	4





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

1. Terreno donde se va a construir la casa comunal



2. Levantamiento de paredes



UNIDAD DE PROYECTOS
[Handwritten Signature]



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

3. Se observa la construcción de paredes de bloque, y armado de columnas



PAREDES DE BLOQUE

ARMADO DE HIERRO DE COLUMNAS

4. Tubería para la instalación de sistema eléctrico



TUBERIA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SANTA MARÍA LA PAZ
UNIDAD DE PROYECTOS
[Handwritten Signature]



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

5. Se fundieron las columnas y se observa el hierro



FUNDICION DE COLUMNAS
CONCRETO

6. Se observa relleno interior y boquete de las ventanas



BOQUETES PARA VENTANA





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

7. Levantamiento de paredes



8. Se observan las aceras perimetrales





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14042

L.: 332,169.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 254

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00003002.

Paguese a: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

Id/RTN: 10071973002203

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #013
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2 X 2 DE UN CARRIL, LOS POSOS SANTA MARIA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 013 000 001 47210 11-011-04	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2X2 DE UN CARRIL LOS POSOS, SANTA MARIA	332,169.93

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS / 5 CAJAS PUENTE	332,169.93
Monto Total:		332,169.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	332,169.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	332,169.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Elsa Victoria Santos

Identidad No.: 1007197300220

0s+js/j9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+...
KODTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

R.T.N. 10071973002203

Col. Miravalle, Calle al Volcan en la segunda caseta de vigilancia, Comayagua.

Tel.: 2771-4087 / 9943-5987 E-mail.: elsavictorias@yahoo.com

VS CONSTRUCCIONES CAI.: 0144F1-CE0E85-5F4085-CF2351-03307C-66

Día	Mes	Año
19	10	23

CLIENTE: Municipalidad de Santa María, Ca Iz.

DIRECCION: Santa María

R.T.N. 12179003434704 Orden de Compra Exenta:

Contancia de Registro Exonerados: No. de registro S.A.G.:

CANT.	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pago de primera estimacion de avance de obra de monto de contrato del Proyecto #13 Construcción de caja puente de 1x2 de uncomi Los Posos, Santa María.			332,169.93
	— U. L. —			
	TOTAL L.			

[Handwritten Signature]



Origina: Cliente
Copia 1 Obligado Tributario Emisor

Firma LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	332,169.93
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	332,169.93

Imprenta Rios R.T.N. 0301196501168 Tels: 3395-0040 / 2771-8700 Certificado: 8231-22-10500-5
Bo. Arriba, 1/2 cuadra al norte de Terrelena Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.
Rango Autorizado: 1 tal del 000-001-01-00000101-000-001-01-00000150
Fecha Limite de Emision: 02-10-2024

Cantidad en Letras: Trescientos treinta y dos mil ciento sesenta y nueve temporales con 93/100

FACTURA No. 000-001-01-00⁰⁰⁰104

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 89942788

Cuenta N.º 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003002

SANTA MARÍA

19 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

L 332.169,93

Pagare a la orden de

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCO SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS


Letras

Caracas en letras

 Banco de
Occidente, S.A.
Banco de Occidente, S.A.

001302079000130400006100003002

N.º 00003002

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #013 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 2 X 2 DE UN CARRIL, LOS POSOS SANTA MARIA		
CONCEPTO DEL GASTO:			
254	11-304-000061-1		332,169.93
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	10071973002203	19 de octubre de 2023	
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	

27/04/2024

M-0235

29

martes, 17 de octubre de 2023

CONSTRUCCIÓN DE CAJA
PUENTE (MENOR) DOBLE
DE 2X2 DE UN CARRIL,
LOS POSOS, CÓDIGO:
COT121711-2023

INFORME DE ESTIMACIÓN DE
PROYECTO



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, martes, 17 de octubre de 2023

ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Su oficina.

Estimado:

Se remite la documentación de estimación uno del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, LOS POSOS, CÓDIGO: COT121711-2023.**, adjudicado a **ING. ELSA VICTORIA SANTOS** de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Dicha documentación consta de:

- ESTIMACIÓN SOLICITADA
- INFORME DE ESTIMACIÓN
- TABLA DE RETENCIONES
- PAGO A CUENTA CON FECHAS VIGENTES
- FOTOCOPIA DE IDENTIDAD
- FOTOCOPIA DE RTN
- BOLETA CAI VIGENTE
- FOTOGRAFÍAS DETALLANDO EL AVANCE
- NOTA DE REMISIÓN A TESORERÍA POR LA SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN	MONTO PAGADO	RETENCIÓN CALIDAD DE OBRA	RETENCIÓN POR ANTICIPO	MONTO TOTAL	DE	AL
PRIMERA	L 332,169.93	L 20,803.82	L 63,102.60	L 416,076.35	31/07/2023	27/09/2023
SEGUNDA						
TOTAL	L 332,169.93	L 20,803.82	L 63,102.60	L 416,076.35		

Sin otro particular le saluda.

Afentamente,

ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA SANTA MARÍA



RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT121711-2023
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL LOS POSOS, CÓDIGO: COT121711-2023
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	SANTA MARIA
ALDEA:	LOS POSO

FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	31/07/2023	AL:	27/09/2023
--------------------------------------	-------------------------	------------	-----	------------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 420,684.03
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 63,102.60
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 420,684.03
Monto de Primera Estimacion	L 416,076.35


 VoBo _____
SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

Retencion Sobre Anticipo	L 416,076.35	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
	L 420,684.03	98.90%	1.01	100%	63,102.60	63,102.60

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Retencion de Calidad de obra	L 416,076.35	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
	L 420,684.03	1.050	5.00%	416,076.35	20,803.82

RESUMEN

Monto Estimado	L 416,076.35
Menos Deducion de Anticipo	L 63,102.60
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 20,803.82
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	L 332,169.93

Monto del Anticipo	L 63,102.60	100.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L 63,102.60	100.00%
TOTAL AMORTIZADO	L 63,102.60	100.00%
FALTA POR AMORTIZAR	L -	0.00%


República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional



RTN: 10071973002203

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productores Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110519

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 19 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 5 2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1970, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1970.

Director Ejecutivo Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente, recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cump con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento: DEI-412- 690653 Transacción: 0D48D9



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-84334

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SANTOS MORALES ELSA VICTORIA**
Con Registro Tributario Nacional: **10071973002203**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-84334 en fecha 09/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271016540 de fecha 28/09/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27723435774, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/>, ingresando el número **201-23-10500-84334** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL LOS POSOS, CÓDIGO: COT121711-2023

UBICACIÓN: LOS POSO

EJECUTOR: ING. ELSA VICTORIA SANTOS

CODIGO: COT121711-2023

ESTIMACIO N° 1

PERIODO: lunes, 31 de julio de 2023

A




miércoles, 27 de septiembre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
CAJA PUENTE DE UN CARRIL												
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	67.60	L 34.16	L 2,309.22	0.00	L -	67.60	L 2,309.22	67.6	L 2,309.22	100.00%
2	DESVIACION DE RIO	GLB	1.00	L 8,145.50	L 8,145.50	0.00	L -	1.00	L 8,145.50	1	L 8,145.50	100.00%
3	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (SEMI-DURO)	M3	23.20	L 217.80	L 5,052.96	0.00	L -	23.20	L 5,052.96	23.2	L 5,052.96	100.00%
4	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	30.16	L 160.77	L 4,848.82	0.00	L -	30.16	L 4,848.82	30.16	L 4,848.82	100.00%
5	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA	M3	23.20	L 1,535.70	L 35,628.24	0.00	L -	23.20	L 35,628.24	23.2	L 35,628.24	100.00%
6	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	39.56	L 2,253.18	L 89,135.80	0.00	L -	39.56	L 89,135.80	39.56	L 89,135.80	100.00%
7	ENCOFRADO DE LOSA MONOLITICA PARA PUENTE	M2	32.00	L 2,120.09	L 67,842.88	0.00	L -	32.00	L 67,842.88	32	L 67,842.88	100.00%
8	Armado de acero de caja p. 30#8,17#4, caja p doble	UND	1.00	L 50,992.70	L 50,992.70	0.00	L -	1.00	L 50,992.70	1	L 50,992.70	100.00%
9	CONCRETO DE 280 KG/CM	M3	11.76	L 4,681.18	L 55,050.68	0.00	L -	11.76	L 55,050.68	11.76	L 55,050.68	100.00%
10	CURADO DE LOSA	M2	39.20	L 26.41	L 1,035.27	0.00	L -	39.20	L 1,035.27	39.2	L 1,035.27	100.00%
11	DESENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO	M2	32.00	L 143.99	L 4,607.68	0.00	L -	0.00	L -	0	L -	0.00%
12	DOBLADO DE HIERRO	UND	1.00	L 5,834.40	L 5,834.40	0.00	L -	1.00	L 5,834.40	1	L 5,834.40	100.00%
13	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC.	M3	50.00	L 774.57	L 38,728.50	0.00	L -	50.00	L 38,728.50	50	L 38,728.50	100.00%
14	CONFORMACION DE APROXIMACIONES	M2	100.00	L 72.27	L 7,227.00	0.00	L -	100.00	L 7,227.00	100	L 7,227.00	100.00%
15	BARANDAL PRETIL(T. SOPTRAVI)20X25 6#8 Y #4 @ 30 CM	M.L.	19.60	L 1,853.42	L 36,327.03	0.00	L -	19.60	L 36,327.03	19.6	L 36,327.03	100.00%
16	PINTURA PARA TRAFICO	M2	10.00	L 93.62	L 936.20	0.00	L -	10.00	L 936.20	10	L 936.20	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL LOS POSOS, CÓDIGO: COT121711-2023
UBICACIÓN: LOS POSOS
EJECUTOR: ING. ELSA VICTORIA SANTOS
CODIGO: COT121711-2023
ESTIMACION N° 1
PERIODO: lunes, 31 de julio de 2023 A miércoles, 27 de septiembre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
17	ROTULO DE PROYECTO	UND	1.00	L 6,981.15	L 6,981.15	0.00	L -	1.00	L 6,981.15	1	L 6,981.15	100.00%
SUB TOTAL				L	420,684.03	L	-	L	416,076.35	L	416,076.35	98.90%
COSTO PROYECTO				L	420,684.03	L	-	L	416,076.35	L	416,076.35	98.90%
MONTO A PAGAR PRIMERA ESTIMACION		L	416,076.35									

EJECUTOR FIRMA:  ING. ELSA VICTORIA SANTOS 	SUPERVISION ALCALDIA MUNICIPAL FIRMA:  NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO 	ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA FIRMA:  NOMBRE: GABINO ARQUETA GALVEZ 
--	---	---



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, martes, 17 de octubre de 2023

GABINO ARGUETA GÁLVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARÍA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE CAJA**
PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN
CARRIL, LOS POSOS, CÓDIGO: COT121711-
2023

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA**, me permito entregar el **INFORME N°1**, para estimación del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Supervisor de infraestructura
ALCALDÍA






Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, LOS POSOS, CÓDIGO: COT121711-2023			
UBICACIÓN:	LOS POSOS, SANTA MARIA, LA PAZ			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de la de LA MUNICIPALIDAD . La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal.			
CONCEPTO FINANCIAMIENTO	APORTE	ORDEN DE CAMBIO	SUB-TOTAL	
COSTO DE INFRAESTRUCTURA	L 420,684.03	L 0.00	L 420,684.03	
COSTO TOTAL DE LA OBRA			L 420,684.03	

1.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):	ING. ELSA VICTORIA SANTOS
SUPERVISIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE ORDEN DE INICIO	31 de JULIO de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	90 días





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se prepara el informe que corresponde a la estimación número UNO del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 98.90% de las actividades del proyecto.

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 98.90%

SITUACIONES PRESENTADAS:

Debido a las fuertes lluvias se tuvo que iniciar días después de la fecha original de inicio, se miró la necesidad de ampliar las aletas para evitar que el material selecto se lo lleve la corriente.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Se amplió los muros de las aletas, fue necesario para evitar y proteger la estructura.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

1.4 DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

2 CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO.	3
1.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.....	3
1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.	4
1.4 DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.....	4





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info


Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

1. Socialización de proyecto caja puente, los posos



2. Excavacion en la zona donde se haran los muros de contencion y las aletas.

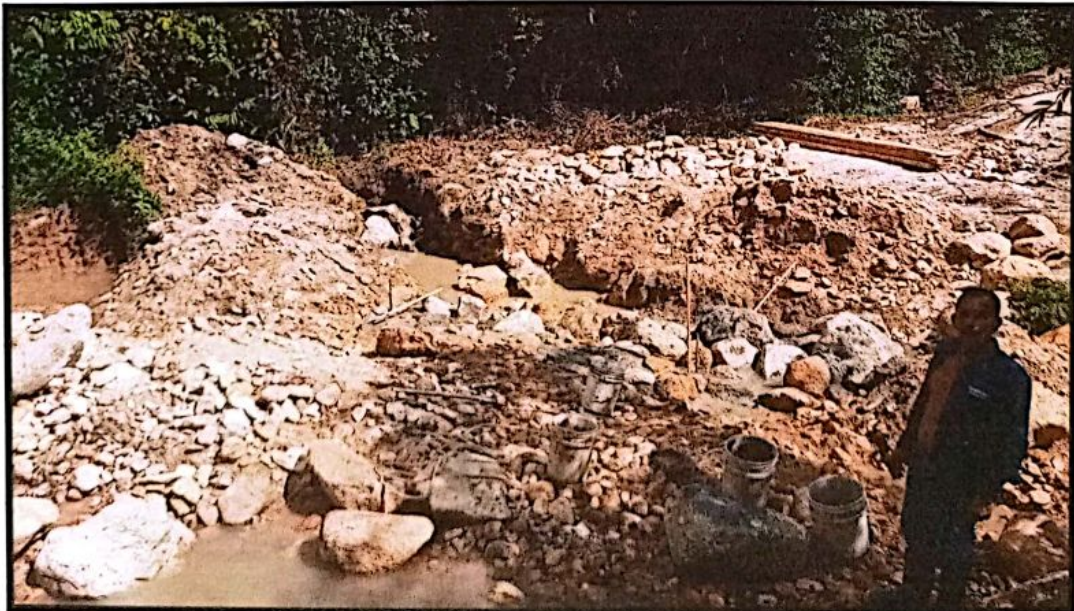



Municipalidad de Santa María, La Paz


Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

3. Encofrado para muros.

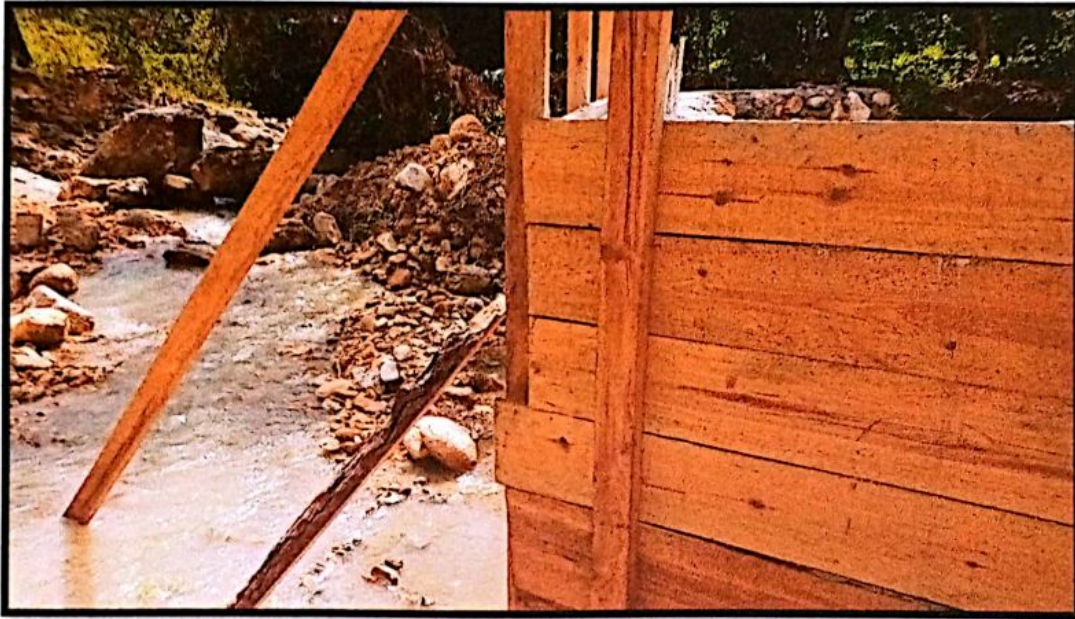

4. Encofrado de estribos.





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

5. Encofrado para muros y aletas



6. Avance en estribos y aletas





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

7. Fundido de losa del puente



8. Se observa puente terminado, con los pretilos pintados





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

9. Supervision del proyecto con ingeniero de la SIT



10. Se observa muro central de la caja





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

11. Caja puente terminada



12. Caja puente terminada





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023

Hora : 09:47 a.m.

USUARIO: GS.NICOLAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14041

L.: 130,151.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 253

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito: 10003001

Paguese a: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 12121977000908

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #001 CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA HONDURAS, CAMALOTE 02

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA HONDURAS, CAMALOTE 02	130,151.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,151.35
Monto Total:		130,151.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,151.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130,151.35

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Argueta
22-1977-00090

0s+js/9JmezATh86pb135SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaU6E+bl5S12p2628NSNrUw9b/EKpA0Fu0BhuMCKGOQ6A17J+DSCkTYhKUn6OHwgrqVaHOMpKODtqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

San Jose, La Paz, Honduras. C.A.

Cel: 9928-6442 / E-mail: juanargueta81@gmail.com

CAI: 30B665-C50533-9A4D88-2649C5-D4EE3E-C5

RTN: 12121977000908

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES N°

000-001-04-00000265

Recibí de: Municipalidad de Santa María RTN: 12179003434704
La suma neta de: Ciento tuitamíl Ciento cincuenta y uno con 35/100 Lps.
Por concepto de: Pago segunda estimación proyecto const
de aula Escuela Honduras Camalote #2

Publigram, B° Torondon, 2da av. N.O, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Fecha: 19 de Oct del 2023

Total por Honorarios	L.	<u>130151</u>	<u>35</u>
Total Retención	L.		
Total Neto Recibido	L.	<u>130151</u>	<u>35</u>



Firma

Rango Autorizado:

000-001-04-00000251 / 000-001-04-00000300

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9866-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003001

SANTA MARÍA

19 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

L 130.151.35

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature of Juan Gabriel Argueta Montoya]
Firma (s)

⑆0 130 20 79⑆00 1 130400006 1 1⑆0000 300 1

N.º 00003001

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #001	CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA HONDURAS. CAMALOTE 02		
CONCEPTO DEL GASTO:			
253	11-304-000061-1		130,151.35
<i>Aldo Vasquez</i>			<i>[Signature]</i>
HECHO P.C.R	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	12121977000908	19 de octubre de 2023	
NOMBRE	NUMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704904 M-0235 29

miércoles, 18 de octubre de 2023

CONSTRUCCIÓN DE AULA
ESCUELA HONDURAS
CAMALOTE 02, CÓDIGO:
COT121713-2023

INFORME DE ESTIMACIÓN DE
PROYECTO



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapaz.santamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, jueves, 19 de octubre de 2023

ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Su oficina.

Estimado:

Se remite la documentación de estimación DOS del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA DE HONDURAS CAMALOTE 02, CÓDIGO: COT121713-2023.**, adjudicado a **ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA** de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Dicha documentación consta de:

- ESTIMACIÓN SOLICITADA
- INFORME DE ESTIMACIÓN
- TABLA DE RETENCIONES
- PAGO A CUENTA CON FECHAS VIGENTES
- FOTOCOPIA DE IDENTIDAD
- FOTOCOPIA DE RTN
- BOLETA CAI VIGENTE
- FOTOGRAFÍAS DETALLANDO EL AVANCE
- NOTA DE REMISIÓN A TESORERÍA POR LA SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN	MONTO PAGADO	RETENCIÓN CALIDAD DE OBRA	RETENCIÓN POR ANTICIPO	MONTO TOTAL	DE	AL
PRIMERA	L 71,218.16	L 4,670.04	L 17,512.66	L 93,400.86	28/08/2023	13/09/2023
SEGUNDA	L 130,151.35	L 8,534.52	L 32,004.43	L 170,690.30		
TOTAL	L 201,369.51	L 13,204.56	L 49,517.09	L 264,091.16		

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS






Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, jueves, 19 de octubre de 2023

GABINO ARGUETA GÁLVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARÍA LA PAZ
Su oficina.



Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE AULA**
ESCUELA DE HONDURAS CAMALOTE 02,
CÓDIGO: COT121713-2023

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, me permito entregar el INFORME N°2, para estimación del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Supervisor de infraestructura
ALCALDÍA



RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT121713-2023
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA, REPUBLICA DE HONDURAS CAMALOTE 02
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	SANTA MARIA
ALDEA:	CAMALOTE #2

FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD	segunda ESTIMACION DEL:	14/09/2023	AL:	17/10/2023
---	--------------------------------	------------	------------	------------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 390,210.60
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 58,531.59
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 390,210.60
Monto de Segunda Estimacion	L 170,690.30


 VoBo **SUPERVISOR MUNICIPALIDAD**

Retencion Sobre Anticipo	L 170,690.30	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
	L 390,210.60	43.74%	1.25	54.68%	L 58,531.59	L 32,004.43

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Retencion de Calidad de obra	L 170,690.30	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
	L 390,210.60	1.050	5.00%	L 170,690.30	L 8,534.52

RESUMEN

Monto Estimado	L 170,690.30
Menos Deducion de Anticipo	L 32,004.43
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 8,534.52
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	L 130,151.35

Monto del Anticipo	L 58,531.59	100.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L 17,512.66	29.92%
AMORTIZACION 2Da. ESTIMACION	L 32,004.43	54.68%
TOTAL AMORTIZADO	L 49,517.09	84.60%
FALTA POR AMORTIZAR	L 9,014.50	15.40%



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-88541

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARGUETA MONTOYA JUAN GABRIEL**
Con Registro Tributario Nacional: **12121977000908**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-88541 en fecha 18/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417381254 de fecha 18/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27724953514, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-88541** o mediante el siguiente código QR:



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA, REPUBLICA DE HONDURAS CAMALOTE 02

UBICACIÓN: CAMALOTE #2

EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

CODIGO: COT121713-2023

ESTIMACIO N° 2

PERIODO: jueves, 14 de septiembre de 2023

A

martes, 17 de octubre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
" U "AULA 7.00x8.00												
1	TRAZADO Y MARCADO	ml	37.58	L 15.00	L 563.70	37.58	L 563.70	0.00	L -	37.58	L 563.70	100.00%
2	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO II	m³	9.07	L 130.00	L 1,179.10	9.07	L 1,179.10	0.00	L -	9.07	L 1,179.10	100.00%
3	ACARREO DE MATERIAL	m³	29.79	L 25.31	L 753.98	29.79	L 753.98	0.00	L -	29.79	L 753.98	100.00%
4	RELLENO DE MATERIAL SELECTO INCLUYE ACARREO	m³	12.19	L 320.00	L 3,900.80	12.19	L 3,900.80	0.00	L -	12.19	L 3,900.80	100.00%
5	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	9.24	L 1,890.15	L 17,464.99	9.24	L 17,464.99	0.00	L -	9.24	L 17,464.99	100.00%
6	DADO DE CONCRETO 0.50 X 0.50 X 0.50 cto. 1:2:2	U	4.00	L 485.25	L 1,941.00	4.00	L 1,941.00	0.00	L -	4.00	L 1,941.00	100.00%
7	DADO DE CONCRETO 0.30 X 0.50 X 0.50 cto. 1:2:2	U	2.00	L 425.63	L 851.26	2.00	L 851.26	0.00	L -	2.00	L 851.26	100.00%
8	SOLERA S-1 0.15X0.15 4#3,#2 @ 0.20 m cto 1:2:2	ml	21.55	L 345.55	L 7,446.60	21.55	L 7,446.60	0.00	L -	21.55	L 7,446.60	100.00%
9	BORDILLO DE CTO. 0.10 X 0.10 e=0.10 cto= 1:2:4 + COLORANTE	ml	10.48	L 258.45	L 2,708.56	10.48	L 2,708.56	0.00	L -	10.48	L 2,708.56	100.00%
10	CASTILLO C-1 frente 0.20 X 0.20 4#3,#2 @ 0.20 cto. 1:2:2	ml	19.80	L 420.00	L 8,316.00	19.80	L 8,316.00	0.00	L -	19.80	L 8,316.00	100.00%
11	CASTILLO C-2 0.15 X 0.15 4#3,#2 @0.20 cto 1:2:2	ml	7.90	L 360.11	L 2,844.87	7.90	L 2,844.87	0.00	L -	7.90	L 2,844.87	100.00%
12	SOLERA S-2 0.15 X 0.15 4#3,#2 @0.20 cto 1:2:2	ml	13.70	L 345.55	L 4,734.04	0.00	L -	13.70	L 4,734.04	13.70	L 4,734.04	100.00%
13	SOLERA S-3 0.20 X 0.25 4#3,#2 @0.20 cto 1:2:2	ml	10.88	L 456.89	L 4,970.96	0.00	L -	10.88	L 4,970.96	10.88	L 4,970.96	100.00%
14	SOLERA S-6 0.20 X 0.25 2#5 arriba ,2#3 abajo #2 @0.20 cto 1:2:2	ml	1.17	L 456.89	L 534.56	0.00	L -	1.17	L 534.56	1.17	L 534.56	100.00%
15	CARGADOR DE PUERTA 0.15 X 0.17 3#3,#2 @ 0.20 cto 1:2:2	ml	1.20	L 210.36	L 252.43	0.00	L -	1.20	L 252.43	1.20	L 252.43	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA, REPUBLICA DE HONDURAS CAMALOTE 02

UBICACIÓN: CAMALOTE #2

EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

CODIGO: COT121713-2023

ESTIMACIO N° 2

PERIODO: jueves, 14 de septiembre de 2023

A

martes, 17 de octubre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
16	BATIENTE DE VENTANA LISO 0.15 X 0.10 2#3, #2 @ 0.20 cto 1:2:2	ml	5.25	L 225.36	L 1,183.14	0.00	L -	5.25	L 1,183.14	5.25	L 1,183.14	100.00%
17	BATIENTE DE VENTANA CON PESTAÑA 0.15 X 0.10 2#3, #2 @ 0.20 cto 1:2:2	ml	6.60	L 265.48	L 1,752.17	0.00	L -	6.60	L 1,752.17	6.60	L 1,752.17	100.00%
18	PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 6"	m ²	49.72	L 685.21	L 34,068.64	49.72	L 34,068.64	0.00	L -	49.72	L 34,068.64	100.00%
19	ENTABICADO DE BLOQUE DE CONCRETO DE 0.30 (INCLUYE REP. Y PUL.)	ml	13.60	L 265.47	L 3,610.39	13.60	L 3,610.39	0.00	L -	13.60	L 3,610.39	100.00%
20	VIGA MET. DE TUBO ESTRUCTURAL DE 4" X 4" L=11.60m	U	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00	0.00	L -	1.00	L 4,200.00	1.00	L 4,200.00	100.00%
21	TECHO CANALETA 6" LAMINA ALUMINIZADA INDUSTRIAL 8'	M2	88.92	L 625.36	L 55,607.01	0.00	L -	88.92	L 55,607.01	88.92	L 55,607.01	100.00%
22	TALLADO DE ELEMENTOS LISO DE 0.10 cm	m ²	5.25	L 35.00	L 183.75	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
23	TALLADO DE ELEMENTOS DE 0.15 cm BOQUETE DE PUER, VENT, CAST.	ml	53.98	L 48.00	L 2,591.04	0.00	L -	20.00	L 960.00	20.00	L 960.00	37.05%
24	TALLADO DE ELEMENTOS DE 0.17 cm CARGADOR	ml	1.20	L 56.00	L 67.20	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
25	TALLADO DE ELEMENTOS DE 0.20 cm CASTILLOS C-1	ml	78.47	L 58.14	L 4,562.25	0.00	L -	25.00	L 1,453.50	25.00	L 1,453.50	31.86%
26	TALLADO DE ELEMENTOS DE 0.25 cm SOLERAS	ml	23.80	L 73.65	L 1,752.87	0.00	L -	10.00	L 736.50	10.00	L 736.50	42.02%
27	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	m ²	150.60	L 154.98	L 23,339.99	30.00	L 4,649.40	120.60	L 18,690.59	150.60	L 23,339.99	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA, REPUBLICA DE HONDURAS CAMALOTE 02

UBICACIÓN: CAMALOTE #2

EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

CODIGO: COT121713-2023

ESTIMACIO N° 2

PERIODO: jueves, 14 de septiembre de 2023

A

martes, 17 de octubre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
28	PISO GRANITO TERRAZO 30X30 PISO GRANITO TERRAZO 30X30(ORINAL GRANITOS Y TERRAZOS)	M2	63.00	L 680.65	L 42,880.95	0.00	L -	63.00	L 42,880.95	63.00	L 42,880.95	100.00%
29	PISO DE LADRILLO PIEDRIN ROJO CRUZADO 25X25 CM.	M2	18.54	L 695.25	L 12,889.94	0.00	L -	18.54	L 12,889.94	18.54	L 12,889.94	100.00%
30	MOLDURA PARA PISO TIPO TERRAZO DE 30 CM.	M.L.	28.20	L 135.21	L 3,812.92	0.00	L -	28.20	L 3,812.92	28.20	L 3,812.92	100.00%
31	MOLDURA PARA PISO ROJO 25 CMS	M.L.	6.85	L 145.36	L 995.72	0.00	L -	6.85	L 995.72	6.85	L 995.72	100.00%
32	PINTURA DE ACEITE	m ²	211.54	L 54.12	L 11,448.54	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
33	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO FIJO	M2	11.03	L 2,120.90	L 23,393.53	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
34	VENTANA DE CELOSIA (INCLUYE RESANES)	M2	8.63	L 2,120.90	L 18,303.37	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
35	BALCON,VAR 1/2",MARCO ANG2"X2"X1/4",PLA 1"(CEB)	M2	19.65	L 975.62	L 19,170.93	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
36	CIELO FALSO FIBRA MINERAL DE 2 X4,Y FLEJE ALUMINIO	M2	55.07	L 410.25	L 22,592.47	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
37	PUERTA METALICA(1.2X2.1m),LAMINA TROQUELADA	UND	2.00	L 5,200.00	L 10,400.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
38	PIZARRA DE FORMICA 2.4X1.20(SUM/INST)	UNID	1.00	L 4,200.00	L 4,200.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL					L 361,469.66	L	90,299.29	L	155,654.42	L	245,953.71	68.04%
SISTEMA ELECTRICO												
39	CENTRO DE CARGA DE 6 ESPACIOS	U	1.00	1200.00	L 1,200.00	0.00	L -	1.00	L 1,200.00	1.00	L 1,200.00	100.00%
40	CIRCUIT. DE ILUM. HASTA 20 AMP.,TUBERIA EMT ø	M.L.	54.11	98.32	L 5,320.10	0.00	L -	54.11	L 5,320.10	54.11	L 5,320.10	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA, REPUBLICA DE HONDURAS CAMALOTE 02

UBICACIÓN: CAMALOTE #2

EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

CODIGO: COT121713-2023

ESTIMACION N° 2

PERIODO: jueves, 14 de septiembre de 2023

A

martes, 17 de octubre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
41	CIRCUITO DE FUER. HASTA 20 AMP, TUBO PVC ø	M.L.	15.12	98.65	L 1,491.59	0.00	L -	15.12	L 1,491.59	15.12	L 1,491.59	100.00%
42	INTERRUPTOR SENCILLO	U	2.00	132.63	L 265.26	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
43	REFLECTOR DOBLE CON BASE DE ALUMINIO 100w	U	1.00	452.12	L 452.12	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
44	LAMPARA INCANDESCENTE GRANDE	ml	7.00	185.00	L 1,295.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
45	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	U	2.00	145.80	L 291.60	0.00	L -	2.00	L 291.60	2.00	L 291.60	100.00%
SUB TOTAL					L 10,315.66	L -	L -	L 8,303.28	L 8,303.28	80.49%		
CANAL Y BAJANTES DE A. LL.												
46	CANAL DE AGUAS LLUVIAS	U	15.20	255.36	L 3,881.47	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
47	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FRONTAL	U	1.00	412.68	L 412.68	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
48	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS POSTERIOR	U	1.00	412.68	L 412.68	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL					L 4,706.83	L -	L -	L -	L -	0.00%		
OBRAS EXTERIORES ACERA PERIMETRAL												
49	TRAZADO Y MARCADO	ml	21.30	15.00	L 319.50	21.30	L 319.50	0.00	L -	21.30	L 319.50	100.00%
50	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	2.06	130.00	L 267.80	2.06	L 267.80	0.00	L -	2.06	L 267.80	100.00%
51	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	6.65	25.31	L 168.31	6.65	L 168.31	0.00	L -	6.65	L 168.31	100.00%
52	RELLENO DE MATERIAL SELECTO INCLUYE ACARREO	m³	1.07	320.00	L 342.40	1.07	L 342.40	0.00	L -	1.07	L 342.40	100.00%
53	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	1.06	1890.15	L 2,003.56	1.06	L 2,003.56	0.00	L -	1.06	L 2,003.56	100.00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA, REPUBLICA DE HONDURAS CAMALOTE 02

UBICACIÓN: CAMALOTE #2

EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

CODIGO: COT121713-2023

ESTIMACIO N° 2

PERIODO: jueves, 14 de septiembre de 2023

A

martes, 17 de octubre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
54	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	16.03	420.00	L 6,732.60	0.00	L -	16.03	L 6,732.60	16.03	L 6,732.60	100.00%
55	LIMPIEZA EN AREAS EXTERIORES	m²	16.30	8.72	L 142.14	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
56	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	16.30	8.72	L 142.14	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL					L 10,118.44	L 3,101.57	L 6,732.60	L 9,834.17	97.19%			
ROTULO DE PROYECTO												
57	ROTULO FHIS METALICO 3'X8' INCLUYE PATAS	UNID	1.00	3600.00	L 3,600.00	0.00	L -	0.00	L -	0.00	L -	0.00%
SUB TOTAL					L 3,600.00	L -	L -	L -	0.00%			
COSTO PROYECTO					L 390,210.60	L 93,400.86	L 170,690.30	L 264,091.17	67.68%			
MONTO A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION		L 170,690.30										

 EJECUTOR FIRMA:	 SUPERVISION ALCALDIA MUNICIPAL FIRMA:	 ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA FIRMA:
ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

RESUMEN EJECUTIVO

1.1- IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA HONDURAS CAMALOTE 02, CÓDIGO: COT121713-2023			
UBICACIÓN:	CAMALOTE 02, SANTA MARIA, LA PAZ			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA HONDURAS CAMALOTE 02			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD . La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal.			
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO	APORTE	ORDEN DE CAMBIO	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCTURA	L 390,210.60	L 0.00		L 390,210.60
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L 390,210.60

1.2- INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
SUPERVISIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE ORDEN DE INICIO	lunes, 28 de agosto de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	90 días





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

1.3- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:	Se prepara el informe que corresponde a la estimación número DOS del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 67.68% de las actividades del proyecto.
PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 67.68%	
SITUACIONES PRESENTADAS:	
SOLUCIONES PROPUESTAS:	
PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:	<ol style="list-style-type: none">1. Maestro de Obra2. Ayudantes.3. Ingeniero Ejecutor

1.4- DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.






Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

1. Levantamiento de paredes

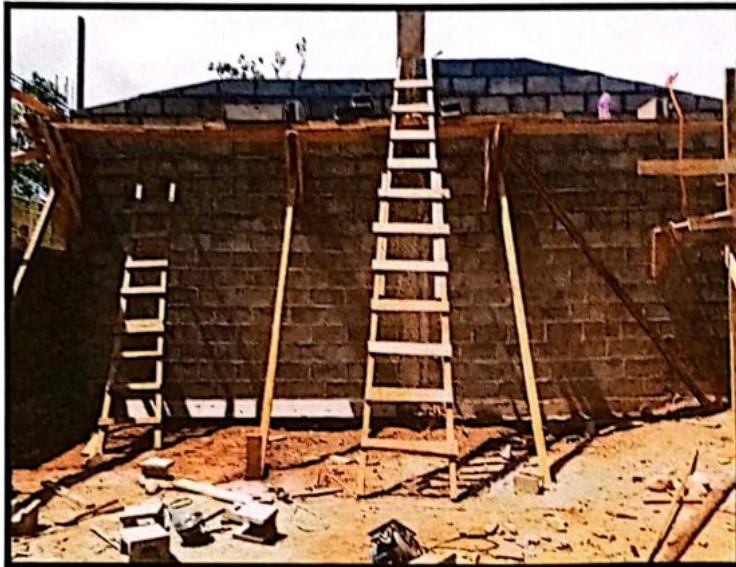

2. Se observa las columnas y paredes





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

3. Se levantaron las paredes



4. Se observa columnas y paredes repelladas






Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

5. Se finalizo repello e instalacion de techo

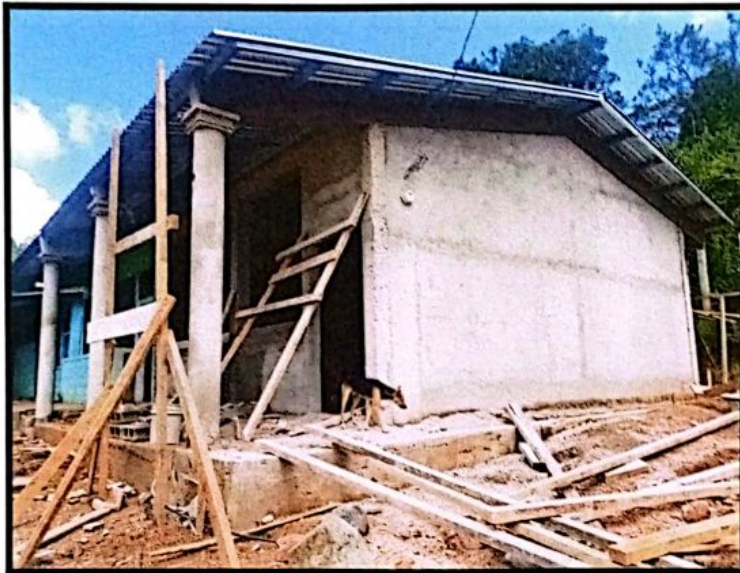

6. Techo instalado



[Handwritten signature]




Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

7. Instalacion de piso



8. Instalacion de molduras en el piso

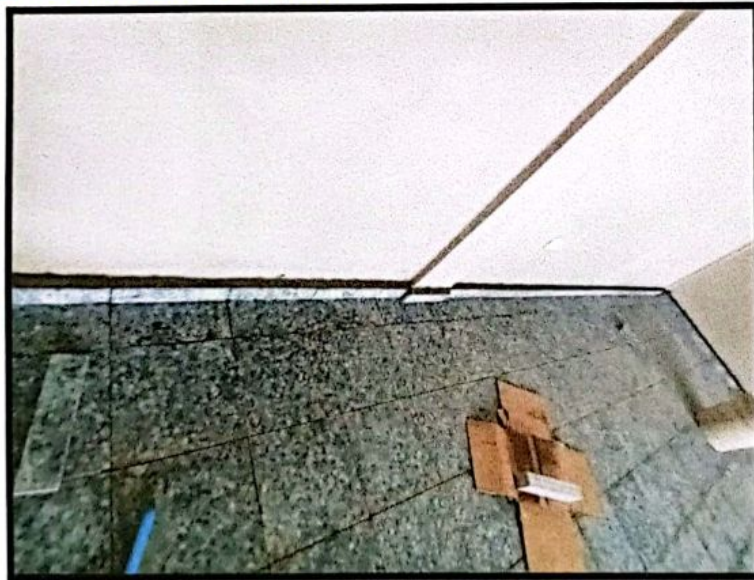

[Handwritten signature]



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

9. Se finalizo instalacion de piso



10. Piso de granito instalado





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2023
Hora : 09:40 a.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14040

L.: 284,897.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 252

Fecha de Emisión: 19/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 00002000

Pague a: PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES

Id/RTN: 1516198600114

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #001 CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 001 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES	284,897.89

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	284,897.89
Monto Total:		284,897.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	284,897.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	284,897.89

Firma y Sello de Presupuestario

 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA, LA PAZ

Firma y Sello de Tesoreria

 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA MARIA, LA PAZ

Firma y Sello del Alcalde (sa)

 ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA, LA PAZ

Recibido por: Por.: Alma Galeano

Identidad No.: 12181996.00766



0s+jsf9JmezATH86pbl35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbIAWAcaUEPbL3810p2628N9MrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6A17J+DSCkTYhKU6OHwgrqVaHOMP
 KOdTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbcUBAvKzdKkuO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ
SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9985-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003000

SANTA MARÍA

19 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

PAOLA NATIALLY CHAVEZ COLINDRES

L 284.897.89

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signatures]

Firma(s)

⑆0⑆30⑆20⑆79⑆00⑆⑆30⑆40⑆0006⑆⑆0000⑆3000

N.º 00003000

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #001 CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATOLICA, LOS PLANES.		
CONCEPTO DEL GASTO:			284,897.89
252	11-304-000061-1		
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
Aldo Vásquez			Alma G.
PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES	1516198600114	19 de octubre de 2023	
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	



27104904 M-0235 29

Tegucigalpa MDC
16 de octubre 2023

Ing. Luis Fernando Amador
Director de proyectos
Municipalidad de Santa María

Ref: AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE CHEQUE.

Estimado Ing. Amador

Por medio de la presente autorizo a la señora **ALMA YADIRA GALEANO GALO** con numero de identidad 1218199600366, a retirar los cheques de pago correspondiente al cobro de estimaciones de avance de obra de los proyectos:

1. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, PAVITAS, CÓDIGO: COT121714-2023; por un monto de L. 143,686.56.
2. CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA IGLESIA CATÓLICA, LOS PLANES, CÓDIGO: COT121715-2023; por un monto de L. 296,124.43.

Condiciones de salud me impiden movilizarme a realizar el trámite correspondiente,

De antemano agradezco la atención prestada a la presente,

Cordial Saludo




Ing. Paola Chávez
Contratista individual
CICH: 6376

martes, 17 de octubre de 2023

CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTO CALLE HACIA
LA IGLESIA CATÓLICA, LOS
PLANES, CÓDIGO:
COT121715-2023

INFORME DE ESTIMACIÓN DE
PROYECTO



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, martes, 17 de octubre de 2023

ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Su oficina.

Estimado:

Se remite la documentación de estimación uno del proyecto **CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA, LOS PLANES, CÓDIGO: COT121715-2023.**, adjudicado a **ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES** de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Dicha documentación consta de:

- ESTIMACIÓN SOLICITADA
- INFORME DE ESTIMACIÓN
- TABLA DE RETENCIONES
- PAGO A CUENTA CON FECHAS VIGENTES
- FOTOCOPIA DE IDENTIDAD
- FOTOCOPIA DE RTN
- BOLETA CAI VIGENTE
- FOTOGRAFÍAS DETALLANDO EL AVANCE
- NOTA DE REMISIÓN A TESORERÍA POR LA SUPERVISIÓN

ESTIMACIÓN	MONTO PAGADO	RETENCIÓN CALIDAD DE OBRA	RETENCIÓN POR ANTICIPO	MONTO TOTAL	DE	AL
PRIMERA	L 284,897.89	L 18,681.83	L 70,056.86	L 373,636.58	22/08/2023	09/10/2023
TOTAL	L 284,897.89	L 18,681.83	L 70,056.86	L 373,636.58		

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA SANTA MARÍA



UNIDAD DE PROYECTOS

1

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT121715-2023
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA IGLESIA CATOLICA
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	SANTA MARIA
ALDEA:	LOS PLANES

FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	22/08/2023	AL:	09/10/2023
--------------------------------------	-------------------------	------------	-----	------------

CREDITO:	LPS
Monto Inicial de Contrato	L 741,751.80
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 111,262.77
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	L 741,751.80
Monto de Primera Estimacion	L 373,636.58



Retencion Sobre Anticipo	L	373,636.58
	L	741,751.80

% DE AVANCE	ACTOR de R	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
50.37%	1.25	63%	111,262.77	70,056.86

EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

EJECUTOR PRESENTA FIANZA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Retencion de Calidad de obra	L	373,636.58
	L	741,751.80

FACTOR de Re	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
1.050	5.00%	373,636.58	18,681.83

RESUMEN

Monto Estimado	L	373,636.58
Menos Deducion de Anticipo	L	70,056.86
Menos Deducion I.S.R 12.5%		
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%		
Deducciones 5% Calidad de Obra	L	18,681.83
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	L	284,897.89

ANTC.	MONTO	%
Retencion #1	L 70,056.86	62.97%
TOTAL RETENIDO	L 70,056.86	62.97%
FALTA POR RETENER	L 41,205.91	37.03%

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE HACIA IGLESIA CATOLICA

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ




EJECUTOR: ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES

CODIGO: COT121715-2023

ESTIMACIO Nº 1

PERIODO: martes 22 de agosto de 2023 A lunes 09 de octubre de 2023

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
PAVIMENTO HIDRAULICO												
1	TRAZADO CON TEOLOLITO, Y NIVEL DE PRECISION	M.L	125.00	L 20.00	L 2,500.00		L -	125.00	L 2,500.00	125	L 2,500.00	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	120.00	L 110.00	L 13,200.00		L -	120.00	L 13,200.00	120	L 13,200.00	100%
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	144.00	L 100.00	L 14,400.00		L -	144.00	L 14,400.00	144	L 14,400.00	100%
4	BALASTADO, COMPACTADO Y CONFORMACION DE CALLES	M3	120.00	L 721.41	L 86,569.20		L -	120.00	L 86,569.20	120	L 86,569.20	100%
5	CONCRETO DE 280 KG/CM	M3	120.00	L 4,270.00	L 512,400.00		L -	55.65	L 237,625.50	55.65	L 237,625.50	46%
6	JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPOSOR 15 CMS)	ML	695.00	L 12.00	L 8,340.00		L -		L -	0	L -	0%
7	CORTADO DE CONCRETO	ML	695.00	L 8.00	L 5,560.00		L -		L -	0	L -	0%
8	ACERO DE REFUERZO GRADO 40 Fy=2800 Kg/cm2	KG	611.47	L 47.48	L 29,032.60		L -	281	L 13,341.88	281	L 13,341.88	46%
9	BORDILLO DE CONCRETO DE 15X7.50 CM (INCLUYE PINTADO)	M.L	250.00	L 212.00	L 53,000.00		L -		L -	0	L -	0%
10	PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO	ML	250.00	L 35.00	L 8,750.00		L -		L -	0	L -	0%
11	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)	VIAJE	2.00	L 3,000.00	L 6,000.00		L -	2.00	L 6,000.00	2	L 6,000.00	100%
SUB TOTAL					L 739,751.80		L -		L 373,636.58		L 373,636.58	51%
ROTULO DE PROYECTO												
12	ROTULO FMS METALICO 3'X8' INCLUYE PATAS	UNID	1.00	L 2,000.00	L 2,000.00		L -		L -	0	L -	0%
SUB TOTAL					L 2,000.00		L -		L -		L -	0%
COSTO PROYECTO					L 741,751.80		L -		L 373,636.58		L 373,636.58	50%
MONTO A PAGAR PRIMERA			L									373,636.58

<p>EJECUTOR: CHAVEZ COLINDRES</p> <p>FIRMA: </p> <p>INGENIERO CIVIL</p> <p>04-09-14</p> <p>08-09-14</p> <p>NOMBRE: PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES</p>	<p>SUPERVISOR AL CALDIA MUNICIPAL</p> <p>UNIDAD DE FIRMADO</p> <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO</p>	<p>ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA</p> <p>FIRMA: </p> <p>NOMBRE: GABINO ARGUETA SALVEZ</p>
<p>FECHA 15/10/2023 00:00</p>		

República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 15161986001146

PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20110627

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 42 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 44 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 731634 Transacción: D09C98



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-88398

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CHAVEZ COLINDRES PAOLA NATHALY**
Con Registro Tributario Nacional: **15161986001146**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-88398 en fecha 17/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417375164 de fecha 17/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27722796796, presentada el 19/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/01/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-88398** o mediante el siguiente código QR:





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, martes, 17 de octubre de 2023

GABINO ARGUETA GÁLVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARÍA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO**
CALLE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA, LOS
PLANES, CÓDIGO: COT121715-2023

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA**, me permito entregar el **INFORME N°1**, para estimación del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
Supervisor de infraestructura
ALCALDÍA





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

RESUMEN EJECUTIVO

1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO.

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLE HACIA LA IGLESIA CATÓLICA, LOS PLANES, CÓDIGO: COT121715-2023			
UBICACIÓN:	LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRAULICO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de la de LA MUNICIPALIDAD . La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal.			
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO	APORTE	ORDEN DE CAMBIO	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCTURA	L. 741,751.80	L 0.00		L. 741,751.80
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 741,751.80

1.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):	ING. PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES
SUPERVISIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
	CONTRATO ORIGINAL
FECHA DE ORDEN DE INICIO	martes, 22 de agosto de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	90 días





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se prepara el informe que corresponde a la estimación número UNO del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 50.00% de las actividades del proyecto.

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 50.00%

SITUACIONES PRESENTADAS:

SOLUCIONES PROPUESTAS:

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

1.4 DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

2 CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO.	3
1.2 INFORMACIÓN CONTRACTUAL.....	3
1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.	4
1.4 DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.....	4





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@Yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

1. Preparacion Del Terreno



2. Se realiza excavacion y conformacion de la calle





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

3. Se inicia proceso de fundido de pavimento hidráulico



4. Se realiza fundido de pavimento, el cual se realiza con material requerido








Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

5. Fundido de pavimento



6. Se observa Se fundieron dos tramos. Al finalizar se observa las juntas frías



Juntas frías se colocan al finalizar cada día de trabajo de fundición de concreto.






Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

INFORME ILUSTRADO

7. Tramo carretero de pavimento fundido

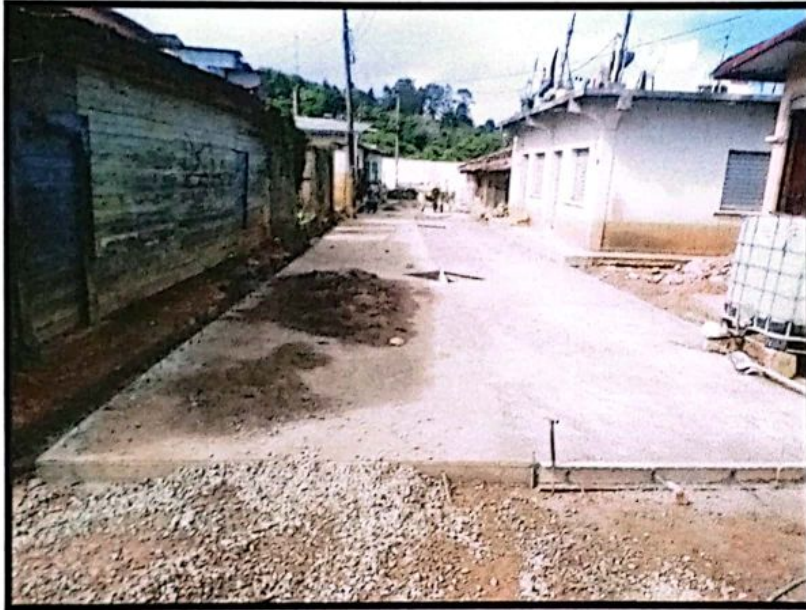

8. Tramo carretero fundido





Honduras, C.A.

SANTA MARÍA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: GS.NICOLAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14073

L.: 53,575.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 285

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito: 00003032.

Paguese a: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

Id/RTN: 12121977000908

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ANTICIPO DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #004 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS PLANES / EJECUTADO CON OTROS FONDOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 004 000 001 47210 11-011-04	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS PLANES	53,575.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS / 5 CAJAS PUENTE	53,575.78
Monto Total:		53,575.78

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		53,575.78
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		53,575.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldes (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 212-1977-00090

0s+jsfj9JmezATh86pbj35SxE+3JUJBF6M981RT2aWdbtAWAcaU6E+bL5S12p2628NSNrUwn8b/EKgA6EddBhuMCKGOQ6AI7J+DSCKTYhKUn6OHwgrqVaHOMpKODTqowjWtp31/pAJYOvMpg5yQbCUBAvKzdKkuO

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

San Jose, La Paz, Honduras. C.A.

Cel: 9928-6442 / E-mail: juanargueta81@gmail.com

CAI: 30B665-C50533-9A4D88-2649C5-D4EE3E-C5

RTN: 12121977000908

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES N°

000-001-04-00000266

Recibí de: Municipalidad de Santa Rosa RTN: 12179003434704

La suma neta de: Cinco mil quinientos setenta y cinco con 78/100 ps.

Por concepto de: Pago de anticipo de monto de contrato

construccion de Caja Puente en los planes Sta Maria

La Paz Proyectos Productivos

Publigran, B° Torondon, 2da ave. N.O, Comayagua Tel. 2172-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Fecha: 21 de Oct del 2023

Total por Honorarios	L.	<u>53,575.78</u>	
Total Retención	L.		
Total Neto Recibido	L.	<u>53,575.78</u>	


Firma



Rango Autorizado:

000-001-04-00000251 / 000-001-04-00000300

Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA LA PAZ

SANTA MARÍA LA PAZ
CEL. 9865-2258

Cuenta N.º: 11-304-000061-1

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00003032

SANTA MARÍA
Lugar y Fecha

24 de octubre de 2023

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

L 53,575.78

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
Banco de Occidente, S.A.

[Handwritten signature: J. Argueta]
Firma(s)

[Handwritten signature: Aldo Vasquez]

⑆0⑆30⑆20⑆79⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆00003032

N.º 00003032

CUENTA	DETALLE OBJETO DE PAGO	PARCIAL	TOTAL
	PAGO DE PAGO DE ANTICIPO DE MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO #004 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS PLANES / EJECUTADO CON OTROS FONDOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.		
	CONCEPTO DEL GASTO: 285 11-304-000061-1		53,575.78
Aldo Vasquez			
HECHO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	12121977000908	24 de octubre de 2023	
NOMBRE	NÚMERO DNI	FECHA DE PAGO	

2704904 M-0235 29



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

Santa María la Paz, viernes, 20 de octubre de 2023

ALDO ANTONIO VASQUEZ NICOLAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Su oficina.

Estimado:

Se remite la documentación de anticipo del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EN LOS PLANES, CÓDIGO: COT121716-2023 (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LOS PLANES)**, de lo que se da fe que la documentación esta verificada. Actuando como supervisor Municipal de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Proyecto por un monto de **TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 89/100 (L. 357,171.89)**. Cuya garantía de ANTICIPO es por un monto de **CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100 (L. 53,575.78)**.

Contratista **ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA**


Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA SANTA MARÍA

Nº 54754



FIANZA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No. FC-230929

VIGENCIA:

DESDE: 17 DE OCTUBRE DE 2023

HASTA: 17 DE MARZO DE 2024

SUMA AFIANZADA HASTA:

L. 107,151.56 (CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100)

AFIANZADO:

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

BENEFICIARIO:

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ

COBERTURA: Para garantizar el fiel cumplimiento del Proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EN LOS PLANES, CÓDIGO: COT121716-2023 (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LOS PLANES)".

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

Cláusula especial: La obligación derivada de esta fianza disminuirá conforme al avance de la obra.

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de octubre de 2023.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA



FIANZA DE ANTICIPO

No. FA-230270

VIGENCIA:

DESDE: 17 DE OCTUBRE DE 2023

HASTA: 17 DE FEBRERO DE 2024

SUMA AFIANZADA HASTA: L. 53,575.78 (CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100)

AFIANZADO: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

BENEFICIARIO: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, LA PAZ

COBERTURA: Para garantizar la correcta inversión del anticipo en el Proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EN LOS PLANES, CÓDIGO: COT121716-2023 (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LOS PLANES)".

CLAUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

Cláusula especial: La obligación derivada de esta fianza disminuirá conforme a la Inversión y/o amortización del anticipo.

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de octubre de 2023.


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

CONTRATO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y EL CONTRATISTA, FINANCIADO CON FONDOS MUNICIPALES.

Yo, **GABINO ARGUETA GÁLVEZ**, alcalde de la Municipalidad de Santa María, departamento de La Paz mayor de edad, Hondureño, soltero, con tarjeta de identidad No. **1218-1962-00057**, con domicilio y residencia en el municipio de Santa María, Departamento de La Paz, quien actúa en su condición de Alcalde Municipal, estando facultado para ejercer la representación legal de La Municipalidad de Santa María, Departamento de La Paz y para celebrar toda clase de actos y contratos, quien en adelante se denominará **LA MUNICIPALIDAD** por una parte, y por la otra, el señor **ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA**, mayor de edad, de profesión Ingeniero Civil, hondureño, casado, con tarjeta de identidad No. **1212-1977-00090**, con domicilio en la comunidad de Las Torres, Santa María, departamento de La Paz, actuando en su condición de **Contratista Individual**, denominado de aquí en adelante **EL CONTRATISTA**; por este acto acuerdan celebrar como al efecto celebran el presente contrato bajo las cláusulas y condiciones siguientes: **PRIMERA: DEFINICIONES:** Siempre que se empleen los vocablos que a continuación se señalan significan: **MUNICIPALIDAD:** Es el órgano de Gobierno y administración del Municipio; se rige por la Ley de Municipalidades y su reglamento, y por lo tanto es una institución de derecho público, con autonomía para ejercer los asuntos de su competencia, y que para efectos de este Convenio, asume la responsabilidad administrativa, técnica y legal, para la ejecución de los proyectos. **LA UTI:** Es la Unidad Técnica, dependencia municipal encargada de administrar el ciclo de proyectos en lo que corresponde a la pre inversión, contratación, inversión, supervisión de la infraestructura y capacitación que el proyecto implica. **EL CONTRATISTA:** la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Ejecutores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para la prestación de servicios para construir una obra civil o proyecto específico. **EL SUPERVISOR:** es la persona natural o jurídica debidamente calificada y registrada en el Banco de Supervisores de la Municipalidad/Mancomunidad, contratado por la Municipalidad para ejercer la supervisión de la construcción de la obra de manera que es responsable de que la obra se ejecute de acuerdo a lo establecido en este contrato y términos de referencia, con la calidad y en el tiempo establecido. **EL PROYECTO:** Es la obra física cuya ejecución es objeto de este contrato, **PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EN LOS PLANES, CÓDIGO: COT121716-2023 (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LOS PLANES)**, **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA se compromete a construir y dejar listas para su uso las obras que conforman EL PROYECTO según los cuadros de cantidades de obra, precios unitarios y planos convenidos con LA MUNICIPALIDAD. **TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.** El monto de este contrato es de **TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 89/100 (L. 357,171.89)** procedentes de la fuente Fondos Municipales y cualquier modificación futura que dicho Convenio conlleve mientras dure su ejecución. **CUARTA: ANTICIPO:** LA MUNICIPALIDAD, otorgará al CONTRATISTA un anticipo





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

(siempre y cuando el contratista lo requiera) por un monto de **CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100 (L. 53,575.78)** equivalente al 15% del monto total de este Contrato como lo estipula en las bases de licitación y conforme lo establece la Ley de Contratación del Estado en el artículo 105, bajo la cual se rige este contrato, previo cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que este Contrato haya sido plenamente formalizado; b) Que se hayan aceptado por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, las correspondientes garantías que rinda el Contratista. **QUINTA: AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:** De cada estimación presentada por **EL CONTRATISTA** será deducido proporcionalmente a partir de la primera estimación la cantidad porcentual que corresponda al anticipo, de manera que cuando el proyecto presente un avance físico financiero del 80%, el anticipo se encuentre amortizado al 100%. En caso de utilización comprobada del anticipo para fines distintos del proyecto, **LA MUNICIPALIDAD** procederá a exigir su devolución a **EL CONTRATISTA** y ejecutará la correspondiente garantía de anticipo sin perjuicio de la rescisión del contrato a criterio de la Municipalidad. **SEXTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal 15 días después de la entrega del cheque de anticipo por parte de **LA MUNICIPALIDAD** y de la recepción por parte de **EL CONTRATISTA**. Si pasados 15 días calendario, el **CONTRATISTA** no ha retirado el cheque de anticipo, **LA MUNICIPALIDAD** se reserva el derecho de realizar un nuevo proceso de adjudicación, sin responsabilidad alguna por su parte. **SÉPTIMA: IMPUESTOS: EL CONTRATISTA** está en la obligación de Cancelar a la Secretaria de administración de rentas de la obra en ejecución, el cual será calculado en base al 15% de Utilidad Generada del Proyecto. Impuesto que será deducido en cada una de las estimaciones presentadas en el transcurso del proceso de ejecución de la obra, posteriormente **LA MUNICIPALIDAD** está en la obligación de presentar dicho impuesto retenido al Contratista en la Agencia Bancaria que se estime conveniente en los próximos 10 días a la retención. **SI EL CONTRATISTA PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA EXTENDIDA POR LA SAR HACER CASO OMISO A ESTA CLAUSULA DE IGUAL MANERA EL CONTRATISTA ESTA SUJETO AL PAGO DE TASA IMPUESTO MUNICIPAL** **OCTAVA: DESEMBOLSOS:** **LA MUNICIPALIDAD**, además del anticipo efectuará pagos a **EL CONTRATISTA** de acuerdo al avance del proyecto; estos desembolsos se harán mediante la presentación de estimaciones por parte de **EL CONTRATISTA**, revisadas y autorizadas por **EL SUPERVISOR** municipal unidad de proyectos, y/o supervisor de la UTI. Para el pago de la estimación ésta debe ser aprobada por **LA MUNICIPALIDAD**. A las estimaciones se les deducirá la parte porcentual que resulte de lo entregado como anticipo y demás retenciones establecidas por Ley, Se hará supervisión por parte de gobernación de la cual dependerán los desembolsos. **NOVENA: TIEMPO DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA** se compromete a construir la obra objeto de este Contrato dentro de los **SESENTA (60)** días calendario contados a partir de la fecha indicada en la orden de inicio; en caso de que **EL CONTRATISTA** no termine el proyecto en el plazo estipulado por razones imputables a él, pagará a **LA MUNICIPALIDAD** en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, una multa por la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100 (L. 446.46)** equivalente al **0.125%** sobre el monto del contrato por cada día de retraso. **DECIMA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA**, previo a la entrega del anticipo rendirá





Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@Yahoo.com

lapazsantamaria@municipalidad.info

Tel. 9865-2258

una Garantía de Anticipo equivalente al **100%** del valor del anticipo recibido que hace de **CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100 (L. 53,575.78)** también rendirá una Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al **15%** sobre el valor del Contrato, equivalente a **CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 57/100 (L. 107,151.57)** La Garantía de Cumplimiento de contrato estará vigente hasta tres meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. Si por causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecución del contrato, por un término mayor de dos meses, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de manera que venza tres meses después del nuevo plazo establecido; el valor de la ampliación se calculará sobre el monto pendiente de ejecución, siempre que lo anterior hubiere sido ejecutado satisfactoriamente. Se establece una Garantía de Calidad de Obra equivalente al **5%** del monto del contrato, la cual deberá presentarse previo al pago de la última estimación y tendrá una vigencia de un año, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción Provisional. Todos los documentos de garantía deberán contener la siguiente cláusula obligatoria. "LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO" Este Certificado de Incumplimiento será emitido por LA MUNICIPALIDAD. **DECIMA PRIMERA: VARIACIONES AL CONTRATO.** Las cantidades de obra de EL PROYECTO son estimadas y pueden variar. LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de modificar, variar, agregar, o disminuir partes del total de la obra cuando así convenga a sus intereses. En este caso, sin invalidar el contrato, siempre y cuando sea autorizado mediante Orden de Cambio, previamente revisada y firmada por EL SUPERVISOR, y por el COORDINADOR de LA UTI podrá variar el valor del contrato hasta un máximo del diez por ciento (10%) arriba del valor señalado en la Cláusula Tercera de este Contrato, modificando en consecuencia las cifras del mismo si supera el 10% del monto del contrato se deberá hacer un adendum al contrato. El valor de las modificaciones acumuladas no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del monto inicial del contrato. **DÉCIMA SEGUNDA: ROL DEL SUPERVISOR: EL SUPERVISOR** dará, dentro de los límites del contrato, instrucciones a EL CONTRATISTA para subsanar cualquier deficiencia de la obra. **DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL: EL CONTRATISTA** será el único responsable del pago de las obligaciones laborales que se deriven de la contratación del personal que efectúe la ejecución del proyecto; por consiguiente, será su responsabilidad afrontar y solucionar todos los problemas de tipo laboral que se presentaren durante y después de la construcción de la obra. Asimismo, EL CONTRATISTA libera de toda responsabilidad a LA MUNICIPALIDAD y en caso de acciones entabladas por daños a terceros en razón de transgresiones de sus derechos como consecuencia de los trabajos a realizar en los sitios de la obra y las colindancias de ésta. **DÉCIMA CUARTA: EMPLEO.** a) EL CONTRATISTA procurará emplear en actividades de la construcción (albañilería, fontanería básica, electricidad básica, entre otros) a personal de este municipio, **DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN DEL CONTRATO O SUSPENSIÓN DE DESEMBOLSOS.** LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el presente Contrato o suspender los desembolsos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes causales: a) Incumplimiento de cualquiera de las

3 De 4





Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

obligaciones estipuladas en el presente Contrato. b) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales, uso inapropiado de equipo o uso indebido de los fondos adelantados por **LA MUNICIPALIDAD**, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por **EL SUPERVISOR** o con base a las visitas que **LA MUNICIPALIDAD** lleve a cabo, de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del presente Contrato, c) A requerimiento de **LA MUNICIPALIDAD** o de **EL CONTRATISTA**, cuando las condiciones prevalecientes no hicieran posible la terminación del proyecto. d) La suspensión de los desembolsos o resolución del contrato por parte de **LA MUNICIPALIDAD**, según sea el caso por cualesquiera de las cláusulas antes indicadas, no liberará de responsabilidad a **EL CONTRATISTA** de las obligaciones contraídas de liquidar o reembolsar los recursos que le hubiese adelantado **LA MUNICIPALIDAD**, e) No iniciar la obra después de 15 días de la fecha de inicio establecida y que no exista causa justificada; f) Incapacidad manifiesta de **EL CONTRATISTA** para ejecutar ese tipo de obra, g) No cumplir con las instrucciones de **EL SUPERVISOR** cuando éstas favorezcan la ejecución de la obra. **DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.** En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito el derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, **EL CONTRATISTA** renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de **LA MUNICIPALIDAD**. - **DÉCIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN:** Las partes aceptan en todo y cada una de sus partes las cláusulas anteriores y convienen en que lo no previsto en el presente contrato será regulado por los documentos detallados en la Cláusula Anteriores del Contrato, de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato de Infraestructura Municipal.

En fe de lo cual, de común acuerdo, firmamos el presente Contrato en el Municipio de Santa María, Departamento de La Paz, a los disisiete (17) días del mes de OCTUBRE del 2023.



GABINO ARGUETA GÁLVEZ
Santa María, La Paz
Alcalde Municipal



ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA
Contratista
CICH: 3578



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
lapazsantamaria@municipalidad.info
Tel. 9865-2258

ORDEN DE INICIO

Proyecto de Infraestructura

Por este medio se autoriza el inicio del proyecto:

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE UN CARRIL, EN LOS PLANES, CÓDIGO: COT121716-2023 (CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE LOS PLANES)

Código: COT121716-2023

Departamento: LA PAZ

Municipio: SANTA MARÍA

Aldea: LOS PLANES

Ejecutor: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

Fuente: SIT Y FONDOS MUNICIPALES

Se establece como fecha oficial de inicio el: 23 de OCTUBRE de 2023

Fecha: 17 DE OCTUBRE 2023



Gabino Argueta Galvez
ALCALDE MUNICIPAL



Ing. Luis Fernando Amador P.
UNIDAD PROYECTOS



Ing. Juan Gabriel Argueta Montoya
EJECUTOR
