



Municipalidad de Jocon, Yoro

Tel 2433 – 40 23



Trabajando para el desarrollo del Municipio

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE

AÑO 2016.

OFICINA DE DIMAJ: TECNICO MUNICIPAL: CARMEN CASTRO

N .	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	LUGAR Y FECHA	RECURSO	RESPONSABLE
1	Supervisión en diferentes procesos del proyecto de alcantarillado Sanitario en sanjeadura, colocación de tubería y aterrado de la misma	01-02/12/2016 Barrio el centro, el calvario	Humano Papelería de oficina, cámara digital	Oficina de DIMAJ ING. Encargado del proyecto y Personal de apoyo
2	2. supervisión y ejecución en varios procesos en fundición y pegado de ladrillos en pozos de inspección, cajas de conexiones de tomas domiciliarilla, llenado y digitalización de encuesta de los beneficiarios del proyecto de alcantarillado sanitario y elaboración de informes de supervisión del proyecto	Del 05 al 09 /2016 Barrio el centro, pinares de la Zona Urbana de Jocon.	Humano Material de oficina Cámara digital	Oficina de DIMAJ ING. Encargado del proyecto y Personal de apoyo
3	ejecución en en fundición y pegado de ladrillos en pozos de inspección, cajas de conexiones de tomas domiciliarilla, llenado y digitalización de encuesta de los beneficiarios del proyecto de alcantarillado sanitario y entrega de materiales para ejecución del proyecto como cemento, varilla tubería de presión y otros	Del 12 al 16 /12/2016 Barrio el centro, pinares el calvario y Sinaí	Humano Material de oficina	Oficina de DIMAJ ING. Encargado del proyecto y Personal de apoyo
4	Supervisión en sangradura y colocación de tubería y accesorios para los procesos del proyecto de ampliación y reubicación del sistema de agua de la Zona Urbana y entrega de avisos de cobros de servicios Públicos	Del 19 al 23 /12/2016 Barrio el centro, pinares el calvario y Sinaí de la zona urbana de Jocon.	Humano Materiales de oficina y de proyectos	Oficina de DIMAJ. Y control tributario.

N .	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	LUGAR Y FECHA	RECURSO	RESPONSABLE
1	Entrega de avisos de cobros de servicios Públicos en diferentes barrios y colonias del Municipio, descargar de ladrillos y tubería de PVC. Para el proyecto de alcantarillado Sanitario de la Zona Urbana y entrega de materiales para el mismo	Del 26 al 30/2016. En la Zona Urbana de Jocon	Humano Papelería de oficina Material de proyectos	Oficina de DIMAJ Control tributaria



Municipalidad de Jocon, Yoro

Tel 2433 – 40 23



Trabajando para el desarrollo del Municipio

Informe técnico de proyectos de agua y saneamiento

Alcantarillado Sanitario primera Etapa de la Zona Urbana del Municipio

En el presente informe se detallan cada una de las actividades que se desarrollaron en el proyecto de alcantarillado sanitario de la primera etapa de la Zona Urbana del Municipio, el cual se realizaron trabajos de.

- 1- excavación en diferentes tramos indicados en plano
- 2- se realizaron los trabajos de suministro e instalación de tubería según indicación de planos.
- 3- finalizados los trabajos de excavación se procede a la fundición de los fondos de los pozos al nivel que indican los perfiles

4-Después de instalar la tubería se procede a su protección lo cual se hace inmediatamente el relleno de los sangos, una vez determinada la altura de la tubería que va hacia las viviendas de los beneficiarios y se procede a la fundición de la loza con dimensiones de 70x70 cm. Y después de 3 días se procede al levantamiento de la acometida domiciliaria, la cual incluye un repello interno y externo y en el interior se procederá a dar la construcción de $\frac{1}{2}$ caña para conducir las aguas negras hacia la tubería principal, se la da también un pulido tipo pila para evitar filtraciones de las aguas negras hacia el exterior de las acometidas.

Avance del proyecto de Alcantarillado Sanitario en el mes de Diciembre del año 2,016

Actualmente hay un avance de 2,071.27 Metros lineales de instalación de Tubería que comprende excavación y colocación de la misma completamente terminada y hay 1,030 metros lineales solo de excavación en proceso para proceder posteriormente a la estación de tubería todo esto en diferentes diámetros.



Municipalidad de Jocon, Yoro

Tel 2433 – 40 23



Trabajando para el desarrollo del Municipio

Informe de actividades del mes de diciembre del año 2016

En el presente informe se describen las diferentes actividades ejecutadas por el departamento de DIMAJ, el cual se coordinaron con el Departamento de control tributario y personal de apoyo en el proyecto de alcantarillado sanitario primera etapa.

1 Se desarrollaron varios procesos en supervisión de: fundición de pozos sépticos, acometidas domiciliarias, pegado de ladrillos instalación de tubería de diferentes diámetros,



- 1- Se realizó el levantamiento de encuesta para los beneficiarios del proyecto de alcantarillado sanitario y se digitalizo.
- 2- Se hizo entrega de diferentes materiales para la ejecución del proyecto
- 3- Se le tomo asistencia al personal que labora para el proyecto diariamente
- 4- Se hizo entrega de aviso de cobro de servicios públicos en diferentes barrios y colonias de la Zona Urbana del Municipio a todas las personas que están morosos
- 5- Se ordenó y clasifíco por barrio y colonia cada abonado de servicios públicos y gracias a esa gestión se logró recaudar la cantidad Lps: 44,218.80

ANEXOS

Procesos y ejecución del proyecto de alcantarillado sanitario primera etapa.



Digitalización de encuesta de los beneficiarios del proyecto de alcantarillado sanitario primera etapa.

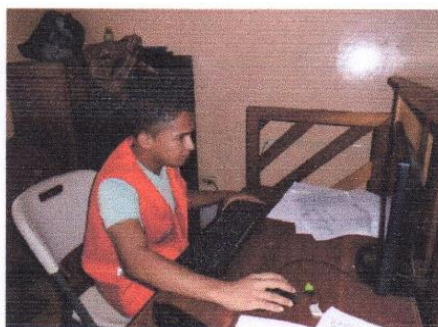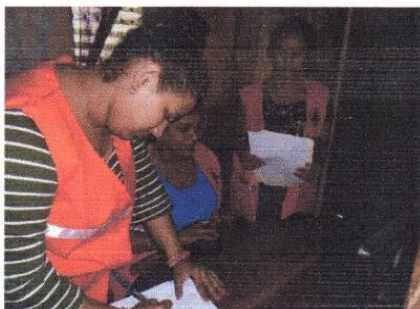

Carmen Castro
Coordinadora de DIMAJ
