



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009103

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Ruíz Ruíz

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento ochenta y cuatro mil ocho - (LPS. 184,841.97)
Cientos cuarenta y un tempiras con 97/100 centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Sector Educación	
1101005000005471	Remodelación de Escuela Manuel Bonilla	
101101108200710	de aldea Coraycito	
205	Ultimo pago del Proyecto Remodelación	
	Escuela Manuel Bonilla Comunidad de	
	Coraycito. Proyecto ejecutado con fon	
	dos del Programa Nacional de Interven	
	ción de Infraestructura Escolar del op.	
	bierno Central. Recibo n: 000-001-04	
	10000130 y cheque n: 84905837	L. 184,841.97
		L. 184,841.97

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 0231-22-10500-69

San José, Choluteco 20 septiembre año 2024



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

0601-1980-04414
N° DE IDENTIDAD

Recibo por Honorarios Profesionales

Delmer Orlando Núñez Núñez
Ingeniero Civil

Aldea El Chimbo, Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles
Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F. M.
Tel.: 3212-4626 | E-mail: delmerorlandonuneznunez@gmail.com

Por Lps. **184,841.97.**

Fecha: **20** de **Sep** de 20**24**

Recibí de: **ALCALDIA DE SAN JODE, CAHOTECA** R.T.N. **06019011443860**

La Cantidad de: **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DUELO CIENTOS CUARENTA Y UNO (184,841.97) TEMPORAL**

Por Cuenta de: **por pago final del 201. PROYECTO REMODELACION ESCUELA MANUEL BONILLA COMUNIDAD DE CAHOTECA**

Honorarios	Lps.	
Retención ISR	Lps.	
T. Neto Recibido	Lps.	

CAI: 1A2EC3-40247A-124293-9E8739-96D1FE-22
R.T.N.: 06011980044797

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº **000-001-04-00000130**



Tiraje del 000-001-04-00000200
Química 8/AZ
Fecha de Emisión: 06/11/2024

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077273/94967301

CHEQUE No. 84905837

SAN LORENZO, VALLE 20/septiembre/2024
Lugar y Fecha

Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Páguese a la orden de

L 184,841.97

Ciento ochenta y Cuatro mil ochocientos cuarenta y uno con 97/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente. S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0 1503079⑆00 115030009213⑆84905837



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCON5CC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

ESTIMACION N° 03



REMDELACIÓN DE ESCUELA MANUEL BONILLA (CORAYCITO), SAN JOSÉ - CHOLUTECA.

CODIGO:

DESCRIPCION: REMDELACIÓN DE BAÑO, REMDELACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE TECHO EN AULAS EXISTENTES, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE BALCONES Y VENTANAS, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.

Departamento: Choluteca

Municipio: San José

UBICACIÓN: ALDEA CORAYCITO
EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Periodo del: Del 29 julio al 10 de septiembre del 2024 (ESTIMACION III)
SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	
	Desmontaje de sanitarios	unidad	4	L. 265.99	L. 1,063.96	4.0	L. 1,063.96	-	L. -	4.0	L. 1,063.96	100%
	Desmontaje de techo incluye soportes de madera	m2	18	L. 212.91	L. 3,832.38	18.0	L. 3,832.38	-	L. -	18.0	L. 3,832.38	100%
	Remoción de óxido y repintado de puertas	m2	10.4	L. 212.91	L. 2,214.26	10.4	L. 2,214.26	-	L. -	10.4	L. 2,214.26	100%
	Suministro de estación de Inodoros	unidad	4	L. 5,122.79	L. 20,491.16	-	L. -	4.0	L. 20,491.16	4.0	L. 20,491.16	100%
	Instalación de canaletas para techo	ml	30	L. 389.74	L. 11,692.20	30.0	L. 11,692.20	-	L. -	30.0	L. 11,692.20	100%
	Instalación de techo	m2	18	L. 1,238.93	L. 22,300.74	18.0	L. 22,300.74	-	L. -	18.0	L. 22,300.74	100%
	Instalación de cerámica para exterior	m2	12	L. 765.30	L. 9,183.60	-	L. -	12.0	L. 9,183.60	12.0	L. 9,183.60	100%
	Picado y Resane de tanque	m2	2.5	L. 212.91	L. 532.28	2.5	L. 532.28	-	L. -	2.5	L. 532.28	100%
	Canal metálico para recolección de agua para tanque	ml	6.7	L. 1,014.00	L. 6,793.80	-	L. -	6.7	L. 6,793.80	6.7	L. 6,793.80	100%
	Instalación de tubería para conexión de techo a tanque de aguas lluvias de 4"	ml	8	L. 174.73	L. 1,397.84	-	L. -	8.0	L. 1,397.84	8.0	L. 1,397.84	100%
	Accesorios para conexión de techo a tanque 2 codos a 90°	unidad	2	L. 11.38	L. 22.76	-	L. -	2.0	L. 22.76	2.0	L. 22.76	100%
	Instalación de tapadera metálica de 0,7 x 0,7m	unidad	1	L. 2,059.40	L. 2,059.40	-	L. -	1.0	L. 2,059.40	1.0	L. 2,059.40	100%
	Instalación de pintura	m2	20	L. 100.50	L. 2,010.00	20.0	L. 2,010.00	-	L. -	20.0	L. 2,010.00	100%
	Desmontaje de techo	m2	215.76	L. 240.50	L. 51,890.28	215.8	L. 51,890.28	-	L. -	215.8	L. 51,890.28	100%
	Desmontaje de cerchas de madera	ml	30.9746	L. 212.91	L. 6,594.80	31.0	L. 6,594.80	-	L. -	31.0	L. 6,594.80	100%
	Desmontaje de balcones frontales de 2,85 x 1,7m	Unidad	5	L. 1,066.01	L. 5,330.05	5.0	L. 5,330.05	-	L. -	5.0	L. 5,330.05	100%
	Desmontaje de balcones frontales de 1,7 x 1,7m	Unidad	5	L. 676.00	L. 3,380.00	5.0	L. 3,380.00	-	L. -	5.0	L. 3,380.00	100%
	Desmontaje de puerta de 2,10 x 1,0m	Unidad	1	L. 728.01	L. 728.01	1.0	L. 728.01	-	L. -	1.0	L. 728.01	100%
	Instalación de cerchas	ml	25	L. 1,670.50	L. 41,762.50	25.0	L. 41,762.50	-	L. -	25.0	L. 41,762.50	100%
	Instalación de techo	m2	215.76	L. 1,015.00	L. 218,996.40	215.8	L. 218,996.40	-	L. -	215.8	L. 218,996.40	100%
	Fabricación e instalación de balcones frontales de 2,85 x 1,7m de tubo cuadrado de 1/2" con espaciamento a cada 0,10m	unidad	5	L. 9,360.00	L. 46,800.00	5.0	L. 46,800.00	-	L. -	5.0	L. 46,800.00	100%
	Fabricación e instalación de balcones frontales de 1,7 x 1,7m de tubo cuadrado de 1/2" con espaciamento a cada 0,10m	unidad	5	L. 7,020.00	L. 35,100.00	5.0	L. 35,100.00	-	L. -	5.0	L. 35,100.00	100%
	Instalación de malla metálica a balcones	m2	37.74	L. 935.44	L. 35,303.51	37.7	L. 35,303.51	-	L. -	37.7	L. 35,303.51	100%
	Remoción de óxido y repintado de puertas	m2	11.8	L. 212.91	L. 2,512.34	11.8	L. 2,512.34	-	L. -	11.8	L. 2,512.34	100%
	Remoción de óxido y repintado de balcones traseros	m2	5	L. 212.91	L. 1,064.55	5.0	L. 1,064.55	-	L. -	5.0	L. 1,064.55	100%
	Colocación de pintura	m2	786	L. 97.18	L. 76,383.48	-	L. -	786.0	L. 76,383.48	786.0	L. 76,383.48	100%
	Instalaciones eléctricas	ml	115.8	L. 2,298.96	L. 266,219.57	95.0	L. 218,401.20	20.8	L. 47,818.37	115.8	L. 266,219.57	100%
	Instalación de luces led	unidad	12	L. 1,338.66	L. 16,063.92	12.0	L. 16,063.92	-	L. -	12.0	L. 16,063.92	100%
	Instalación de tomacorrientes	unidad	6	L. 1,660.18	L. 9,961.08	3.0	L. 4,980.54	3.0	L. 4,980.54	6.0	L. 9,961.08	100%
	Suministro de rótulo de identificación del proyecto	unidad	1	L. 7,200.00	L. 7,200.00	1.0	L. 7,200.00	-	L. -	1.0	L. 7,200.00	100%
	Placa conmemorativa del proyecto	unidad	1	L. 15,325.00	L. 15,325.00	-	L. -	1.0	L. 15,325.00	1.0	L. 15,325.00	100%
TOTAL						L. 924,209.86		L. 739,753.91		L. 184,455.95		L. 924,209.86

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L.	924,209.86
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 3 (100%)	L.	924,209.86
ACUMULADO	L.	924,209.86
MONTO POR ESTIMAR	L.	-
RETENCIÓN POR I.S.R	L.	-
PAGO DEL 80%	L.	739,367.89
TOTAL A RECIBIR	L.	184,841.97

Nombre: Delmer Orlando Nuñez Nuñez
Firma: [Firma]
Fecha: 10 de septiembre de 2024



Nombre: Maichol Ricardo Oliva
Firma: [Firma]
Fecha: 10 de septiembre de 2024



Nombre: Nahum Lombardo
Firma: [Firma]
Fecha: 10 de septiembre de 2024



CARTA DE GARANTÍA BANCARIA
VALOR L (46,210.50)



No. 39

Tegucigalpa, M.D.C 20 de septiembre de 2024

Vcto: 20/09/2025

Beneficiario: **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA**

Garantizado: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A., con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, otorga la presente Garantía Bancaria a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA** Y por cuenta de la **SR DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ** actuando en su condición REPRESENTANTE DE SI MISMO por un monto de **CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CTVS (L46,210.50)** CON EL OBJETO DE GARANTIZAR CALIDAD DE OBRA DE CONTRATO DE PROYECTO REMODELACION ESCUELA MANUEL BONILLA, COMUNIDAD DE CORAYCITO, SAN JOSE, CHOLUTECA.

Esta **Garantía Bancaria** tendrá una vigencia de doce meses (12) a partir del veinte (20) de septiembre de dos mil veinte cuatro (2024) al veinte (20) de septiembre de dos mil veinte y cinco (2025), el plazo podrá extenderse hasta 12 meses de acuerdo al avance del proyecto; cualquier reclamo deberá ser presentado en esta fecha hasta las 4:00 pm, fecha en que vence toda nuestra responsabilidad de pago.

La presente garantía será ejecutada a simple requiriendo de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA**

Sin más trámite que la presentación de este documento acompañado de la carta de incumplimiento del beneficiario.

Todo reclamo deberá ser realizado dentro del periodo de vigencia establecido por la presente garantía, transcurrido dicho plazo se extinguirán todas las obligaciones contraídas por **BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A** Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez y nueve (19) días de septiembre del año dos mil veinte cuatro (2024)

Firma autorizada

Firma autorizada

DIRECCION BLV SUYAPA, AVENIDA JUAN CARLOS, ANTIGUO EDIFICIO TIGO MDC



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	REMODELACIÓN DE ESCUELA MANUEL BONILLA (CORAYCITO), SAN JOSÉ - CHOLUTECA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO EL CENTRO, ALDEA CORAYCITO.		
MODALIDAD EJECUCION	LICITACION PRIVADA	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVO.		
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE FINALIZACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS		
MÓDULO DE BAÑOS		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Desmontaje de sanitarios	unidad	4
Desmontaje de techo incluye soportes de madera	m ²	18
Remoción de óxido y repintado de puertas	m ²	10.4
Suministro de estación de Inodoros	unidad	4
Instalación de canaletas para techo	ml	30
Instalación de techo	m ²	18
Instalación de cerámica para exterior	m ²	12
TANQUE ELEVADO		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Picado y Resane de tanque	m ²	2.5
Canal metálico para recolección de agua para tanque	ml	6.7
Instalación de tubería para conexión de techo a tanque de aguas lluvias de 4"	ml	8
Accesorios para conexión de techo a tanque 2 codos a 90°	unidad	2
Instalación de tapadera metálica de 0,7 x 0,7m	unidad	1
Instalación de pintura	m ²	20
MÓDULO DE AULAS		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Desmontaje de techo	m ²	215.76






MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



Desmontaje de cerchas de madera	ml	30.97
Desmontaje de balcones frontales de 2,85 x 1,7m	unidad	5
Desmontaje de balcones frontales de 1,7 x 1,7m	unidad	5
Desmontaje de puerta de 2,10 x 1,0m	unidad	1
Instalación de cerchas	ml	25
Instalación de techo	m ²	215.76
Fabricación e instalación de balcones frontales de 2,85 x 1,7m de tubo cuadrado de 1/2" con espaciamento a cada 0,10m	unidad	5
Fabricación e instalación de balcones frontales de 1,7 x 1,7m de tubo cuadrado de 1/2" con espaciamento a cada 0,10m	unidad	5
Instalación de malla metálica a balcones	m ²	37.74
Remoción de óxido y repintado de puertas	m ²	11.8
Remoción de óxido y repintado de balcones traseros	m ²	5
Colocación de pintura	m ²	786
Instalaciones eléctricas	ml	115.8
Instalación de luces led	unidad	12
Instalación de tomacorrientes	unidad	6
Suministro de rótulo de identificación del proyecto	unidad	1
Placa conmemorativa del proyecto	unidad	1

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE ESCUELA MANUEL BONILLA (CORAYCITO), SAN JOSÉ - CHOLUTECA

ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada
 CONTRATISTA	 ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSÉ
 TESTIGO COMISIONADO MUNICIPAL SAN JOSÉ CHOLUTECA	 TESTIGO  SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SAN JOSÉ
 SOCIEDAD CIVIL	

2024

Informe Final de obra Escuela Manuel Bonilla, comunidad de Coraycito

EJECUTOR ING ORLANDO NUÑEZ



NTECEDENTES

En atención a la SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN PLANTELES EDUCATIVOS (ANEXO CE-01) recibida por parte de las autoridades responsables del proceso de descentralización en el marco del "PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE)" se realiza el cruce de información entre la Priorización de Centros Educativos emitidos por la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), como ente rector del proceso, en su Plan Maestro y las autoridades responsables tales como Técnicos Municipales, Directores de las Mancomunidades del país, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Directores de los Centros Educativos priorizados y Docentes es que el Centro Educativo Manuel Bonilla , coraycito queda priorizado para su intervención REUNIENDO LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A ÍNDICES DE PRECARIEDAD.

Obra a ejecutar

Repacion de escuela Manuel Bonilla comunidad de Coraycito, cambios de estructuras metálicas, instalación de techo, resane de módulo de baños y tanque de reserva instalación de baños, pintura en módulos

Tiempo ejecución

90 días



Avances en este periodo

Existe un avance del 100 % de obra contractual en el periodo del 24 de de julio al 10 de septiembre del 2024

Instalación de estructura de techos y canaletas lamina aluzim

Instalación de sistema eléctrico completo

Pintura module 1, 2, 3 kínder baños

Resane y pintado de tanque de reserva

Instalación de baños

Instalación de balcones y malla desplegable

Resane de puertas y pintado




San José, Choluteca

20 de septiembre del 2024

Alcalde municipal

Nahúm Zambrano su oficina

Por medio de la presente deseando éxitos en sus funciones diarias, hago formal solicitud de desembolso del 20% pago final del proyecto reparación escuela Manuel Bonilla, comunidad de Coraycito por un monto de ciento ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y uno con noventa y siete ctvs. 184,841.97 acuerdo a avance de obra.




Delmer Orlando Núñez Núñez

Contratista

INFORME FINAL

ESCUELA MANUEL BONILLA,

COMUNIDAD DE CARAYCITO,

SAN JOSE CHOLUTECA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS



Instalaciones eléctricas



Instalaciones eléctricas



Instalaciones eléctricas



Instalaciones eléctricas

PINTURAS AULAS 1,2,3 Y BAÑOS



Pinturas aulas 1,2,3 y baños



Pinturas aulas 1,2,3 y baños



Pinturas aulas 1,2,3 y baños



Pinturas aulas 1,2,3 y baños



Pinturas aulas 1,2,3 y baños




Pinturas aulas 1,2,3 y baños



Pinturas aulas 1,2,3 y baños



Pinturas aulas 1,2,3 y baños

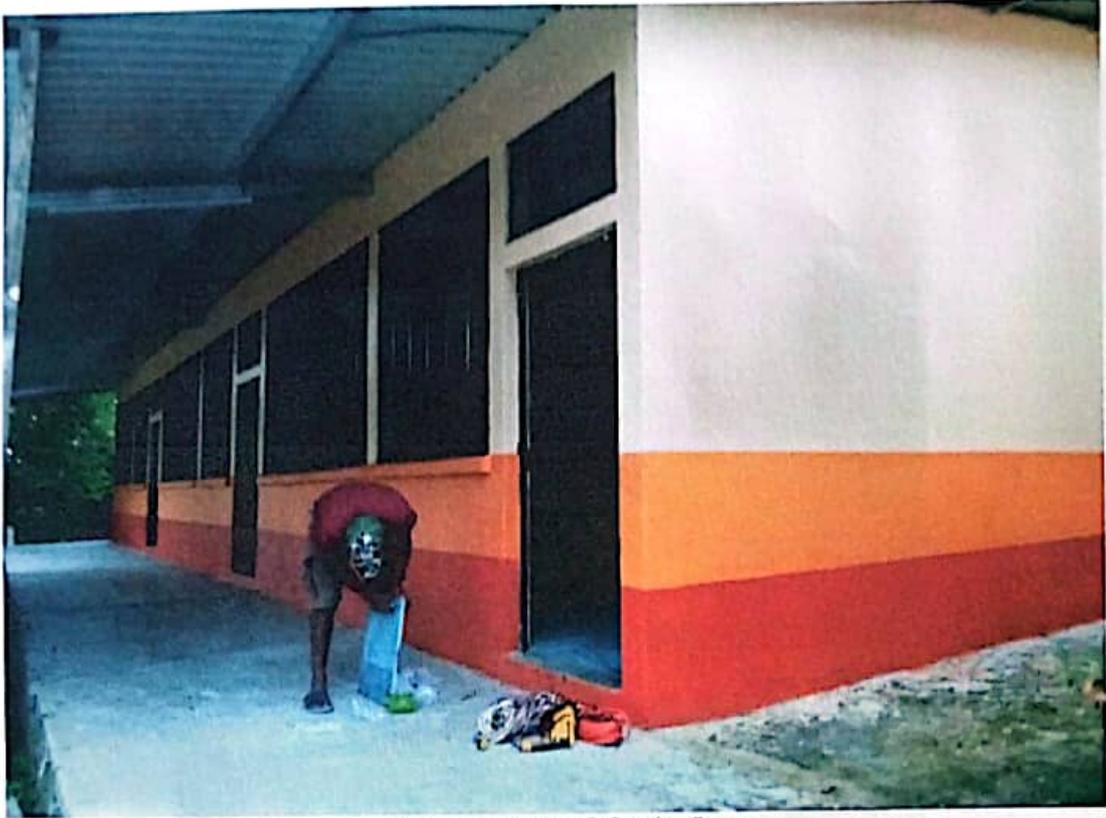

Pinturas aulas 1,2,3 y baños

INSTALACIÓN DE CANALES Y BAÑOS



Instalación de canales y baños



Instalación de canales y baños

INSTALACIÓN DE PLACA DISTINTIVA



Instalación de placa distintiva



Instalación de placa distintiva



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009102

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento sesenta y cuatro mil quinientas cinco lempiras con 28/100 centavos (LPS. 164,505.28)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Sector Educación	
1101 006 000 006 411	Remodelación de Escuela Ramón Rosa	
10 11-011-04 20 0710	de aldea La Cruzita	
206		
	Ultimo pago del Proyecto Remodelación de la Escuela Ramón Rosa, La Cruzita Ejecutado con fondo del Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar gobierno central. Con n° Recibo 000-001-04-00000127 y che que n° 84905836	L. 164,505.28
		5
		L. 164,505.28

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

FECHA: San José, Choluteca 20 septiembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL INTERESADO

2001-1980-04434
N° DE IDENTIDAD

Recibo por Honorarios Profesionales

Delmer Orlando Núñez Núñez

Ingeniero Civil

Aldea El Chimbo, Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles
Contiguo a Pulpería Reina, Santa Lucía, F. M.
Tel.: 3212-4626 | E-mail: delmerorlandonuneznunez@gmail.com

Por Lps. **164,505.28**

Fecha: 20 de septiembre de 2024

Recibí de: ALCALDIA DE SAN JOSE CABO TELGA. R.T.N. Nº 1901144386

La Cantidad de: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO. Lempiras

Por Cuenta de: CON VEINTIOCHO LPS
por el 2º y 3º proyecto de remodelación escuela
RAMON ROSA, LA CAJUTA, PABLO PINOL.

Tiraje del 000-001-04-00000181 al 000-001-04-00000200
Química 8/AZ

Honorarios Lps.		
Retención ISR Lps.		
T. Neto Recibido Lps.		

CAI: 1A2EC3-40247A-124293-9E8739-96D1FE-22
R.T.N.: 06011980044797

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000-001-04-00000127



Fecha de Emisión: 06/11/2024

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94987301

CHEQUE No. 84905836

SAN LORENZO, VALLE 20 / Septiembre / 2024
Lugar y Fecha

Delmer Orlando Yunez Yunez L 164,505.28
Páguese a la orden de

Ciento sesenta y cuatro mil quinientos cinco con 28/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆1⑆50300092⑆3⑆84905836

San José, Choluteca, Honduras, S.A. de C.V.



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CARTA DE GARANTÍA BANCARIA

VALOR L (41,127.00)



No. 40

Tegucigalpa, M.D.C 20 de septiembre de 2024

Vcto: 20/09/2025

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA

Garantizado: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A., con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, otorga la presente Garantía Bancaria a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA** Y por cuenta de la **SR DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ** actuando en su condición **REPRESENTANTE DE SI MISMO** por un monto de **CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTI SIETE CON CERO CTVS (L41,127.00)** CON EL OBJETO DE **GARANTIZAR CALIDAD DE OBRA DE CONTRATO DE PROYECTO REMODELACION ESCUELA RAMON ROSA, COMUNIDAD DE LA CRUCITA, SAN JOSE, CHOLUTECA.**

Esta **Garantía Bancaria** tendrá una vigencia de doce meses (12) a partir del veinte (20) de septiembre de dos mil veinte cuatro (2024) al veinte (20) de septiembre de dos mil veinte y cinco (2025), el plazo podrá extenderse hasta 12 meses de acuerdo al avance del proyecto; cualquier reclamo deberá ser presentado en esta fecha hasta las 4:00 pm, fecha en que vence toda nuestra responsabilidad de pago.

La presente garantía será ejecutada a simple requiriendo de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA**

Sin más trámite que la presentación de este documento acompañado de la carta de incumplimiento del beneficiario.

Todo reclamo deberá ser realizado dentro del periodo de vigencia establecido por la presente garantía, transcurrido dicho plazo se extinguirán todas las obligaciones contraídas por **BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A** Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez y nueve (19) días de septiembre del año dos mil veinte cuatro (2024)


Firma autorizada


Firma autorizada

DIRECCION BLV SUYAPA, AVENIDA JUAN CARLOS, ANTIGUO EDIFICIO TIGO MDC

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

ESTIMACION N° 03

REMODELACIÓN DE ESCUELA RAMÓN ROSA (LA CRUCITA), SAN JOSÉ - CHOLUTECA.

CODIGO: REMODELACIÓN DE BAÑOS, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE TECHO EN AULAS EXISTENTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, FIRME DE CONCRETO, DESMONTAJE Y FABRICACIÓN DE BALCONES, PINTURA EN AULAS EXISTENTES, REMODELACIÓN DE CERCO PERIMETRAL. **Departamento:** Choluteca
UBICACIÓN: ALDEA LA CRUCITA **Municipio:** San José
EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ **Periodo del:** Del 29 julio al 10 de septiembre del 2024 (ESTIMACION III)
SUPERVISOR: Ing. Maicol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	
1	Desmontaje de techo	m²	15	L. 247.75	L. 3,716.25	15	3716.25	-	L. -	15.0	L. 3,716.25	100%
2	Desmontaje de estructura de madera	m	20	L. 247.01	L. 4,940.20	20	4940.2	-	L. -	20.0	L. 4,940.20	100%
3	Remoción de óxido y repintado de puertas	m²	15	L. 799.50	L. 11,992.50	15	11992.5	-	L. -	15.0	L. 11,992.50	100%
4	Instalación de canaletas para techo de 4x2	m	20	L. 566.80	L. 11,336.00	20	11336	-	L. -	20.0	L. 11,336.00	100%
5	Instalación de techo	m²	30	L. 1,332.45	L. 39,973.50	30	39973.5	-	L. -	30.0	L. 39,973.50	100%
6	Instalación de pintura	m²	130	L. 143.65	L. 18,674.50	0	0	130.0	L. 18,674.50	130.0	L. 18,674.50	100%
7	Instalación de tubo de 4x4 para techo de pila	m	15	L. 490.75	L. 7,361.25	0	0	15.0	L. 7,361.25	15.0	L. 7,361.25	100%
8	Instalación de canaletas para techo de pila de 4x2	m	16	L. 566.80	L. 9,068.80	0	0	16.0	L. 9,068.80	16.0	L. 9,068.80	100%
9	Instalación de techo de pila	m²	8	L. 1,332.45	L. 10,659.60	0	0	8.0	L. 10,659.60	8.0	L. 10,659.60	100%
10	Desmontaje de techo	m²	76.25	L. 212.91	L. 16,234.39	76.25	16234.3875	-	L. -	76.3	L. 16,234.39	100%
11	Desmontaje de estructura de madera	m	136	L. 212.91	L. 28,955.76	136	28955.76	-	L. -	136.0	L. 28,955.76	100%
12	Desmontaje de balcones de 1x2,3	unidad	2	L. 2,496.01	L. 4,992.02	2	4992.02	-	L. -	2.0	L. 4,992.02	100%
13	Desmontaje de balcones de 0,5x2,3	unidad	2	L. 1,605.50	L. 3,211.00	2	3211	-	L. -	2.0	L. 3,211.00	100%
14	Demolición de acera	m²	65	L. 212.91	L. 13,839.15	65	13839.15	-	L. -	65.0	L. 13,839.15	100%
15	Remoción de óxido y repintado de puertas y balcones	m²	45	L. 689.00	L. 31,005.00	45	31005	-	L. -	45.0	L. 31,005.00	100%
16	Instalación de canaletas de 4x2	m	150	L. 523.90	L. 78,585.00	150	78585	-	L. -	150.0	L. 78,585.00	100%
17	Instalación de techo	m²	175	L. 1,088.04	L. 190,407.00	175	190407	-	L. -	175.0	L. 190,407.00	100%
18	Instalación de rosetas para luz	unidad	8	L. 1,338.66	L. 10,709.28	8	10709.28	-	L. -	8.0	L. 10,709.28	100%
19	Instalación de interruptores dobles	unidad	2	L. 925.95	L. 1,851.90	2	1851.9	-	L. -	2.0	L. 1,851.90	100%
20	Instalación de tomacorrientes	unidad	4	L. 1,660.18	L. 6,640.72	4	6640.72	-	L. -	4.0	L. 6,640.72	100%
21	Fabricación e instalación de balcones de 1x2,3 con tubos de	unidad	2	L. 10,140.00	L. 20,280.00	2	20280	-	L. -	2.0	L. 20,280.00	100%
22	Fabricación e instalación de balcones de 0,5x2,3 con tubos de	unidad	2	L. 7,280.00	L. 14,560.00	2	14560	-	L. -	2.0	L. 14,560.00	100%
23	Fundición de firme de concreto de e=0,1	m²	65	L. 1,223.07	L. 79,499.55	65	79499.55	-	L. -	65.0	L. 79,499.55	100%
24	Instalación de pintura	m²	920	L. 148.33	L. 136,463.60	250	37082.5	670.0	L. 99,381.10	920.0	L. 136,463.60	100%
25	Demolición de 1 línea de bloque 6	m²	3	L. 212.91	L. 638.73	3	638.73	-	L. -	3.0	L. 638.73	100%
26	Desmontaje de portón de 3x2,1	unidad	1	L. 212.91	L. 212.91	1	212.91	-	L. -	1.0	L. 212.91	100%
27	Instalación de 1 línea de bloque de 6	m²	3	L. 707.82	L. 2,123.46	3	2123.46	-	L. -	3.0	L. 2,123.46	100%
28	Fundición de solera de 15 cm de ancho y e=0,05 que unirá la	ml	15	L. 421.29	L. 6,319.35	15	6319.35	-	L. -	15.0	L. 6,319.35	100%
29	Fabricación e instalación de portón de acceso de 3x2,1	unidad	1	L. 35,750.00	L. 35,750.00	1	35750	-	L. -	1.0	L. 35,750.00	100%
30	Suministro de rótulo de identificación del proyecto	unidad	1	L. 7,200.00	L. 7,200.00	1	7200	-	L. -	1.0	L. 7,200.00	100%
31	Placa conmemorativa del proyecto	unidad	1	L. 15,325.00	L. 15,325.00	0	0	1.0	L. 15,325.00	1.0	L. 15,325.00	100%
TOTAL					L. 822,526.42		L. 662,056.17		L. 160,470.25		L. 822,526.42	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L.	822,526.42
TOTAL DE ESTIMACIÓN N° 3 (100%)	L.	822,526.42
ACUMULADO	L.	822,526.42
MONTO POR ESTIMAR	L.	-
RETENCIÓN POR I.S.R	L.	-
PAGO DEL 80%	L.	658,021.13
TOTAL A RECIBIR	L.	164,505.28

CONTRACTO N° 10-2024
 Nombre: Delmer Orlando Nuñez Nuñez
 Firma: [Firma]
 Fecha: 10 de septiembre de 2024

SUPERVISOR
 Nombre: Maicol Ricardo Oliva
 Firma: [Firma]
 Fecha: 10 de septiembre de 2024

ALCALDE MUNICIPAL
 Nombre: Mahon Lamberto
 Firma: [Firma]
 Fecha: 10 de septiembre de 2024



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	REMODELACIÓN DE ESCUELA RAMÓN ROSA (LA CRUCITA), SAN JOSÉ - CHOLUTECA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA CRUCITA		
MODALIDAD EJECUSION	LICITACION PRIVADA	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVO.		
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE FINALIZACION	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

RESULTADOS ALCANZADOS		
MÓDULO DE BAÑOS		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Desmontaje de techo	m ²	15
Desmontaje de estructura de madera	m	20
Remoción de óxido y repintado de puertas	m ²	15
Instalación de canaletas para techo de 4x2	m	20
Instalación de techo	m ²	30
Instalación de pintura	m ²	130
Instalación de tubo de 4x4 para techo de pila	m	15
Instalación de canaletas para techo de pila de 4x2	m	16
Instalación de techo de pila	m ²	8
MÓDULO DE AULAS		
Desmontaje de techo	m ²	76.25
Desmontaje de estructura de madera	m	136
Desmontaje de balcones de 1x2,3	unidad	2
Desmontaje de balcones de 0,5x2,3	unidad	2
Demolición de acera	m ²	65
Remoción de óxido y repintado de puertas y balcones	m ²	45
Instalación de canaletas de 4x2	m	150
Instalación de techo	m ²	175
Instalación de rosetas para luz	unidad	8
Instalación de interruptores dobles	unidad	2
Instalación de tomacorrientes	unidad	4



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info**



Fabricación e Instalación de balcones de 1x2,3 con tubos de 1/2 y espaclamiento de 0,1	unidad	2
Fabricación e Instalación de balcones de 0,5x2,3 con tubos de 1/2 y espaciamiento de 0,1	unidad	2
Fundición de firme de concreto de e=0,1	m ²	65
Instalación de pintura	m ²	920
CERCO PERIMETRAL		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Demolición de 1 línea de bloque 6	m ²	3
Desmontaje de portón de 3x2,1	unidad	1
Instalación de 1 línea de bloque de 6	m ²	3
Fundición de solera de 15 cm de ancho y e=0,05 que unirá la malla ciclón y el bloque	ml	15
Fabricación e instalación de portón de acceso de 3x2,1	unidad	1
Suministro de rótulo de identificación del proyecto	unidad	1
Placa conmemorativa del proyecto	unidad	1

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE ESCUELA RAMÓN ROSA (LA CRUCITA), SAN JOSÉ - CHOLUTECA

ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada
 CONTRATISTA	 ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
 TESTIGO SOCIEDAD CIVIL	TESTIGO SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SAN JOSE

2024

Informe Final escuela Ramón Rosa, comunidad de crucitas

EJECUTOR ING ORLANDO NUÑEZ



ANTECEDENTES

En atención a la SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN PLANTELES EDUCATIVOS (ANEXO CE-01) recibida por parte de las autoridades responsables del proceso de descentralización en el marco del "PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE)" se realiza el cruce de información entre la Priorización de Centros Educativos emitidos por la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), como ente rector del proceso, en su Plan Maestro y las autoridades responsables tales como Técnicos Municipales, Directores de las Mancomunidades del país, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Directores de los Centros Educativos priorizados y Docentes es que el Centro Educativo Ramón Rosa , la crucita queda priorizado para su intervención REUNIENDO LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A ÍNDICES DE PRECARIEDAD.

Obra a ejecutar

Repacion de escuela ramón rosa, comunidad de la crucita, cambios de estructuras metálicas, construcción de muro perimetral, repacion módulo de baños, pintura en módulos, instalaciones eléctricas aula 3 y kínder

Tiempo ejecución

90 días



Avances en este periodo

Existe un avance del 100 % de obra contractual en el periodo del 24 de julio al 10 de septiembre 2024

Instalación de techo aula kínder

Instalación de canaleta 2x4 aulas 3

Instalación de láminas aluzim cla 28 rojo

175 ml y aula kínder

Construcción gradas acceso

Construcción de acera 90 m2 10cm

Instalación de techos módulo de baños

Pintura kínder, aulas 1 2 3

Aulas 3

Módulo de baños

Instalación de balcones

Pintado de puertas y balcones existentes

Sistema eléctrico kínder lámparas led, toma corrientes 4, interruptores



Sistema eléctrico aula 3, lámparas led, interruptores

Módulo de baños, rosetas y focos led

Con estas actividades se registra el 100 % de obra contratada



San José, Choluteca

20 de septiembre del 2024

Alcalde municipal

Nahúm Zambrano su oficina

Por medio de la presente deseando éxitos en sus funciones diarias, hago formal solicitud de desembolso del 20 % del proyecto reparación escuela ramón rosa, comunidad de crucitas, correspondiente al pago final por unos montos de ciento sesenta y cuatro mil quinientos cinco con veinte y ocho ctvs. (164,505.28) de acuerdo a final de obra.

Delmer Orlando Muñoz Nuñez
Contratista



INFORME FINAL

ESCUELA RAMÓN ROSA,

COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS

SAN JOSÉ CHOLUTECA

INSTALACIONES ELÉCTRICAS



Instalaciones eléctricas



Instalaciones eléctricas



Instalaciones eléctricas



Instalaciones eléctricas

PINTURA AULAS 1,2,3,4 KÍNDER



Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder




Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder




Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder



Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder

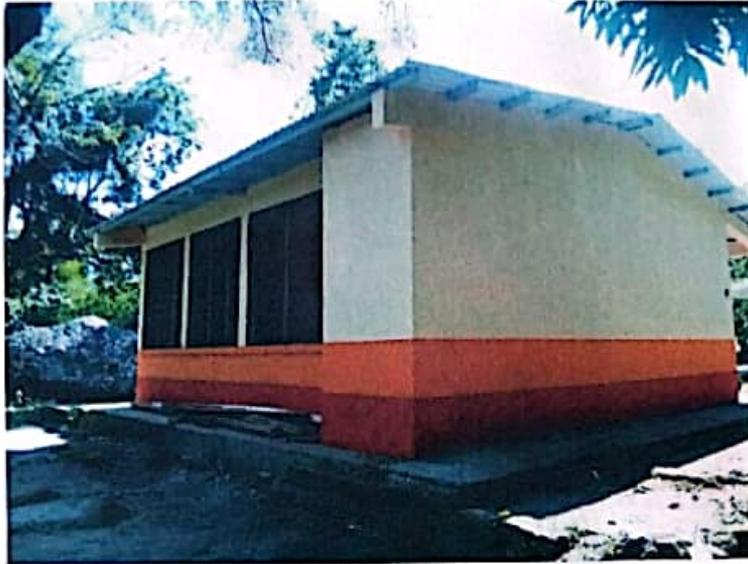

Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder

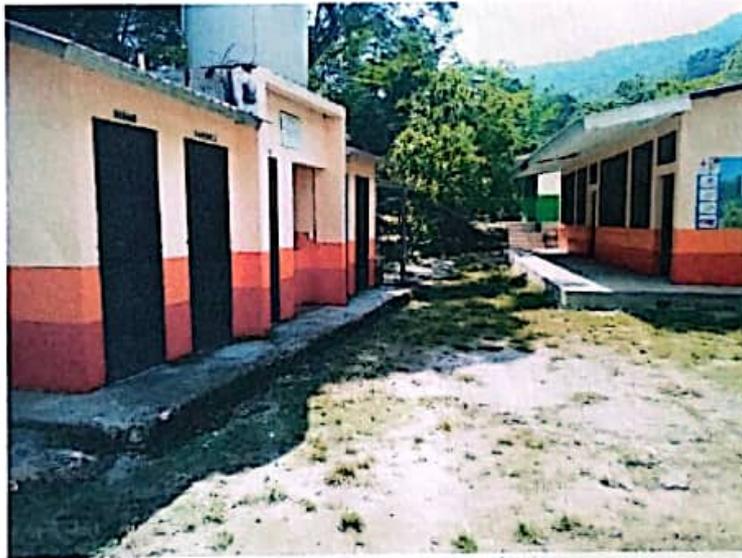

Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder



Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder




Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder



Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder



Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder

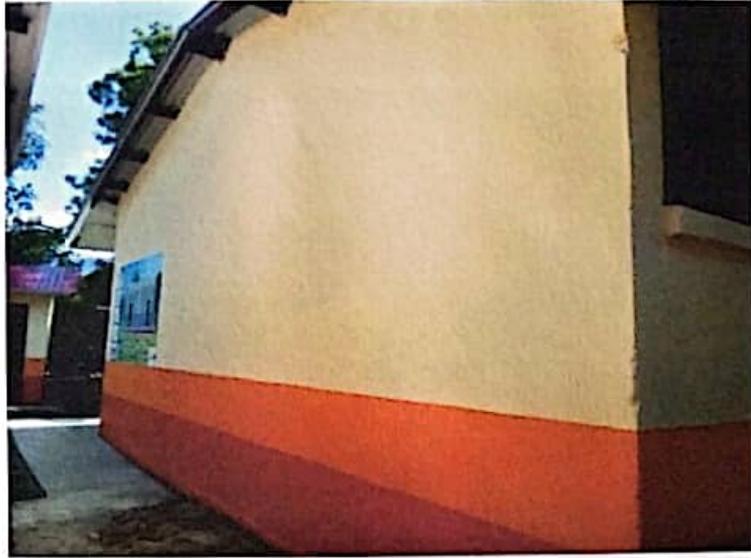

Pintura aulas 1,2,3,4 Kínder

ACERAS



Aceras



Aceras



Aceras



Aceras



Aceras




Aceras

GALERA Y PORTÓN DE ACCESO



Galera y portón de acceso

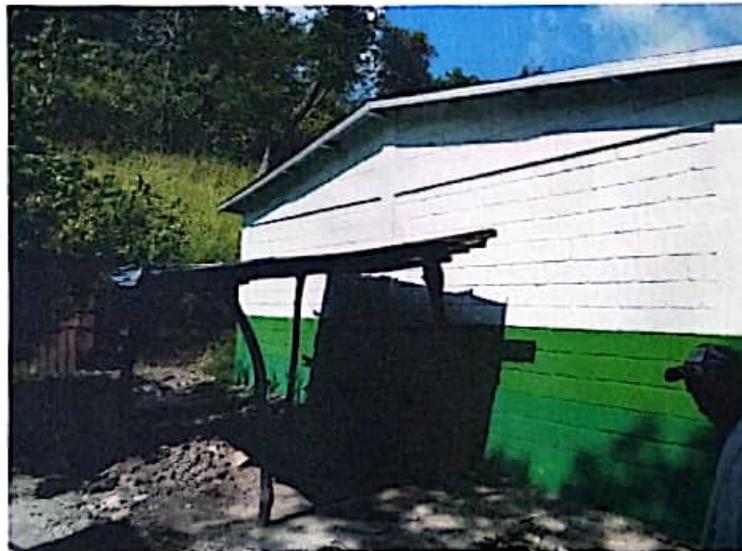

Galera y portón de acceso



Galera y portón de acceso



Galera y portón de acceso

PLACA DISTINTIVA



Placa distintiva



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009143

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Docientos veintionmil ochocientos (LPS. 221,826.70)
veintiseis centavos con 70/100 centavos

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO	11	PROGRAMA	11	ACTIVIDAD	01	PROYECTO	
CODIGO		CODIGO		CODIGO		CODIGO	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Sector Educación	
1101 004 000 004 47110	Remodelación De escuela Ramón Rosa de aldea	
11-011-08 200710 204	Macuelizo	
	Ultimo pago del Proyecto de Remodela- ción Escuela Ramón Rosa de aldea Ma- cuelizo, Proyecto Escuelas Programa Nacional de Intervención de Infraestr- cturas Escolares SEFIN fondos del go- bierno Central. Recibo n° 000-001-04-0000 0131 y cheque n° 8490.5886	L. 221,826.70
		5
		L. 221,826.70

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2751-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 27 septiembre año 2024



FIRMA DEL TESORERO



FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL



FIRMA DEL INTERESADO

001-1980-00474
N° DE IDENTIDAD

Recibo por Honorarios Profesionales

Delmer Orlando Núñez Núñez

Ingeniero Civil

Por Lps. **221,826.70**

Aldea El Chimbo, Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles
Contiguo a Pulpería Reina, Santa Lucía, F. M.
Tel.: 3212-4626 | E-mail: delmerorlandonuneznunez@gmail.com

Fecha: 27 de Sep de 2024

Recibí de: Municipalidad de San José, Uti-UTELA R.T.N. 06019011443560

La Cantidad de: Docecientos veintiseis mil ochocientos veintiseis Lempiras

Por Cuenta de: para el proyecto Reparación escuela. Zonon Roba
Aldea Mpluchito.

Tiraje del 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000200
Químicos B/AZ

Honorarios	Lps.	
Retención ISR	Lps.	
T. Neto Recibido	Lps.	

CAI: 1A2EC3-40247A-124293-9E8739-96D1FE-22
R.T.N.: 06011980044797
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000-001-04-00000131



Fecha Válida de Emisión: 06/11/2024

11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO-SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/34567301

CHEQUE No. 84905886

SAN LORENZO, VALLE 27/septiembre/2024
Lugar y Fecha

Delmer Orlando Yunez Yunez L 221,826.70
Páguese a la orden de

Doscientos veintium mil ochocientos veintiseis con 70/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Diego E.

⑆0⑆50⑆30⑆79⑆00⑆⑆50⑆3000⑆92⑆13⑆⑆84905886



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**

con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

CONSCCCONSCC/75/59



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CARTA DE GARANTÍA BANCARIA

VALOR L (55,457.00)



No41

Tegucigalpa, M.D.C 20 de septiembre de 2024

Vcto: 20/09/2025

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA

Garantizado: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A., con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, otorga la presente Garantía Bancaria a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA** Y por cuenta de la **SR DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ** actuando en su condición **REPRESENTANTE DE SI MISMO** por un monto de **CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00 CTVS (L55,457.00)** CON EL OBJETO DE **GARANTIZAR CALIDAD DE OBRA DE CONTRATO DE PROYECTO REMODELACION ESCUELA RAMON ROSA, COMUNIDAD DE MACUELIZO, SAN JOSE, CHOLUTECA.**

Esta **Garantía Bancaria** tendrá una vigencia de doce meses (12) a partir del veinte (20) de septiembre de dos mil veinte cuatro (2024) al veinte (20) de septiembre de dos mil veinte y cinco (2025), el plazo podrá extenderse hasta 12 meses de acuerdo al avance del proyecto; cualquier reclamo deberá ser presentado en esta fecha hasta las 4:00 pm, fecha en que vence toda nuestra responsabilidad de pago.

La presente garantía será ejecutada a simple requiriendo de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA**

Sin más trámite que la presentación de este documento acompañado de la carta de incumplimiento del beneficiario.

Todo reclamo deberá ser realizado dentro del periodo de vigencia establecido por la presente garantía, transcurrido dicho plazo se extinguirán todas las obligaciones contraídas por **BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A** Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez y nueve (19) días de septiembre del año dos mil veinte cuatro (2024)

Firma autorizada

Firma autorizada

DIRECCION BLV SUYAPA, AVENIDA JUAN CARLOS, ANTIGUO EDIFICIO TIGO MDC

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

ESTIMACION N° 03

REMODELACIÓN DE ESCUELA RAMÓN ROSA (MACUELIZO), SAN JOSÉ - CHOLUTECA

CODIGO:

Departamento: Choluteca

DESCRIPCION: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE BALCONES, DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS, PINTURA EN AULAS EXISTENTES, INSTALACIÓN DE PISO TERRAZO, CERCO PERIMETRAL.

Municipio: San José

UBICACIÓN: ALDEA MACUELIZO

Periodo del: Del 29 julio al 25 de septiembre del 2024 (ESTIMACION III)

EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO			EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	
1	Desmontaje de techo (Incluye canaletas de 4x2)	m²	3.3	L. 300.00	L. 990.00	3.3	L. 990.00	-	L. -	3.3	L. 990.00	100%
2	Desmontaje de puertas (de 0,86x2,07m)	unidad	3	L. 800.00	L. 2,400.00	3.0	L. 2,400.00	-	L. -	3.0	L. 2,400.00	100%
3	Demolición de paredes	m²	12.73	L. 300.00	L. 3,819.00	12.7	L. 3,819.00	-	L. -	12.7	L. 3,819.00	100%
4	Desmontaje de sanitarios	unidad	3	L. 500.00	L. 1,500.00	3.0	L. 1,500.00	-	L. -	3.0	L. 1,500.00	100%
5	Demolición de piso	m²	3.5	L. 208.00	L. 728.00	3.5	L. 728.00	-	L. -	3.5	L. 728.00	100%
6	Excavación para fosa séptica	m³	36	L. 605.00	L. 21,780.00	36.0	L. 21,780.00	-	L. -	36.0	L. 21,780.00	100%
7	Excavación para construcción de baños y pila	m³	5	L. 2,000.00	L. 10,000.00	5.0	L. 10,000.00	-	L. -	5.0	L. 10,000.00	100%
8	Fundición de columnas de 0,10x0,10m (incluye armado, encofrado y fundición)	ml	25	L. 870.92	L. 21,773.00	25.0	L. 21,773.00	-	L. -	25.0	L. 21,773.00	100%
9	Construcción de paredes con bloques de 5	m²	12.73	L. 800.00	L. 10,184.00	12.7	L. 10,184.00	-	L. -	12.7	L. 10,184.00	100%
10	Fundición de firme de concreto para sanitarios (e=0,10m)	m²	15	L. 1,095.30	L. 16,429.50	15.0	L. 16,429.50	-	L. -	15.0	L. 16,429.50	100%
11	Fundición de firme de concreto para fosa séptica (e=0,10m) tapadera	m²	45	L. 1,095.30	L. 49,288.50	45.0	L. 49,288.50	-	L. -	45.0	L. 49,288.50	100%
12	Reinstalación de techo incluye canaletas (mismo techo)	m²	3.3	L. 1,000.00	L. 3,300.00	-	L. -	3.3	L. 3,300.00	3.3	L. 3,300.00	100%
13	Suministro de instalación de Inodoros	unidad	3	L. 4,940.00	L. 14,820.00	3.0	L. 14,820.00	-	L. -	3.0	L. 14,820.00	100%
14	Reinstalación de puertas	unidad	3	L. 8,450.00	L. 25,350.00	-	L. -	3.0	L. 25,350.00	3.0	L. 25,350.00	100%
15	Construcción de pila de 2x1m y 1,5 de altura	global	1	L. 19,500.00	L. 19,500.00	-	L. -	1.0	L. 19,500.00	1.0	L. 19,500.00	100%
16	Instalación de techo para galera de pila (se conectara con los baños)	m²	10	L. 979.43	L. 9,794.30	-	L. -	10.0	L. 9,794.30	10.0	L. 9,794.30	100%
17	Instalación de tubería para conectar tanque y pila 1/2" (Incluye accesorios 2 codos de 45° y 2 de 90° y una llave)	ml	30	L. 356.92	L. 10,707.60	-	L. -	30.0	L. 10,707.60	30.0	L. 10,707.60	100%
18	Desmontaje de balcones frontales de 2,85 x 1,7m	Unidad	3	L. 1,066.01	L. 3,198.03	-	L. -	3.0	L. 3,198.03	3.0	L. 3,198.03	100%
19	Desmontaje de balcones frontales de 1,7 x 1,7m	Unidad	3	L. 700.00	L. 2,100.00	-	L. -	3.0	L. 2,100.00	3.0	L. 2,100.00	100%
20	Desmontaje de puertas metálicas de 0,95x2m	Unidad	2	L. 850.00	L. 1,700.00	-	L. -	2.0	L. 1,700.00	2.0	L. 1,700.00	100%
21	Remoción de óxido y repintado de estructura existente metálica incluye puertas, joist y balcones	m²	40	L. 300.00	L. 12,000.00	40.0	L. 12,000.00	-	L. -	40.0	L. 12,000.00	100%
22	Fabricación e instalación de balcones frontales de 2,85 x 1,7m de tubo cuadrado de 1/2" con espaciamento a cada 0,10m	unidad	3	L. 9,750.00	L. 29,250.00	3.0	L. 29,250.00	-	L. -	3.0	L. 29,250.00	100%
23	Fabricación e instalación de balcones frontales de 1,7 x 1,7m de tubo cuadrado de 1/2" con espaciamento a cada 0,10m	unidad	3	L. 6,123.00	L. 18,369.00	3.0	L. 18,369.00	-	L. -	3.0	L. 18,369.00	100%
24	Instalación de puertas metálicas de 0,95x2m	unidad	2	L. 8,450.00	L. 16,900.00	2.0	L. 16,900.00	-	L. -	2.0	L. 16,900.00	100%
25	Instalación de pintura	m²	1450	L. 154.20	L. 223,590.00	1,000.0	L. 154,200.00	450.0	L. 69,390.00	1,450.0	L. 223,590.00	100%
26	Instalación de Piso terrazo interior	m²	50	L. 800.00	L. 40,000.00	40.0	L. 32,000.00	10.0	L. 8,000.00	50.0	L. 40,000.00	100%
27	Instalación de zócalos	ml	30	L. 205.00	L. 6,150.00	24.0	L. 4,920.00	6.0	L. 1,230.00	30.0	L. 6,150.00	100%
28	Trazado y marcado	m	120	L. 48.26	L. 5,791.20	120.0	L. 5,791.20	-	L. -	120.0	L. 5,791.20	100%
29	Excavación para cimentación	m³	35	L. 425.00	L. 14,875.00	35.0	L. 14,875.00	-	L. -	35.0	L. 14,875.00	100%
30	Cimentación de mampostería de 0.30 X 0.5 m	m³	30	L. 3,650.00	L. 109,500.00	30.0	L. 109,500.00	-	L. -	30.0	L. 109,500.00	100%
31	Cerco de malla electrolítica galvanizada de 6 ple calibre 13, incluye tubo de 2"	m²	300	L. 738.25	L. 221,475.00	300.0	L. 221,475.00	-	L. -	300.0	L. 221,475.00	100%
32	Solera de 15 x15 cm #3 y #2@20cm	m	120	L. 525.80	L. 63,096.00	120.0	L. 63,096.00	-	L. -	120.0	L. 63,096.00	100%
33	Muro de bloque de 6", dos hileras.	m²	60	L. 725.48	L. 43,528.80	60.0	L. 43,528.80	-	L. -	60.0	L. 43,528.80	100%
34	Columna de 0.4 x 0.4 m #4 y #3@20cm	m	8	L. 965.20	L. 7,721.60	8.0	L. 7,721.60	-	L. -	8.0	L. 7,721.60	100%
35	Suministro e instalación de portón de 5 x 3.5 m de la lámina troquelada con puerta peatonal	unidad	1	L. 45,000.00	L. 45,000.00	1.0	L. 45,000.00	-	L. -	1.0	L. 45,000.00	100%
36	Suministro de rótulo de identificación del proyecto	unidad	1	L. 7,200.00	L. 7,200.00	1.0	L. 7,200.00	-	L. -	1.0	L. 7,200.00	100%
37	Placa conmemorativa del proyecto	unidad	1	L. 15,325.00	L. 15,325.00	-	L. -	1.0	L. 15,325.00	1.0	L. 15,325.00	100%
TOTAL					L. 1,109,133.53		L. 939,538.60		L. 169,594.93		L. 1,109,133.53	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L. 1,109,133.53
TOTAL DE ESTIMACION N° 3 (100%)	L. 1,109,133.53
ACUMULADO	L. 1,109,133.53
MONTO POR ESTIMAR	L. -
RETENCIÓN POR I.S.R	L. -
PAGO DEL 80%	L. 887,306.82
TOTAL A RECIBIR	L. 221,826.71

CONTRATISTA
INGENIERO
 Nombre: *Delmer Orlando Nuñez Nuñez*
 Firma: *[Firma]*
 Fecha: 25 de septiembre del 2024

SUPERVISOR
 Nombre: *Maichol Ricardo Oliva*
 Firma: *[Firma]*
 Fecha: 25 de septiembre del 2024

ALCALDIA MUNICIPAL
 U. T. M.
 SAN JOSÉ CHOLUTECA

ALCALDE MUNICIPAL
 Nombre: *Nahua Zambrano*
 Firma: *[Firma]*
 Fecha: 25 de septiembre del 2024



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	REMODELACIÓN DE ESCUELA RAMÓN ROSA (MACUELIZO), SAN JOSÉ - CHOLUTECA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	CASERÍO MACUELIZO, ALDEA MACUELIZO		
MODALIDAD EJECUSION	LICITACION PRIVADA	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVO.		
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE FINALIZACION	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MÓDULO DE BAÑOS		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Desmontaje de techo (incluye canaletas de 4x2)	m ²	3.3
Desmontaje de puertas (de 0,86x2,07m)	unidad	3
Demolición de paredes	m ²	12.73
Desmontaje de sanitarios	unidad	3
Demolición de piso	m ²	3.5
Excavación para fosa séptica	m ³	36
Excavación para construcción de baños y pila	m ²	5
fundición de columnas de 0,10x0,10m (incluye armado, encofrado y fundición)	ml	25
Construcción de paredes con bloques de 5	m ²	12.73
Fundición de firme de concreto para sanitarios (e=0,10m)	m ²	15
Fundición de firme de concreto para fosa séptica (e=0,10m) tapadera	m ²	45
Reinstalación de techo incluye canaletas (mismo techo)	m ²	3.3
Suministro de instalación de Inodoros	unidad	3
reinstalación de puertas	unidad	3
Construcción de pila de 2x1m y 1,5 de altura	global	1
Instalación de techo para galera de pila (se conectara con los baños)	m ²	10
Instalación de tubería para conectar tanque y pila 1/2" (incluye accesorios 2 codos de 45° y 2 de 90° y una llave)	ml	30
PORTON DE ACCESO		
Columna de 0.4 x 0.4 m 4#4 y #3@20cm	m	8
Suministro e instalación de portón de 5 x 3.5 m de la lámina troquelada con puerta peatonal	unidad	1
Suministro de rótulo de identificación del proyecto	unidad	1





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



Placa conmemorativa del proyecto	unidad	1
MÓDULO DE AULAS		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Desmontaje de balcones frontales de 2,85 x 1,7m	Unidad	3
Desmontaje de balcones frontales de 1,7 x 1,7m	Unidad	3
Desmontaje de puertas metálicas de 0,95x2m	Unidad	2
Remoción de óxido y repintado de estructura existente metálica incluye puertas, joist y balcones	m ²	40
Fabricación e instalación de balcones frontales de 2,85 x 1,7m de tubo cuadrado de 1/2" con espaciamento a cada 0,10m	unidad	3
Fabricación e instalación de balcones frontales de 1,7 x 1,7m de tubo cuadrado de 1/2" con espaciamento a cada 0,10m	unidad	3
Instalación de puertas metálicas de 0,95x2m	unidad	2
Instalación de pintura	m ²	1450
Instalación de Piso terrazo interior	m ²	50
Instalación de zócalos	ml	30
CERCO PERIMETRAL		
Trazado y marcado	m	120
Excavación para cimentación	m ³	35
Cimentación de mampostería de 0.30 X 0.5 m	m ³	30
Cerco de malla ciclón galvanizada de 6 pie calibre 13, incluye tubo de 2"	m ²	300
Solera de 15 x15 cm 4#3 y #2@20cm	m	120
Muro de bloque de 6", dos hiladas.	m ²	60

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE ESCUELA RAMÓN ROSA (MACUELIZO), SAN JOSÉ - CHOLUTECA.

ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez  CONTRATISTA	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada   ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE
TESTIGO  COMISIONADO MUNICIPAL SAN JOSÉ CHOLUTEC SOCIEDAD CIVIL	TESTIGO   SUPERVISOR MUNICIPALIDAD SAN JOSE

2024

Informe FINAL escuela Ramón Rosa, comunidad de macuelizo

EJECUTOR ING ORLANDO NUÑEZ



ANTECEDENTES

En atención a la **SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN PLANTELES EDUCATIVOS (ANEXO CE-01)** recibida por parte de las autoridades responsables del proceso de descentralización en el marco del **"PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE)"** se realiza el cruce de información entre la Priorización de Centros Educativos emitidos por la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), como ente rector del proceso, en su Plan Maestro y las autoridades responsables tales como Técnicos Municipales, Directores de las Mancomunidades del país, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Directores de los Centros Educativos priorizados y Docentes es que el Centro Educativo Ramón Rosa Macuelizo queda priorizado para su intervención **REUNIENDO LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A ÍNDICES DE PRECARIEDAD.**

Obra a ejecutar

Repacion de escuela ramón rosa, comunidad de macuelizo, cambios de estructuras metálicas, construcción de cerca perimetral, construcción de módulo de baños y fose séptica, instalación de piso mosaico, pintura en módulos

Tiempo ejecución

90 días



Avances en este periodo

Existe un avance del 100 % de obra contractual en el periodo del 25 de Julio al 10 DE SEPTIEMBRE del 2024

Instalación de cerca perimetral 175ml

Sobre nivelación de bloque 2 h de bloque

Fundición de tubo 2 plg

Instalación de malla ciclón de 6plg

Reforzamiento de varilla de 1-4

Armado de columna 0.40x0.40cm

Desmontaje puerta 0.90x2-10

Desmontaje balcones

Excavaciones fosa séptica

Excavaciones módulo de baño



San José, Choluteca

10 de septiembre de 2024

Alcalde municipal

Nahúm Zambrano su oficina

Por medio de la presente deseando éxitos en sus funciones diarias, hago formal solicitud de desembolso del 20% del proyecto reparación escuela ramón rosa, comunidad de macuelizo por unos montos doscientos veintiuno mil ochocientos veinte seis con setenta ctvs. 221,826.70 de acuerdo con avance final



Delmer Orlando Núñez
Contratista

**REGISTRO
FOTOGRAFICO**


INFORME FINAL

ESCUELA RAMÓN ROSA

**COMUNIDAD DE
MACUELIZO**



PINTURA Y BALCONEARÍA

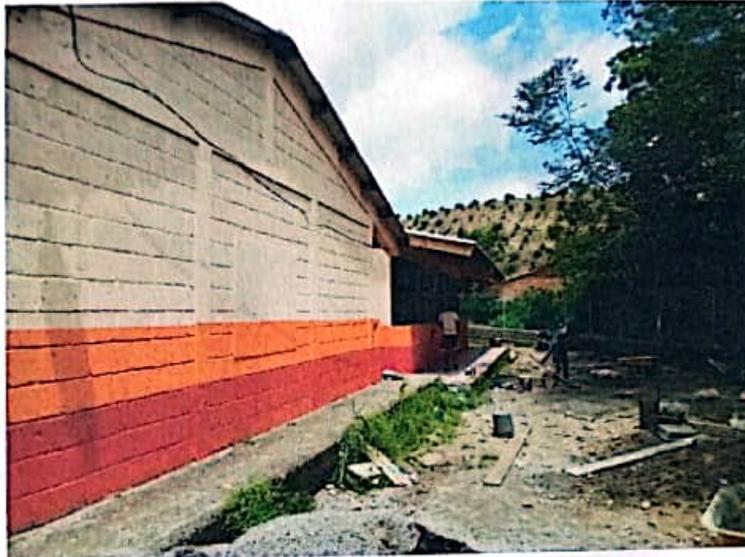

Pintura y balconearía




Pintura y balconearía





Pintura y balconearía

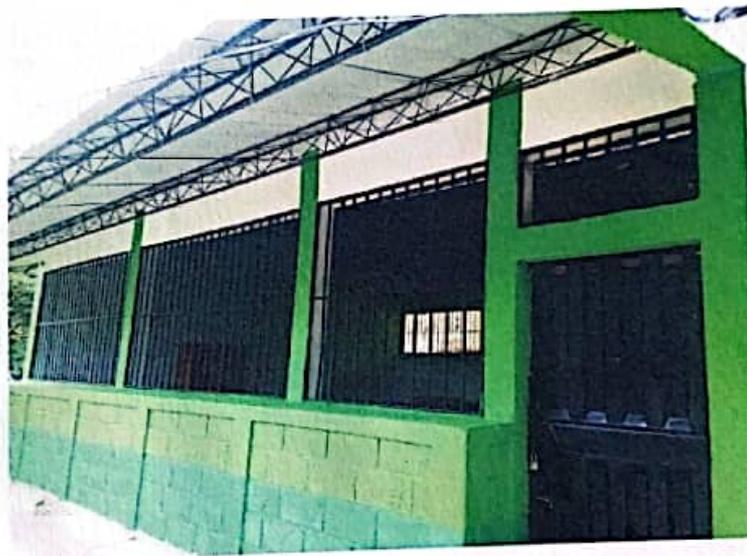


Pintura y balconearía





Pintura y balconearía

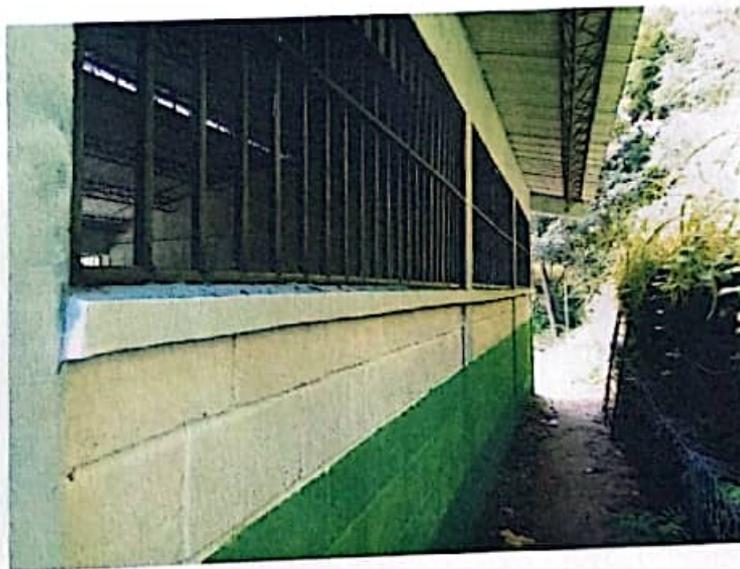

Pintura y balconearía






Pintura y balconearía



Pintura y balconearía



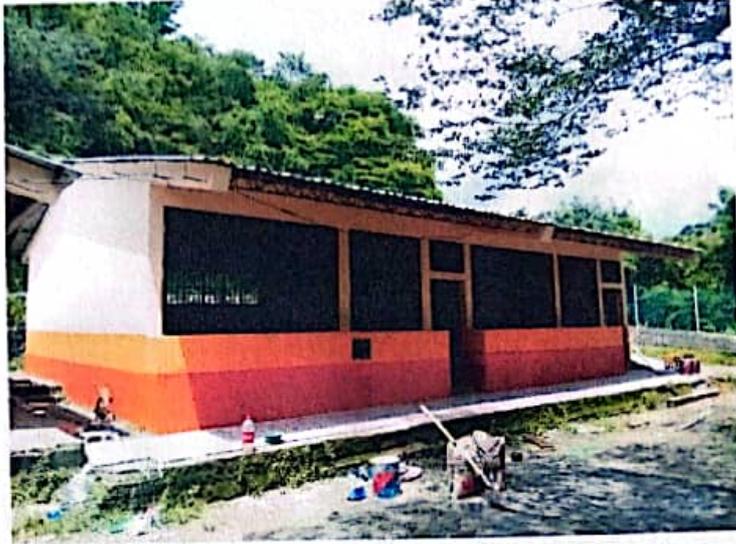


Pintura y balconearía



Pintura y balconearía



PISO GRANITO

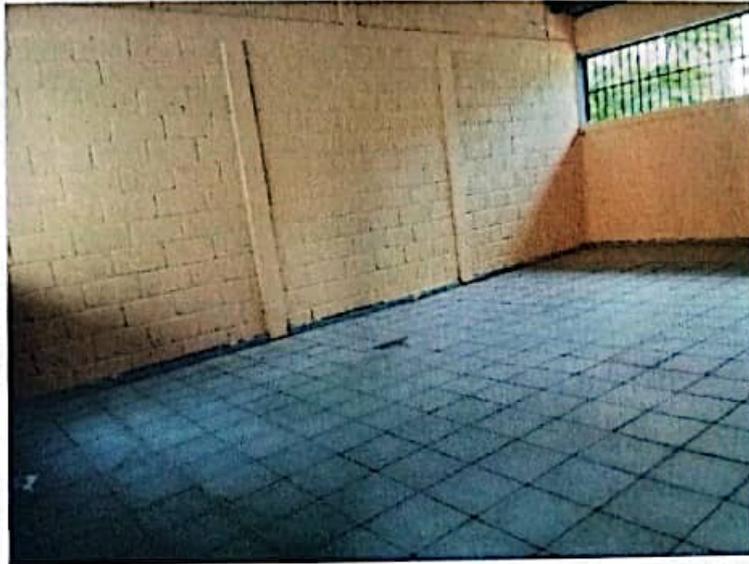

Piso granito



Piso granito



PORTÓN DE ACCESO



Portón de acceso



PILA Y BAÑOS



Pila y baños



Pila y baños



PLACA DISTINTIVA



Placa distintiva





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009144

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Delmer Orlando Nuñez Nuñez

CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y ocho mil ochocientos veinti
seis lempiras con 04/100 centavos (LPS. 88,826.04)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS


FONDO 11	PROGRAMA 11	ACTIVIDAD 01	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
11	Fortalecimiento Social y Comunitario	
01	Sector Educación	
1101007 010 007 471	Remodelación de la Escuela Lempira de	
10 11-011-04 200710	aldea Las Marias	
207		
	Ultimo pago del Proyecto Remodelación	
	de la Escuela Lempira de aldea Las	
	Marias. Proyecto Ejecutado Programa Na-	
	cional de Intervención de Infraestructura	
	Escolar SEFIN fondos Gobierno Cen-	
	tral. Recibo N° 006-001-04-00000132	
	y cheque n° 84965887	L. 88,826.04
		L. 88,826.04

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 0231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 27 septiembre año 2024.


FIRMA DEL TESORERO


FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL


FIRMA DEL INTERESADO

0601-1980-001974
N° DE IDENTIDAD

Recibo por Honorarios Profesionales

Delmer Orlando Núñez Núñez

Ingeniero Civil

Aldea El Chimbo, Kilometro 5, Carretera a Valle de Angeles
Contiguo a Pulperia Reina, Santa Lucia, F. M.
Tel.: 3212-4626 | E-mail: delmerorlandonuneznunez@gmail.com

Por Lps. **88,826.04**

Fecha: 22 de sep de 2024

Recibí de: Municipalidad de San José, C.A. UTEC R.T.N. No 19011443360

La Cantidad de: ochenta y ocho mil ochocientos veinte y seis Lempiras

Por Cuenta de: con 60000 Lps. por los honorarios del proyecto de reparación de los caminos comun. de los m.d.

Tiraje del 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000200
Químico: B/AZ

Honorarios Lps.		
Retención ISR Lps.		
T. Neto Recibido Lps.		

CAI: 1A2EC3-40247A-124293-9E8739-96D1FE-22
R.T.N.: 06011980044797
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº 000-001-04-00000132



11-S03-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077278/94567301

CHEQUE No. 84905887

SAN LORENZO, VALLE 27/ septiembre/ 2024
Lugar y Fecha


Delmer Orlando Nuñez Nuñez L 88,826.04

Páguese a la orden de

Ochenta y ocho mil ochocientos veintiseis con 04/100 Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆503079⑆00⑆⑆50300092⑆3⑆84905887

CSV: HAPB3JHLX3ND8SRZ



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ**
con Registro Tributario Nacional: **06011980044797**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 06/07/2024 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/09/2024.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CARTA DE GARANTÍA BANCARIA
VALOR L (22,207.00)



No42

Tegucigalpa, M.D.C 20 de septiembre de 2024

Vcto: 20/09/2025

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA

Garantizado: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A., con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, otorga la presente Garantía Bancaria a favor de **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA** Y por cuenta de la **SR DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ** actuando en su condición **REPRESENTANTE DE SI MISMO** por un monto de **VEINTI DOS MIL DOCIENTOS SIETE CON 00 CTVS (L22,207.00) CON EL OBJETO DE GARANTIZAR CALIDAD DE OBRA DE CONTRATO DE PROYECTO REMODELACION ESCUELA LEMPIRA, COMUNIDAD DE LAS MARIAS, SAN JOSE, CHOLUTECA.**

Esta **Garantía Bancaria** tendrá una vigencia de doce meses (12) a partir del veinte (20) de septiembre de dos mil veinte cuatro (2024) al veinte (20) de septiembre de dos mil veinte y cinco (2025), el plazo podrá extenderse hasta 12 meses de acuerdo al avance del proyecto; cualquier reclamo deberá ser presentado en esta fecha hasta las 4:00 pm, fecha en que vence toda nuestra responsabilidad de pago.

La presente garantía será ejecutada a simple requiriendo de la **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE, CHOLUTECA**

Sin más trámite que la presentación de este documento acompañado de la carta de incumplimiento del beneficiario.

Todo reclamo deberá ser realizado dentro del periodo de vigencia establecido por la presente garantía, transcurrido dicho plazo se extinguirán todas las obligaciones contraídas por **BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A** Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez y nueve (19) días de septiembre del año dos mil veinte cuatro (2024)



Firma autorizada



Firma autorizada

DIRECCION BLV SUYAPA, AVENIDA JUAN CARLOS, ANTIGUO EDIFICIO TIGO MDC



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA



ESTIMACION N° 03

REMODELACIÓN DE ESCUELA LEMPIRA LAS MARIAS, SAN JOSÉ - CHOLUTECA

CODIGO:

Departamento: Choluteca

DESCRIPCION: RESTAURACIÓN DE MÓDULO DE AULAS INCLUYE REPARACIÓN DE VENTANAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TERRAZO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA

Municipio: San José

UBICACIÓN: ALDEA LAS MARIAS
EJECUTOR: DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ

Periodo del: 29 julio al 25 de septiembre del 2024 (ESTIMACION III)
SUPERVISOR: Ing. Maichol Ricardo Oliva

N°	ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE		ACUMULADO ACTUAL		%	
			CANT.	PRE. U	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.		TOTAL
1	Piso de granito terrazo	m²	60	L 725.80	L 43,548.00	-	L -	60.0	L 43,548.00	60.0	L 43,548.00	100%
2	Pintura en paredes	m²	77	L 165.40	L 12,735.80	61.6	L 10,188.64	15.4	L 2,547.16	77.0	L 12,735.80	100%
3	Pintura en balcones	m²	15	L 178.90	L 2,683.50	15.0	L 2,683.50	-	L -	15.0	L 2,683.50	100%
4	Demolición de piso existente	m²	46.53	L 215.30	L 10,017.91	46.5	L 10,017.91	-	L -	46.5	L 10,017.91	100%
5	Piso de granito terrazo	m²	46.53	L 725.80	L 33,771.47	38.0	L 27,580.40	8.5	L 6,191.07	46.5	L 33,771.47	100%
6	Pintura en paredes	m²	75	L 165.40	L 12,405.00	75.0	L 12,405.00	-	L -	75.0	L 12,405.00	100%
7	Pintura en balcones	m²	10	L 178.90	L 1,789.00	10.0	L 1,789.00	-	L -	10.0	L 1,789.00	100%
8	Firme de concreto en corredor	m²	25	L 887.40	L 22,185.00	25.0	L 22,185.00	-	L -	25.0	L 22,185.00	100%
9	Demolición de piso existente	m²	33.05	L 215.30	L 7,115.67	33.1	L 7,115.67	-	L -	33.1	L 7,115.67	100%
10	Piso de granito terrazo	m²	33.05	L 725.80	L 23,987.69	27.0	L 19,596.60	6.1	L 4,391.09	33.1	L 23,987.69	100%
11	Pintura en paredes	m²	57	L 165.40	L 9,427.80	57.0	L 9,427.80	-	L -	57.0	L 9,427.80	100%
12	Pintura en balcones	m²	10	L 178.90	L 1,789.00	10.0	L 1,789.00	-	L -	10.0	L 1,789.00	100%
13	Firme de concreto en corredor	m²	25	L 887.40	L 22,185.00	25.0	L 22,185.00	-	L -	25.0	L 22,185.00	100%
14	Demolición de piso existente	m²	33.05	L 215.30	L 7,115.67	33.1	L 7,115.67	-	L -	33.1	L 7,115.67	100%
15	Piso de granito terrazo	m²	33.05	L 725.80	L 23,987.69	27.0	L 19,596.60	6.1	L 4,391.09	33.1	L 23,987.69	100%
16	Pintura en paredes	m²	57	L 165.40	L 9,427.80	57.0	L 9,427.80	-	L -	57.0	L 9,427.80	100%
17	Pintura en balcones	m²	10	L 178.90	L 1,789.00	10.0	L 1,789.00	-	L -	10.0	L 1,789.00	100%
18	Firme de concreto en corredor	m²	25	L 887.40	L 22,185.00	25.0	L 22,185.00	-	L -	25.0	L 22,185.00	100%
19	Pintura en paredes	m²	171	L 165.40	L 28,283.40	118.0	L 19,517.20	53.0	L 8,766.20	171.0	L 28,283.40	100%
20	Pintura en balcones	m²	20	L 178.90	L 3,578.00	20.0	L 3,578.00	-	L -	20.0	L 3,578.00	100%
21	Piso de granito terrazo	m²	21.3	L 725.80	L 15,459.54	17.0	L 12,367.63	4.3	L 3,091.91	21.3	L 15,459.54	100%
22	Pintura en paredes	m²	19	L 165.40	L 3,142.60	19.0	L 3,142.60	-	L -	19.0	L 3,142.60	100%
23	Pintura en balcones	m²	8	L 178.90	L 1,431.20	8.0	L 1,431.20	-	L -	8.0	L 1,431.20	100%
24	Firme de concreto en corredor	m²	25	L 887.40	L 22,185.00	25.0	L 22,185.00	-	L -	25.0	L 22,185.00	100%
25	Acometida eléctrica	unidad	1	L 18,000.00	L 18,000.00	1.0	L 18,000.00	-	L -	1.0	L 18,000.00	100%
26	Centro de carga de 10 espacios	unidad	1	L 7,800.00	L 7,800.00	1.0	L 7,800.00	-	L -	1.0	L 7,800.00	100%
27	Centro de carga de 4 espacios	unidad	2	L 5,200.00	L 10,400.00	2.0	L 10,400.00	-	L -	2.0	L 10,400.00	100%
28	Tomacorriente	unidad	8	L 1,360.00	L 10,880.00	8.0	L 10,880.00	-	L -	8.0	L 10,880.00	100%
29	Lámparas de techo	unidad	16	L 1,285.60	L 20,569.60	16.0	L 20,569.60	-	L -	16.0	L 20,569.60	100%
30	Interruptores dobles	unidad	8	L 1,468.00	L 11,744.00	8.0	L 11,744.00	-	L -	8.0	L 11,744.00	100%
31	Suministro de rótulo de identificación del proyecto	unidad	1	L 7,185.86	L 7,185.86	1.0	L 7,185.86	-	L -	1.0	L 7,185.86	100%
32	Placa conmemorativa del proyecto	unidad	1	L 15,325.00	L 15,325.00	-	L -	1.0	L 15,325.00	1.0	L 15,325.00	100%
TOTAL					L 444,130.19		L 355,878.67		L 88,251.52		L 444,130.19	

COSTO TOTAL DEL CONTRATO	L	444,130.19
TOTAL DE ESTIMACION N° 3 (100%)	L	444,130.19
ACUMULADO	L	444,130.19
MONTO POR ESTIMAR	L	-
RETENCIÓN POR I.S.R	L	355,304.15
PAGO DEL 80%	L	88,826.04
TOTAL A RECIBIR	L	88,826.04

Nombre: Delmer Orlando Nuñez Nuñez
 Firma: [Firma]
 Fecha: 25 de septiembre del 2024



Nombre: Maichol Ricardo Oliva
 Firma: [Firma]
 Fecha: 25 de septiembre del 2024



Nombre: Maichol Ricardo Oliva
 Firma: [Firma]
 Fecha: 25 de septiembre del 2024





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholotecasanjose@municipalldadhn.info



ACTA DE RECEPCION DE PROYECTO

MUNICIPIO	SAN JOSÉ	CODIGO PRESUPUESTARIO	
NOMBRE DEL PROYECTO	REMODELACIÓN DE ESCUELA LEMPIRA LAS MARIAS, SAN JOSÉ - CHOLUTECA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO	BARRIO EL CENTRO, ALDEA LAS MARIAS		
MODALIDAD EJECUSION	LICITACION PRIVADA	FUENTE FINANCIAMIENTO	FONDOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)
OBJETIVO DEL PROYECTO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVO.		
FECHA DE INICIO	10 DE JUNIO DEL 2024	FECHA DE FINALIZACION	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MÓDULO DEL KINDER		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Piso de granito terrazo	m ²	60
Pintura en paredes	m ²	77
Pintura en balcones	m ²	15
AULA 1		
Demolición de piso existente	m ²	46.53
Piso de granito terrazo	m ²	46.53
Pintura en paredes	m ²	75
Pintura en balcones	m ²	10
Firme de concreto en corredor	m ²	25
AULA 2		
Demolición de piso existente	m ²	33.05
Piso de granito terrazo	m ²	33.05
Pintura en paredes	m ²	57
Pintura en balcones	m ²	10
Firme de concreto en corredor	m ²	25
AULA 3		
Demolición de piso existente	m ²	33.05
Piso de granito terrazo	m ²	33.05
Pintura en paredes	m ²	57
Pintura en balcones	m ²	10
Firme de concreto en corredor	m ²	25







MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 9607-7275
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



AULAS 4, 5, 6		
ACTIVIDAD /DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
Pintura en paredes	m ²	171
Pintura en balcones	m ²	20
BODEGA		
Piso de granito terrazo	m ²	21.3
Pintura en paredes	m ²	19
Pintura en balcones	m ²	8
Firme de concreto en corredor	m ²	25
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
Acometida eléctrica	unidad	1
Centro de carga de 10 espacios	unidad	1
Centro de carga de 4 espacios	unidad	2
Tomacorriente	unidad	8
Lámparas de techo	unidad	16
Interruptores dobles	unidad	8
Suministro de rótulo de identificación del proyecto	unidad	1
Placa conmemorativa del proyecto	unidad	1

EL ALCALDE EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL REUNIDO EN EL SITIO DE PROYECTO Y EN PRESENCIA DE MIEMBRO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISIÓN RECIBEN A ENTERA SATISFACCION LOS DISTINTOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON PARTE DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE ESCUELA LEMPIRA LAS MARIAS, SAN JOSÉ - CHOLUTECA

ENTREGADO POR: Delmer Orlando Nuñez Nuñez  	RECIBIDO POR: Nahun Zambrano Estrada  
CONTRATISTA TESTIGO  	ALCALDE MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN JOSE TESTIGO  

2024

Informe avance final escuela Lempira, comunidad de las marías

EJECUTOR ING ORLANDO NUÑEZ



ANTECEDENTES

En atención a la SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN PLANTELES EDUCATIVOS (ANEXO CE-01) recibida por parte de las autoridades responsables del proceso de descentralización en el marco del "PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE)" se realiza el cruce de información entre la Priorización de Centros Educativos emitidos por la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles (DIGECEBI), como ente rector del proceso, en su Plan Maestro y las autoridades responsables tales como Técnicos Municipales, Directores de las Mancomunidades del país, Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), Directores de los Centros Educativos priorizados y Docentes es que la escuela lempira, comunidad las marías queda priorizado para su Intervención REUNIENDO LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A ÍNDICES DE PRECARIEDAD.

Obra a ejecutar

Repacion de escuela lempira , comunidad de las marías , desmontaje de piso existente instalación de granito de terrazo ,firme de concreto , pintura en módulos , instalaciones eléctricas

Tiempo ejecución

90 días



Avances en este periodo

Existe un avance del 50 % de obra contractual en el periodo del 16 agosto al 10 de septiembre del 2024

Desmontaje de piso existente

Demolición de firme de concreto

Fundición de firme 10 cm acera

Suministro e instalación de rótulo

Suministro de aceras completas

Suministro de pintura aulas 1, 2, 3,4

Suministro pintura kínder

Suministro pintura aulas 5,6,7

Instalaciones eléctricas

Instalación de piso granito



San José, Choluteca

16 de agosto del 2024

Alcalde municipal

Nahúm Zambrano su oficina

Por medio de la presente deseando éxitos en sus funciones diarias, hago formal solicitud de desembolso del 20% del proyecto reparación escuela Iempira, comunidad de las marías por un monto de ochenta y ocho mil ochocientos veinte y seis con cuatro ctvs. 88,826.04 de acuerdo con avance final



Delmer Orlando Nuñez Nuñez

Contratista

**REGISTRO
FOTOGRAFICO**

INFORME FINAL

ESCUELA LEMPIRA

**COMUNIDAD DE LAS
MARIAS**

PINTURA Y BALCONERÍA




Pintura y Balconería



Pintura y Balconería



Pintura y Balconería

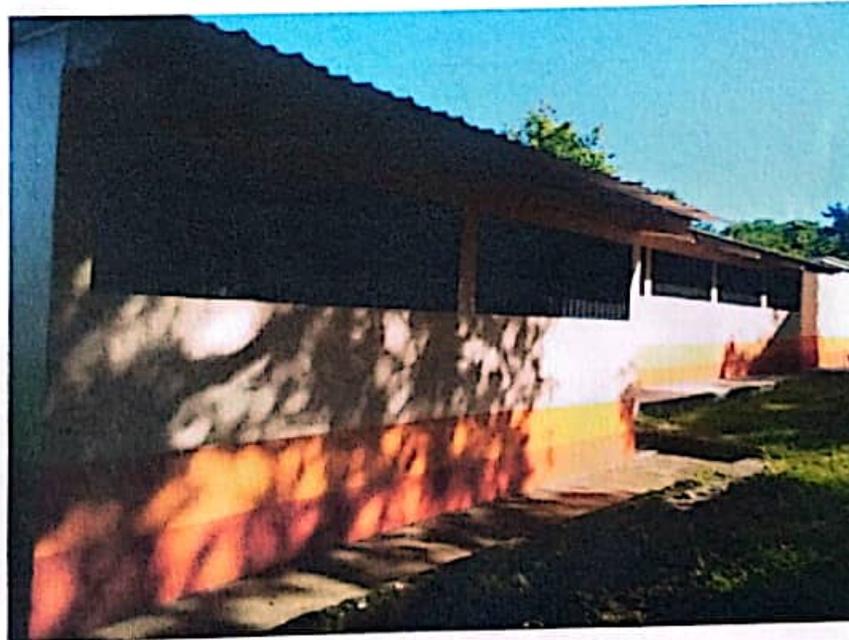

Pintura y Balconería



Pintura y Balconería



Pintura y Balconería



Pintura y Balconería



Pintura y Balconería



Pintura y Balconería




Pintura y Balconería



Pintura y Balconería



Pintura y Balconería

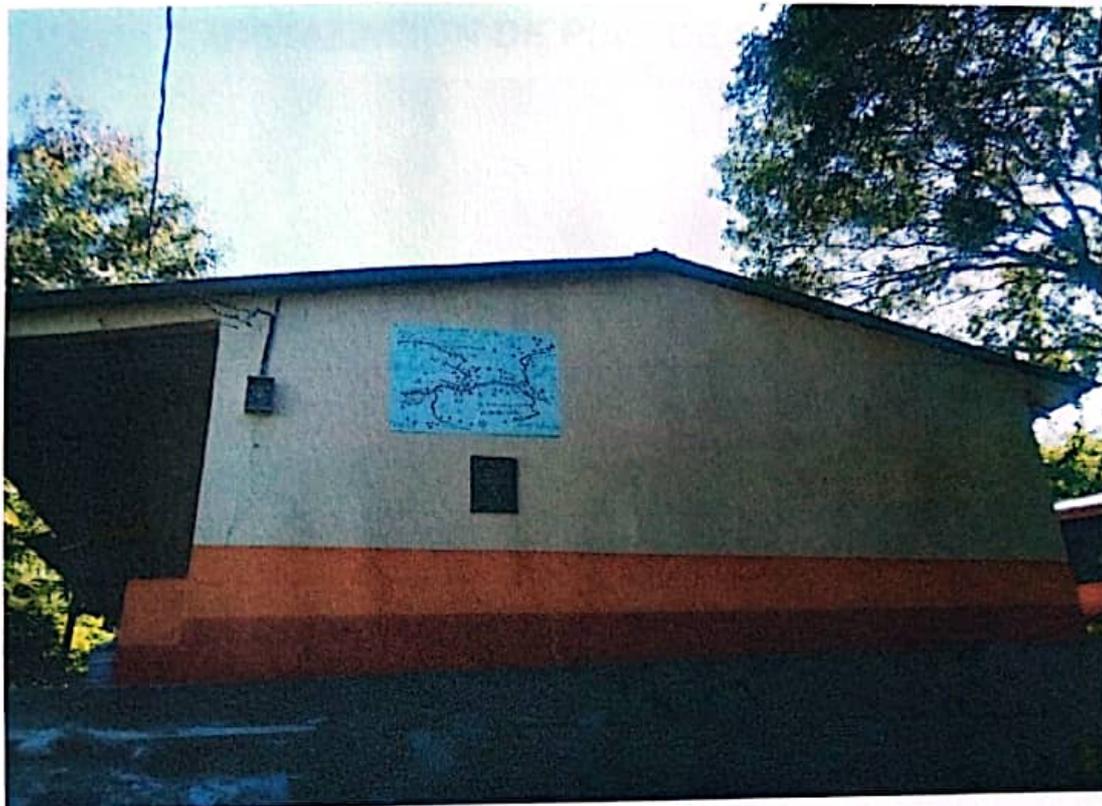

Pintura y Balconería

INSTALACIÓN DE PISO DE GRANITO



Instalación de piso de granito



Instalación de piso de granito



Instalación de piso de granito



Instalación de piso de granito



Instalación de piso de granito



Pintura y Balconería



Pintura y Balconería

PLACA DISTINTIVA



Placa distintiva



Placa distintiva



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 4,000.00
Cheque # 84905875
Orden de Pago # 009136

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de cuatro mil lempiras exactos.

Por concepto de: Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre año 2024.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

Nombre: DAMARIS LORENA COREA OLIVA

Nº de Identidad: 0614 1988 00018

Teléfono: 9514-4024

Firma y Huella: Damaris Corea 

11-S03-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO-SAN JOSE CHOLUTECA
36077275794567301

CHEQUE No. 84905875

SAN LORENZO, VALLE 26 / septiembre / 2024
Lugar y Fecha

Damaris Lorena Lorea Olivo L 4000.00
Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



5 1 50 30 79 00 1 1 50 30 00 9 2 1 3 1 8 4 9 0 5 8 7 5



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



CONTRATO PARA HACER ASEO Y LIMPIEZA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE

Nosotros Nahún Zambrano Estrada, con tarjeta de identidad # 0614-1974-00020 mayor de edad hondureño y de este vecindario en su condición de Alcalde Municipal de San José Choluteca y la señora: Damaris Lorena Corea Oliva con N.º de identidad 0614 1989 00037 mayor de edad hondureña de este vecindario por medio del presente contrato acordamos Nº 01- La Municipalidad de San José, representada por el Alcalde Municipal manifiesta que contrata a la señora: Damaris Lorena Corea Oliva, Para realizar las siguientes actividades:

- a) La contratante se compromete a realizar las labores de limpieza y aseo en todo el predio de La Alcaldía Municipal de San José Choluteca.
- b) La labor a realizar estará sujeta al horario siguiente; de 01:00 p.m. a 4:00 p.m. en los días lunes a viernes de cada semana.
- c) El tiempo del contrato será de un mes a partir del 01 al 30 de septiembre año 2024
- d) La Municipalidad se compromete de acuerdo a lo pactado entre las partes a pagar en un mes la cantidad de Lps 4,000.00 cuatro mil lempiras exactos para las labores de limpieza y aseo definidas en la cláusula a) del presente contrato Nº 02- que todo incumplimiento entre las partes o cada una de las partes dará lugar a rescindir el contrato exonerando de toda responsabilidad. A la Municipalidad.

En fe de lo cual y para seguridad y constancia firmamos el presente contrato de servicios para aseo y limpieza en La Alcaldía Municipal en el Municipio de San José Departamento de Choluteca a un día del mes de septiembre año 2024



Nahún Zambrano Estrada
Nahún Zambrano Estrada
Alcalde Municipal

Damaris Corea
Damaris Lorena Corea Oliva
Empleada.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHOLUTECA, HONDURAS

TEL. 2756-9665

ORDEN DE PAGO N° 009137

UNIDAD EJECUTORA: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, CHOLUTECA

PAGARE A: Martha Delia Hernandez Zelaya

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatro mil lempiras exactos (LPS. 4,000=)

VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PÚBLICOS

FONDO 15	PROGRAMA 03	ACTIVIDAD 001	PROYECTO
CODIGO	CODIGO	CODIGO	CODIGO

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
03	Administración Financiera	
001	Tesorería	
0300 000 001 000 1200	Jornales	
15-013-01 10 0160		
	Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía Municipal correspondiente al mes de septiembre año 2024. Se pagó con cheque n° 84905876	L. 4,000=
		L. 4,000=

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

FECHA: San José, Choluteca 26 septiembre año 2024



[Signature]
FIRMA DEL TESORERO



[Signature]
FIRMA DEL ALCALDE MUNICIPAL

Martha Delia Hernandez Z
FIRMA DEL INTERESADO

0614-1979-00062
N° DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 4,000.00
Cheque # 84905876
Orden de Pago # 009137

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de cuatro mil lempiras exactos.

Por concepto de: Pago a encargada de hacer el aseo en oficinas y todo el predio de la alcaldía municipal correspondiente al mes de septiembre año 2024.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

Nombre: MARTHA DELIA HERNANDEZ ZELAYA

Nº de Identidad: 0614 1979 00062

Teléfono: 95-59-15-47

Firma y Huella: Martha Delia Hernandez Z 

11-B03-000321-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94557301

CHEQUE No. 84905876

SAN LORENZO, VALLE 26 / septiembre / 2024
Lugar y Fecha

Martha Delia Hernandez Zelaya L. 4000.00
Páguese a la orden de

Cuatro mil lempiras - - - - -
Cantidad en letras Lempiras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



[Signature]

⑆0 1503079⑆00 1 150300092 13⑆84905876



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholutecasanjose@municipalidadhn.info



CONTRATO PARA HACER ASEO Y LIMPIEZA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE

Nosotros Nahún Zambrano Estrada, con tarjeta de identidad # 0614-1974-00020 mayor de edad hondureño y de este vecindario en su condición de Alcalde Municipal de San José Choluteca y la señora: Martha Delia Hernandez Zelaya con N.º de identidad 0614 1979 00062 mayor de edad hondureña de este vecindario por medio del presente contrato acordamos N.º 01- La Municipalidad de San José, representada por el Alcalde Municipal manifiesta que contrata a la señora: Martha Delia Hernandez Zelaya, Para realizar las siguientes actividades:

- a) La contratante se compromete a realizar las labores de limpieza y aseo en todo el predio de La Alcaldía Municipal de San José Choluteca.
- b) La labor a realizar estará sujeta al horario siguiente; de 08:00 a.m. a 12:00 m. en los días lunes a viernes de cada semana.
- c) El tiempo del contrato será de un mes a partir del 01 al 30 de septiembre año 2024
- d) La Municipalidad se compromete de acuerdo a lo pactado entre las partes a pagar en un mes la cantidad de Lps 4,000.00 cuatro mil lempiras exactos para las labores de limpieza y aseo definidas en la cláusula a) del presente contrato N.º 02- que todo incumplimiento entre las partes o cada una de las partes dará lugar a rescindir el contrato exonerando de toda responsabilidad. A la Municipalidad.

En fe de lo cual y para seguridad y constancia firmamos el presente contrato de servicios para aseo y limpieza en La Alcaldía Municipal en el Municipio de San José Departamento de Choluteca a un día del mes de septiembre año 2024



Martha Delia Hernandez Zelaya
Martha Delia Hernandez Zelaya
Empleada





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



RECIBO

Por Lps. 3,500.00
Cheque # 84905874
Orden de Pago # 009135

Recibí de la Alcaldía Municipal de San José, Choluteca la cantidad de tres mil quinientos lempiras exactos.

Por concepto de: Pago a encargada de hacer el aseo en la plaza municipal del casco urbano correspondiente al mes de septiembre año 2024.

Para efectos legales firmo el presente recibo a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro.

Nombre: MARLY ELIZABETH HERNANDEZ VELASQUEZ

N° de Identidad: 0614 1989 00139

Teléfono: 9318376

Firma y Huella: Marly Hernandez



11-503-000921-3
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
CHOLUTECA
BARRIO EL CENTRO, SAN JOSE CHOLUTECA
96077275/94567301

CHEQUE No. 84905874

SAN LORENZO, VALLE 26/Septiembre/2024
Lugar y Fecha

Marly Elizabeth Hernández Velosquez L 3,500.00


Págese a la orden de

tres mil quinientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S. A.
HONDURAS, C.A.



0150307900115030009213184905874

MI Documento es Midecine S.A. de C.V.



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
TEL: 96-07-72-75
cholotecasanjose@municipalidadhn.info



CONTRATO PARA HACER EL ASEO Y LIMPIEZA EN LA PLAZA PÚBLICA DEL CASCO URBANO DE SAN JOSE

Nosotros Nahun Zambrano Estrada, con tarjeta de identidad # 0614-1974-00020 mayor de edad hondureño y de este vecindario en su condición de Alcalde Municipal de San José Choluteca y la señora: Marly Elizabeth Hernandez Velásquez con N.º de identidad 0614-1989-00139 mayor de edad hondureño de este vecindario por medio del presente contrato acordamos N° 01- La Municipalidad de San José, representada por el Alcalde Municipal manifiesta que contrata a la señora: : Marly Elizabeth Hernandez Velásquez , para realizar las siguientes actividades

- a) La contratada se compromete a realizar las labores de limpieza y aseo en toda la plaza pública del casco urbano.
- b) La labor a realizar estará sujeta al horario siguiente; de 05:00 a.m. a 10:00 a.m. en los días domingo a viernes de cada semana.
- c) El tiempo del Contrato será de un mes a partir del 01 al 30 de septiembre año 2024.
- d) La Municipalidad se compromete de acuerdo a lo pactado entre las partes a pagar un mes la cantidad de Lps 3,500.00 tres mil quinientos lempiras exactos para las labores de limpieza y aseo en la plaza pública de San José del casco urbano definidas en la cláusula a) del presente contrato N° 02- que todo incumplimiento entre las partes o cada una de las partes dará lugar a rescindir el contrato exonerando de toda responsabilidad. A la Municipalidad.

En fe de lo cual y para seguridad y constancia firmamos el presente contrato de servicios para aseo y limpieza en el Casco Urbano en el Municipio de San José Choluteca al primer día del mes de septiembre año 2024



Nahun Zambrano Estrada
Alcalde Municipal

Marly Hernandez
Marly Elizabeth Hernandez Velásquez
Empleada.
