



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE AGOSTO DE 2017

Encargado de ejecución del proyecto.	Comité ejecutor del proyecto (CEP)
Sector/Subsector	Infraestructura Social
Nombre del Proyecto	Ampliación CEB Renacimiento (Jardín Integrado Nuevo Amanecer)
Ubicación del Proyecto	Aldea San Cristóbal, Municipio de Tomalá.
Propósito	El propósito principal del proyecto es crear una edificación en la cual los alumnos reciban clases en un lugar decente y además tengan lugares de esparcimiento y que puedan aprender otros tipos de habilidades como ser: computación, deportes, taller hogar.
Descripción del proyecto.	<p>En vista de las condiciones en las que se encontraban una parte de las instalaciones de este centro educativo, se vio la necesidad de hacer una remodelación de las aulas en buen estado existentes, y la construcción de los siguientes módulos.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Se construirá muro perimetral de bloque y malla ciclón.✓ Se construirán 4 aulas nuevas.✓ Se remodelarán las 4 aulas existentes en buen estado.✓ Se construirá el módulo de jardín de niños con sus propios baños privados.✓ Se construirá el laboratorio de computación, Taller Hogar, Bodega cocina.✓ Se construirá el área de juegos para Kínder.✓ Se construirá área de escuela para escolares.✓ Se construirá cancha multiusos.✓ Se construirá modulo sanitario diferenciado.✓ Se habilitará terreno para el huerto escolar.

Avances del proyecto.	<p>En el periodo del mes de Agosto de 2017 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Se ha colocado la estructura de techo en los módulos existentes, a falta de la bodega.✓ Se ha colocado la cerca perimetral, a falta de colocar la malla.✓ Se han fundido todos los firmes de piso.
------------------------------	--



MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE AGOSTO DE 2017

	<ul style="list-style-type: none">✓ Se avanzado en un 80% el pulido de paredes interiores y exteriores.✓ Se ha iniciado la colocación del piso de granito.✓ Se ha avanzado en las instalaciones electricas del laboratorio de computación.✓ Se han fabricado los muebles de cocina del taller Hogar.
Impacto Ambiental	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto, más que los residuos sólidos provenientes de demoliciones, los cuales son llevados a lugares de disposición final.
Impacto del terreno y asentamiento.	NO APLICA
Detalles del encargado del proyecto (EJECUTOR)	CEP (Comité ejecutor del proyecto.) Esly Bladimir Orellana (Presidente CEP) 9560-6918
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	ING Said Alonso Cáceres Enamorado 9732-2235
Detalles del encargado del proyecto(MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento	<ul style="list-style-type: none">✓ PROMINE KFW✓ Municipalidad de Tomalá.✓ Aporte comunitario
Porcentaje de avance del proyecto.	75%
Fecha de finalización estimada	Noviembre 2017



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE AGOSTO DE 2017

Memoria Fotográfica del proyecto.



Pulido finalizado en los módulos nuevos.




Colocación de castillos en la cerca perimetral.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION DE PROYECTO.
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PERIODO: 1-31 DE AGOSTO DE 2017

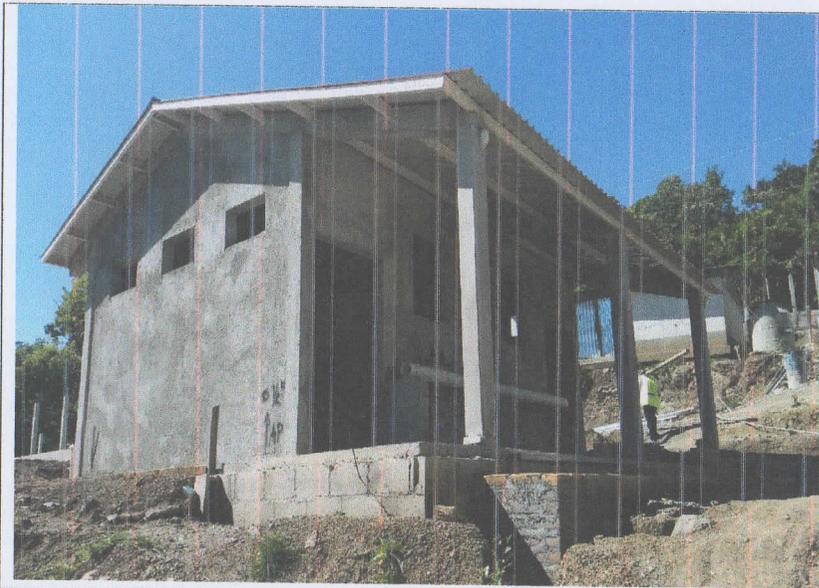

Modulo sanitario listo para pulir.



Repello y pulido en los módulos existentes.

Ing. Darling Josue Herrera Velazquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

