



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 6386

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago N° _____

Cheque N° _____

Valor Efectivo: _____

Lps. 7,980.00

PAGUESE A: Santos Alexis Hernandez Vasquez

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Siete mil Novecientos Ochenta Exactos.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

| FONDO | PROGRAMA | ACTIVIDAD | PROYECTO |
|---------|----------|-----------|----------|
| COD. 12 | COD. 03 | COD. 09 | COD. 46 |

| OBJETO DE GASTOS | DESCRIPCION | Valor en Lempiras | |
|---|--|-------------------|----------|
| | | | Total |
| 03 | Desarrollo Social Cultural y Comunit | | 7,980.00 |
| 09 | Seguridad Ciudadana | | |
| 12 | Transferencia Gobierno Central | | |
| 400 | Bienes Capitalizables | | |
| 460 | Const. Adiccion y Mejora Edificios y obras Urb. | | |
| 467 | Const. Adiccion y Mejora parques y lugares Recreo | | |
| (46) | Construccion cancha Polideportiva (usos Múltiples) | | |
| Los Planes. pago de Sta. Estimación del Proyecto Construccion cancha Polideportiva de la Comunidad de los Planes y ultima de cierre Proyecto. | | | |
| TOTAL A PAGAR | | L. | 7,980.00 |

Fecha 25-06-2015.

Firma del Responsable del Sub Programa



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto



Recibido por (f) [Signature]

Identidad N° 1217 1976 00038

Solvencia N° 159549



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 61601740

PAGUESE POR
ESTE CHEQUE A:

Santos Alexis Hernandez Vasquez 7.980.00 DE 2015
PLANES, LA PAZ 25 Junio

= Siete mil Novecientos Ochenta Exactos = LEMPIRAS

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ 9863-2786

2754-8970

[Handwritten Signature]
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

⑆0⑆304079⑆00⑆130400006⑆1⑆61601740

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970**



Santa María la Paz, 29 de mayo de 2015.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: CONSTRUCCION DE CANCHA
POLIDEPORTIVA, COMUNIDAD DE PLANES,
MUNICIPIO, SANTA MARIA LA PAZ

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°5, del proyecto en mención; comprende el periodo del 29 de mayo del 2015.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



INGRID LOMBARDI NICOLÉS MORALES
Supervisor De Infraestructura.
Mamcepac A. P.

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TELEFAX (504) 2757-8970**



RESUMEN EJECUTIVO.

| 1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO. | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA | | | | |
| CODIGO FHIS: | COT-1217-02-2014 | | | | |
| UBICACIÓN: | ALDEA DE PLANES,SANTA MARIA LA PAZ | | | | |
| BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: | <p>El proyecto consiste en la construcción de una cancha de 15x30mts, con cerca de bloque a nivel de tres hiladas, y un batiente de cierre malla ciclón calibre N°10, y tubos de 2", incluye dos tableros con aros, cancha de tubo hg, se instalaran dos portones, también se instalaran dos reflectores en el sistema eléctrico conforme a planos tipo.</p> <p>En esta estimación se incluye la orden de cambio, que se dio en el proyecto debido al replanteo verificado en sitio con el ejecutor y supervisor conjuntamente, y avalado por el auditor municipal.</p> | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | <p>Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD.</p> <p>La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ</p> | | | | |
| INVERSION DEL PROYECTO: | | | | | |
| CONCEPTO | FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD | APORTE MUNICIPALIDAD | APORTE COMUNIDAD | SUB-TOTAL | |
| COSTO DE INFRAESTRUCUTRA | L. 638,373.39 | L. 0.000 | L. 0.00 | L. 638,373.39 | |
| COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto) | L. 0.00 | | | L. 638,373.39 | |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | | L. 638,373.39 | |



| 1.2- INFORMACION CONTRACTUAL. | |
|--|---|
| NOMBRE DEL EJECUTOR: | SANTOS ALEXIS HERNANDEZ |
| SUPERVISION | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES. |
| CONTRATO ORIGINAL | |
| FECHA DE FIRMA DE CONTRATO | 15 de enero de 2015 |
| FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO | 15 de enero de 2015 |
| FECHA DE ORDEN DE INICIO | 30 de enero de 2015. |
| PLAZO CONTRACTUAL | 120 DIAS CALENDARIO. |
| FECHA DE FINALIZACION | 09 de julio de 2015. |

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA:

Se presenta el informe que avala el pago de una quinta estimación, que corresponde específicamente al módulo de instalaciones eléctricas en los ítems 1,2,4,5. Este módulo por un error en la hoja electrónica de Excel en el formato de estimaciones, se detectó al momento de hacer el cierre financiero un pago faltante al ejecutor por un monto de **OCHO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.8, 400.00)** y en los ítems descritos anteriormente.

En tal sentido se presenta una estimación N°5 para que se reflejen los datos y montos detallados de los subtotales que conforman el monto total a pagar en esta estimación.

Con esto estamos dando trámite legal y en debida forma para que la municipalidad tenga en sus registros el monto total de la inversión presentada en los proyectos.

SITUACIONES PRESENTADAS:

Se presentó una orden de cambio la cual es parte integral de este documento.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Proyecto concluido.

CALIFICACION AL CONTRATISTA:



El ejecutor es un maestro de obra calificado el cual, cuenta con todas la herramientas necesarias para hacerle frente al proyecto, cuenta con el personal calificado, y se ha observado que el anticipo brindado por la municipalidad ha sido utilizado para el proyecto, ya que hay suficiente material en sitio como ser arena, grava, material selecto, cemento, hierro, no hay retrasos en pago de personal.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. MAESTRO DE OBRA (SANTOS ALEXIS HERNANDEZ)
2. ALBAÑILES.
3. PEONES.

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.



La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión del alcance del proyecto conforme a planos y presupuesto.
2. Elaboración del plan de ejecución.
3. Elaboración del cronograma de trabajo.
Apoyo a la municipalidad en la supervisión del proyecto en conjuntamente con la auditoria municipal.
4. Apertura de Bitácora.
5. Verificar calidad de materiales
6. Evaluar el personal contratado.

1.5CONCLUSIONES.

1. El proyecto avanza dentro del cronograma.
2. Presenta una buena calidad de obra
3. Los materiales suministrados cumplen con las especificaciones técnicas.
4. El clima en la zona no afecta el desarrollo de las actividades.
5. Los accesos al proyecto se encuentran en buen estado.

FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO

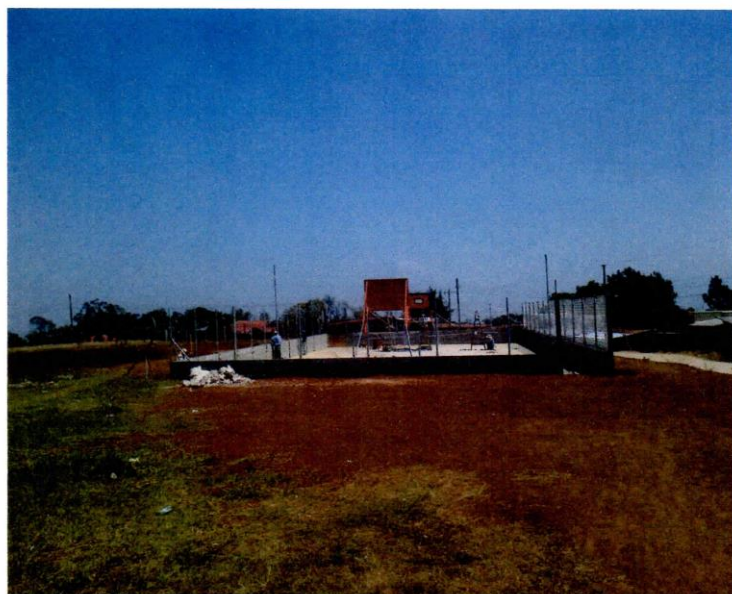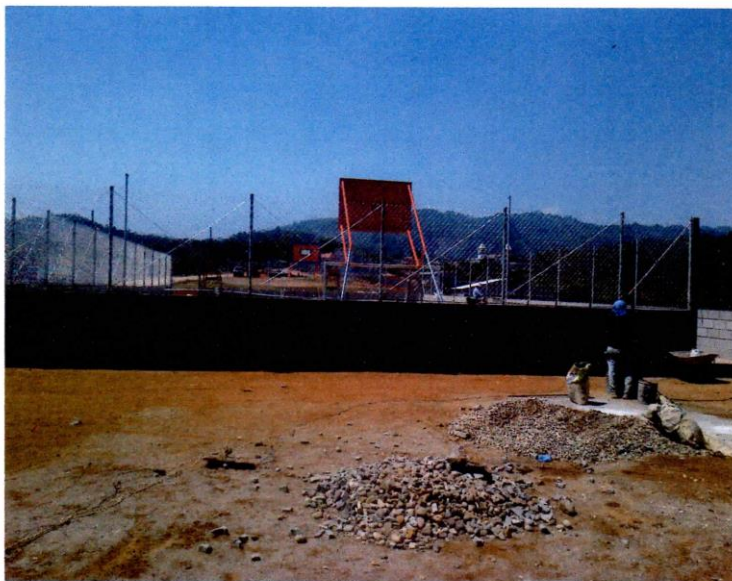

FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO TERMINADO



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|----------|-----|----------|
| CODIGO: COT-SANTA MARIA 1217-02-2014. | | QUINTA ESTIMACION DEL: | | 29/05/15 | AL: | 29/05/15 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: LA PAZ | | | | | | |
| MUNICIPIO: SANTA MARIA LA PAZ | | | | | | |
| ALDEA: LOS PLANES | | | | | | |
| FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD | | | | | | |
| CREDITO: | | LPS | | | | |
| Monto Inicial de Contrato | | 638,374.34 | | | | |
| Anticipo del 15% del Monto del Contrato | | 95,756.15 | | | | |
| Monto Acumulado por O/C | | -0.95 | | | | |
| Monto Acumulado por Adendum | | | | | | |
| Monto Final | | 638,373.39 | | | | |
| Monto de Cuarta Estimacion | | 8,400.00 | | | | |

VoBo

Coordinador UTI-MUNICIPALIDAD

| | | | | |
|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------|
| % DE AVANCE | FACTOR de Ret | % RETENCION | MONTO ANTICIPO | RETENCION |
|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------|

1260

Retencion Sobre Anticipo

| | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|
| UTILIDAD GLOBAL | MONTO ESTIM | UTILIDAD GLOBAL | UTILIDAD DEL PERIODO | I.S.R 12.5% |
|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

Nota: Maestro de obra con abonos a cuenta(Ver constancia)

RESUMEN

| | |
|---|-----------------|
| Monto Estimado | 8,400.00 |
| Menos Deducion de Anticipo | |
| Menos Deducion 5% Calidad de Obra | 420.00 |
| Menos Otras Deduciones I.SR en base a la utilidad | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR QUINTA ESTIMACION | 7,980.00 |

| | | |
|---|------------------|----------------|
| Monto de Anticipo | 95,756.15 | 100.00% |
| Amortizacion 1era,2DA Y 3ERA ESTIMACION | 95,756.15 | 100.00% |
| Amortizacion CUARTA ESTIMACION | | 0.00% |
| | | 0.00% |
| TOTAL AMORTIZADO | 95,756.15 | 100.00% |
| FALTA POR AMORTIZAR | -0.00 | 0.00% |

ESTIMACION
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
UTI-MAMCEPAZ.
PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA
LOS PLANES SANTA MARIA LA PAZ
SANTOS ALEXIS HERNANDEZ
COTI217-02-2014
5
29 DE MAYO DE 2015 (cierra)



| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | | EJECUTADO ACTUAL | | ACUMULADO FINAL | | % | |
|---|---|--------|----------|----------|------------|--------------------|------------|-------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|--------|
| | | | | | | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | | |
| A-MODULO DE CANCHA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TRAZADO Y MARCADO | M.L. | 92.00 | 23.00 | 2,116.00 | - | 2,116.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 2,116.00 | 100.00 | |
| 2 | EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) | M3 | 27.60 | 110.00 | 3,036.00 | - | 3,036.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 3,036.00 | 100.00 | |
| 3 | ACABRRO DE MATERIAL (DESPERDICO) | M3 | 34.50 | 180.00 | 6,210.00 | - | 6,210.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 6,210.00 | 100.00 | |
| 4 | CIMENTACION MAMPUESTERIA CON 5 CM. DE CANA ARENA | M3 | 27.60 | 1,400.00 | 38,640.00 | - | 38,640.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 38,640.00 | 100.00 | |
| 5 | RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) | M3 | 96.00 | 390.00 | 37,440.00 | - | 37,440.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 37,440.00 | 100.00 | |
| 6 | CANA ARENA COMPAC. E= 3 CM. | M3 | 24.00 | 650.00 | 15,600.00 | - | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 15,600.00 | 100.00 | |
| 7 | DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 30, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm | UNID | 36.00 | 313.00 | 11,268.00 | - | 11,268.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 11,268.00 | 100.00 | |
| 8 | DADO DE CONCRETO 35 X 40 X 30, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm | UNID | 4.00 | 537.80 | 2,151.20 | - | 2,151.20 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2,151.20 | 100.00 | |
| 9 | DADO DE CONCRETO 40 X 40 X 30, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm | UNID | 4.00 | 415.00 | 1,660.00 | - | 1,660.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1,660.00 | 100.00 | |
| 10 | SOLETA 15X15cm, 3B3, #2@20cm, CONC 1:2:2 | M.L. | - | 955.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | #DNV/01 | |
| 11 | CASTILLO 15X15, 3 No. 3 Y No. 2 @ 20 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 48.02 | 355.00 | 17,047.10 | - | 17,047.10 | 0.00 | 0.00 | 48.02 | 17,047.10 | 100.00 | |
| 12 | CASTILLO 15X15 4 NÚ3 Y No. 3 @ 15 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 8.00 | 373.00 | 2,984.00 | - | 2,984.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2,984.00 | 100.00 | |
| 13 | PARED DE BLOQUE SIMPLE SISAÑO DE 15cm | M2 | 95.49 | 448.50 | 42,827.27 | - | 42,827.27 | 0.00 | 0.00 | 95.49 | 42,827.27 | 100.00 | |
| 14 | SOLETA 10X15 2B3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 | M.L. | 92.00 | 190.00 | 17,480.00 | - | 17,480.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 17,480.00 | 100.00 | |
| 15 | LOSA CONC. CAN. BALON C/ACERO TEMP. NÚ2 A 35 A.S. | M2 | 480.00 | 566.00 | 271,680.00 | - | 271,680.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 271,680.00 | 100.00 | |
| 16 | CUARDO DE LOSA | M2 | 480.00 | 13.50 | 6,480.00 | - | 6,480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 6,480.00 | 100.00 | |
| 17 | JUNTA ASFALTICA PARA LOSA (ESPESOR 15 CMS) | M.L. | 186.00 | 39.50 | 7,347.00 | - | 7,347.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 7,347.00 | 100.00 | |
| 18 | PARALELES DE TUBO HS LIVIANO DE 2 1/2" | UNID | 2.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 16,000.00 | 100.00 | |
| 19 | TABLERO MACHI, ANGULO HIERRO (1.2X1.3/AMD.1) | UNID | 2.00 | 2,670.00 | 5,340.00 | - | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5,340.00 | 100.00 | |
| 20 | MARCAO DE CANCHA | GLOBA | 1.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | - | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,800.00 | 100.00 | |
| 21 | LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES | M2 | 480.00 | 6.50 | 3,120.00 | - | 3,120.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 3,120.00 | 100.00 | |
| 22 | INST. MALLA P. DOB. REF. CALIBRE 10 (PEDIDO ESPECIAL) | M.L. | 122.40 | 517.51 | 63,343.22 | - | 63,343.22 | 0.00 | 0.00 | 122.40 | 63,343.22 | 100.00 | |
| 23 | PORTON MALLA CILCON 6 Y TUBO HS 1-1/2" | UNID | 2.00 | 4,935.00 | 9,870.00 | - | 9,870.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 9,870.00 | 100.00 | |
| 24 | ALAMBRE DE PUAS SUM/INSTAL | M.L. | 276.00 | 52.60 | 14,517.60 | - | 14,517.60 | 0.00 | 0.00 | 276.00 | 14,517.60 | 100.00 | |
| SUB-TOTAL | | | | | | 697,959.39 | | 697,959.39 | | | 697,959.39 | 100.00 | |
| B-MODULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ACOMETIDA ELECTRICA ARENA CABLE TRIPLEX #6 | M.L. | 50.00 | 125.00 | 6,250.00 | - | 6,250.00 | 38.80 | 4,850.00 | 11.20 | 1,400.00 | 6,250.00 | 100.00 |
| 2 | BASE PARA CONTADOR (10 AMPERIOS) | UNID | 1.00 | 600.00 | 600.00 | - | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 600.00 | 100.00 | |
| 3 | CENTRO DE CARGA DE 4 ESPACIOS | UNID | 1.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1,400.00 | 100.00 | |
| 4 | POULICETO DE 1" (SUMINISTRO) | M.L. | 40.00 | 10.00 | 400.00 | - | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 400.00 | 100.00 | |
| 5 | CABLE THHN 8. (SUM/INST) | M.L. | 120.00 | 50.00 | 6,000.00 | - | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 6,000.00 | 100.00 | |
| 6 | REFLECTOR PARA CANCHA MULTI-USOS INCLUIE POSTESTIUBO HS | UNID | 2.00 | 7,250.00 | 14,500.00 | - | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 14,500.00 | 100.00 | |
| SUB-TOTAL | | | | | | 28,150.00 | | 28,150.00 | | | 28,150.00 | 100.00 | |
| C-MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS | | | | | | | | | | | | | |

ESTIMACION
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ
 UTI-MAMCEPAZ.
 PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA
 LOS PLANES SANTA MARIA LA PAZ
 SANTOS ALEXIS HERNANDEZ
 COTI1217-02-2014

PROYECTO:
 UBICACION:
 EJECUTOR:
 CODIGO:
 ESTIMACION N°
 PERIODO DEL:

28 DE MAYO DE 2015. (cierre)

| N° | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | | EJECUTADO ACTUAL | | ACUMULADO FINAL | | % |
|----|-------------------------|--------|----------|--------|---------------|--------------------|-------------|------------------|-------|-----------------|---------------|--------|
| | | | | | | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | |
| 3 | CORTE CON RETROCAMADORA | M3 | 64.00 | 176.00 | L. 11,264.00 | 64.00 | 11,264.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 11,264.00 | 100.00 |
| | SUB-TOTAL | | | | L. 11,264.00 | | 11,264.00 | - | - | | 11,264.00 | 100.00 |
| | TOTAL..... | | | | L. 638,373.39 | L. 638,373.39 | L. 6,400.00 | | | L. 638,373.39 | L. 638,373.39 | 100.00 |

CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: ING ELI ANIBAL NICOLAS RUIRAL DE MAMCEPAZ CIUDAD DE LA PAZ

FECHA: 28/05/2015

SUPERVISOR

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a la obra de construcción de la cancha polideportiva de los planes de Santa María de la Paz, en cumplimiento de las condiciones generales de contratación que se encuentran en el expediente de contratación N° COTI1217-02-2014, solicito se proceda a pagar al contratista para lo cual firmo y presento.

FIRMA:

NOMBRE: ING ELI ANIBAL NICOLAS RUIRAL DE MAMCEPAZ CIUDAD DE LA PAZ

FECHA: 28/05/2015

