



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09534

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 73886661

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 149,548.02

PAGUESE A: Cristian Emmanuel Molina Urquiza yuchacan 04/100

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento cuarenta y nueve mil Seiscientos Cuarenta  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>04</u>

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y Comunit.</u>	<u>149,548.</u>	<u>02</u>
<u>01</u>	<u>Servicios de Educacion</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Adicion y mejora de Edificios y obab.</u>		
<u>461</u>	<u>Const. Adicion y mejora de Edificios.</u>		
<u>04</u>	<u>Reparacion de Aula C.E.B Manuel Bonilla. El Naranjo.</u>		
	<u>Pago de Primeru Estimacion de Dicho Proyecto.</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<u>149,548.</u>	<u>02</u>

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

Fecha 04/09/2018.

Firma del Responsable del Subprograma \_\_\_\_\_



Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto \_\_\_\_\_



Recibido por (f) \_\_\_\_\_



Identidad No. 1702-19307-0000

Solvencia No. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 04 de Septiembre del 2018.

Recibo por: Lps. 149,548.02

Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de Ciento cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y ocho Lempiras con 02/100.

(Lps. 149,548.02 ) correspondiente al pago de la Estimación, # 01 de \_\_\_\_\_ del proyecto

Reparacion de Aula C.E.B Manuel Bonilla el Naranjo

Con Numero 04 Ubicado en El Naranjo Municipio De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

<b>MONTO ESTIMADO</b>	<u>157,418.96</u>
-Menos deducción de anticipo	
-Menos deducción de ISR	
-Menos 5% Calidad de Obra	<u>7,870.95</u>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	<u>149,548.01</u>

Firma del Contratista: 

Nombre del cotrastista: Emanuel Molina

Identidad #: 1208-1987-00001

**Cristian Enmanuel Molina Urquia**  
Cel. 9785-5990 / R.T.N. 12081987000010

CAI:42183B-A6902E-B04295-653E6F-B2405B-05

Marcala, La Paz

E-mail:crisenmol1987@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS  
N° 000-001-04-00000060

Fecha, 04 de SEPTIEMBRE del 2018

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

R.T.N. 12179003434704

La cantidad de: CIEN TO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO<sup>02</sup>

Por concepto de: PAGO PRIMERA ESTIMACIÓN DE PROYECTO

REPARACION DE AULAS CEB MANUEL BOLAÑOS

Total por Honorarios L.	<u>149,548.02</u>
Total Neto Recibido L.	<u>149,548.02</u>

INGENIERO CIVIL  
28-01-18

Fecha Limite de Emisión:29/05/2019

Rango otorgado:000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Imp. La Independencia, Bo. Abajo, Frente a las Oficinas de la E.N.E.E., Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Firma

11-304-00061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9665-2258  
2754-8970


CHEQUE No. 73886661

PLANES, LA PAZ 04-Septiembre-2018  
Lugar y Fecha

Cristian Emmanuel Molina Urquiza L 149,548.02  
Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y nuevemil quinientos cuarenta y ocho lemp.  
Cantidad en letras 02/00 Lempiras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS C.A.

  
Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆7388666⑆

IRB Document of Honduras S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:		COT121705-2018				
NOMBRE DEL PROYECTO:		REPARACION DE AULAS CEB MANUEL BONILLA				
DEPARTAMENTO:		LA PAZ				
MUNICIPIO:		SANTA MARIA				
ALDEA:		EL NARANJO				
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	22/08/2018	AL:	04/09/2018	
CREDITO:		LPS				
	Monto Inicial de Contrato	179,501.23				
	Anticipo del 20% del Monto del Contrato					
	Monto Acumulado por O/C					
	Monto Acumulado por Adendum					
	Monto Final	179,501.23				
	Monto de Primera Estimacion	157,418.96				

VoBo

Ing. Luha Medina

SUPERVISOR MAMCEPAZ



	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	87.70%	1.25	110%	0.00	0.00
					179,501.23

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIODO	I.S.R 12,5%
#j DIV/0!		#j DIV/0!	#j DIV/0!	#j DIV/0!
<b>EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA</b>				

RESUMEN


Monto Estimado	157,418.96
Menos Deducion de Anticipo	0.00
Menos Deducion I.S.R 12.5%	0.00
Menos Otras Deduciones (5% calidad de obra )	7,870.95
<b>TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION</b>	<b>149,548.02</b>

Monto del Anticipo	0.00	#j DIV/0!
Amortizacion 1era ESTIMACION	0.00	#j DIV/0!
		#j DIV/0!
		#j DIV/0!
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>0.00</b>	<b>#j DIV/0!</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>0.00</b>	<b>#j DIV/0!</b>

EJECUTOR NO SOLICITO ANTICIPO

ESTIMACION  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ  
PROYECTO: REPARACION AULAS CEB MANUEL BONILLA  
UBICACIÓN: EL NARANJO, SANTA MARIA, LA PAZ  
EJECUTOR: ING CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA  
ESTIMACION Nº 1  
PERIODO DEL: 22 DE AGOSTO 2018 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		% D AVAN
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	DESMONTAJE DE LAMINA TECHO (ESTRUC. EXISTENTE)	M2	199.88	36.30	7,255.64		-	199.88	7,255.64	199.88	7,255.64	100
2	SOLERA 10X20 Cms, 2#3, #2@20 Cms: CONCRETO 1:2:2	M.L	98.08	212.91	20,882.21		-	98.08	20,882.21	98.08	20,882.21	100
3	SOLERA 15X20 4Nú3 Y Nú2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	34.08	230.63	7,859.87		-	34.08	7,859.87	34.08	7,859.87	100
4	TECHO CANALETA 6" LAMINA ALUMINIZADA INDUSTRIAL 8'	M2	199.88	452.97	90,539.64		-	199.88	90,539.64	199.88	90,539.64	100
5	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 10 CM	M2	26.46	411.27	10,882.20		-	26.46	10,882.20	26.46	10,882.20	100
6	ENTABICADO BLOQUE 15cm (REPELLO/PULIDO)MORT 1:6	ML	34.82	156.16	5,437.49		-	34.82	5,437.49	34.82	5,437.49	100
7	Viga Metalica, Canaleta Doble L=5.6, H=0.85m	UNID	2.00	4,002.91	8,005.82		-	2.00	8,005.82	2.00	8,005.82	100
8	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	52.91	123.91	6,556.08		-	52.91	6,556.08	52.91	6,556.08	100
9	PINTURA DE ACEITE	M2	52.91	65.13	3,446.03		-	-	-	-	-	
10	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ø	M.L	60.00	63.84	3,830.40		-	-	-	-	-	
11	LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 40W (SUM/INST)	UNID	8.00	1,850.73	14,805.84		-	-	-	-	-	
<b>TOTAL COSTO DEL PROYECTO</b>					<b>179,501.23</b>		-	<b>157,418.96</b>		<b>157,418.96</b>		<b>80</b>

		
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: CRISTIAN ENMANUEL MOLINA U.	NOMBRE: LUHA MEDINA RAMOS	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ
FECHA: 04 SEPTIEMBRE 2018	FECHA: 04 SEPTIEMBRE 2018	FECHA: 04 SEPTIEMBRE 2018

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 04 de Agosto del 2018.

GABINO ARGUETA GALVEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARIA LA PAZ  
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del  
proyecto: **REPARACION AULAS CEB  
MANUEL BONILLA, EL NARANJO SANTA  
MARIA**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 22 de Agosto al 04 de Septiembre del 2018.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

  
**ING LUHA MEDINA**  
Supervisor De Infraestructura.  
Mamcepaz.





RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>		REPARACION DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA MANUEL BONILLA		
<b>UBICACIÓN:</b>		ALDEA DE EL NARANJO, SANTA MARIA, LA PAZ		
<b>BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:</b>		El proyecto consiste en la reparación de dos aulas en el CEB Manuel Bonilla, en el cual se le instalara un nuevo techo con estructura metálica de canaleta de 2x6 legitima, se instalaran elementos de concreto para fijar el techo, se instalarán paredes en ciertos tramos, entabicados con el objetivo de mejorar la altura de las paredes.		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ		
INVERSION DEL PROYECTO:				
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 179,501.23	L. 0.000	L, 0.00	L. 179,501.23
COSTO DE SUPERVISION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 0.00
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>L. 179,501.23</b>

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
<b>NOMBRE DEL EJECUTOR:</b>	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA
<b>SUPERVISION</b>	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: ELY ANIBAL NICOLAS MORALES.
CONTRATO ORIGINAL	
<b>FECHA DE FIRMA DE CONTRATO</b>	22 DE AGOSTO DEL 2018

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803



FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	NO HAY
FECHA DE ORDEN DE INICIO	22 de Agosto del 2018
PLAZO CONTRACTUAL	90 días
FECHA DE FINALIZACION	22 de Noviembre del 2018

**1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.**

**OBRA EJECUTADA:** se prepara el informe que corresponde a la estimación número uno del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 87.70% en desmontaje de techo, solera de 10x20, solera de 10x15, instalación de techo de canaleta de 6", pared de bloque simple, entabicado de bloque de 15, viga metálica y repello y pulido de paredes.

PRESENTANDO UN AVANCE FISICO DE UN 87.70%

**SITUACIONES PRESENTADAS:**

No hay

**SOLUCIONES PROPUESTAS:**

No Hay.

**CALIFICACION AL CONTRATISTA:**

El ejecutor es un maestro de obra con experiencia para lo cual se le ha contratado, el cual no se le dificulta el avance en las actividades contratadas.

**PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:**

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor



#### **1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVICION.**

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.


1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Instalación y construcción presentada a la fecha.


**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**

---



## **FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO**

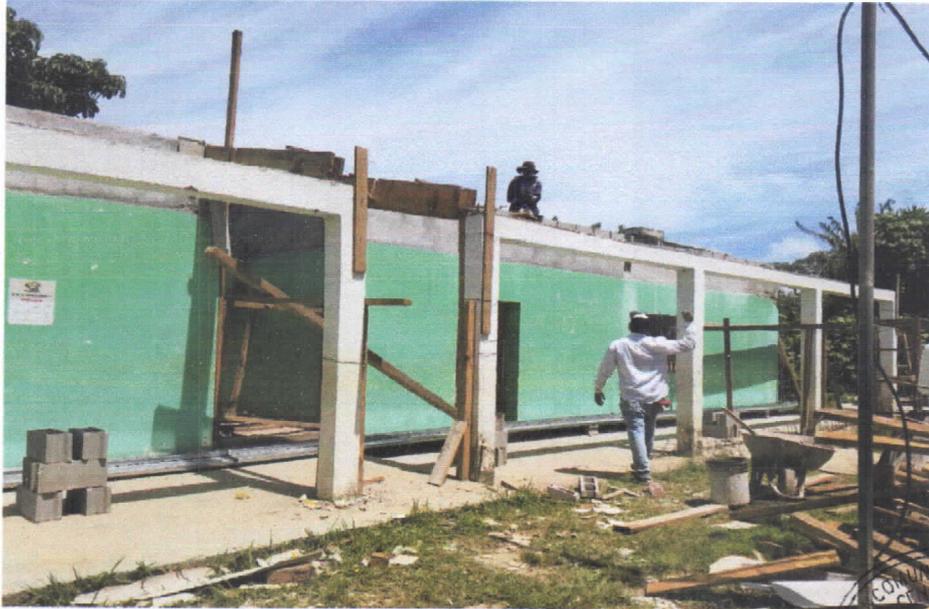

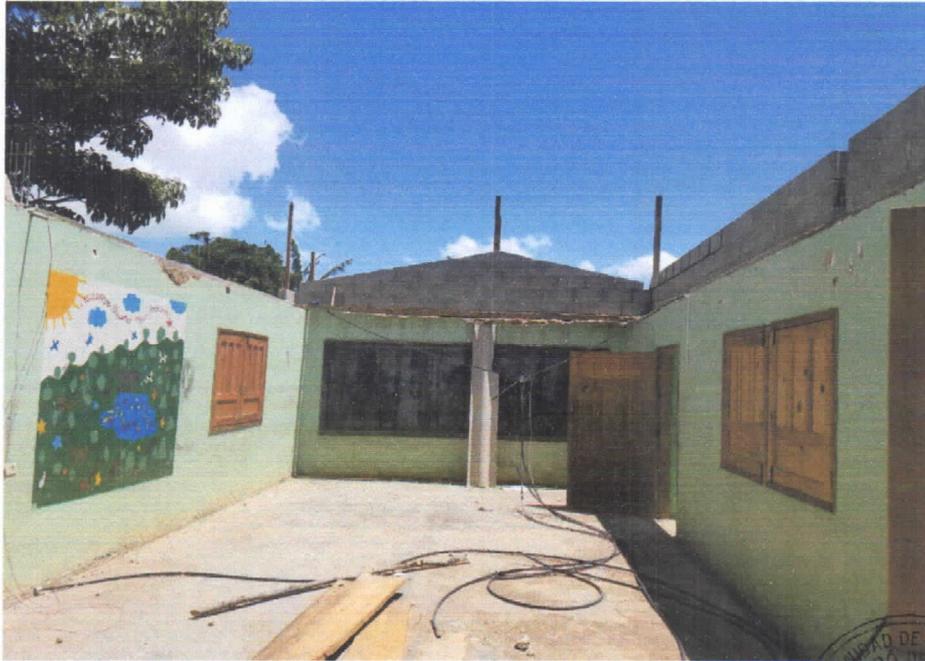

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**

