



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09838

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 74472977
Valor Efectivo: _____

Lps. 278,337.25

PAGUESE A: Juan Gabriel Arqueta Montoya 25/10
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos Setenta y ocho mil trescientos treinta y siete
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 11	COD. 06	COD. 01	COD. 36

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
06	Infraestructura Municipal	L.	278,337.25
01	Const. Supervision obras y vias de com.		
11	Fondos Propios		
400	Bienes Capitalizables		
460	const. edificacion y mejora obras urbanist.		
466	Const. aduopos y mejores de calles y Puentes		
36	Construccion Puente Rio Carrizal		
	Los Posos.		
	pago de Primera Estimación		
	de Avance de obra de		
	dicho Proyecto.		
TOTAL A PAGAR		L.	278,337.25

Fecha 20-12-2018

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) Juan Gabriel Arqueta

Identidad No. 1212-1977-00090

Solvencia No. _____



EN.A.G. Tel.: 2230-5767. R.T.N. 08019999408325

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 22 de Diciembre del 2018.

Recibo por: Lps. 278,337.25

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de Doscientos Setenta y ocho mil trescientos treinta y siete lempiras con 25/100 (Lps. 278,337.25) correspondiente al pago de la Estimación, # 01 de Avance de obra del proyecto Construcción Puente Rio Carrizal

Con Numero 36 Ubicado en Los Posos Municipio De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. 365,032.46
-Menos deducción de anticipo	68,443.59
-Menos deducción de ISR	- - -
-Menos 5% Calidad de Obra	18,251.62
MONTO NETO A PAGAR	L. 278,337.25

Firma del Contratista: 



Nombre del cotrastista: Juan G. Argueta Montoya

Identidad #: 1212-1977-00090

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO		COT121707-2018			
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL			
DEPARTAMENTO:		LA PAZ			
MUNICIPIO:		SANTA MARIA			
UBICACION:		LOS POZOS			
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	26/11/2018	AL:	17/12/2018
		LPS			
	Monto Inicial de Contrato	776,610.70			
	Anticipo Neto Entregado	116,491.61			
	Monto Acumulado por O/C				
	Monto Acumulado por Adendum				
	Monto Final	776,610.70			
	Monto de primera Estimacion	L. 365,032.46			

VoBo

SUPERVISOR DE PROYECTO
MAMCEPAZ



	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	47.00%	1.25	59%	116,491.61	68,443.59
				776,610.70	

Retencion de Impuesto Sobre La Renta	UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIOD	I.S.R 12,5%

RESUMEN

Monto Estimado	365,032.46
Menos Deducion de Anticipo	68,443.59
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	18,251.62
Menos Impuesto Sobre La Renta	
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	278,337.25

Monto del Anticipo	116,491.61	15.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	68,443.59	58.75%
TOTAL AMORTIZADO	68,443.59	58.75%
FALTA POR AMORTIZAR	48,048.02	

ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MAMCEPAZ)

PROYECTO: PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL

UBICACION: COMUNIDAD DE LOS POSOS

EJECUTOR: JUAN GABRIEL ARGUETA

ESTIMACION: 1
PERIODO DEL: 26/11/2018 HASTA 17/12/2018

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	DESUDIO DE FUENTE P/D.T. CON PEONES	GLB	1.00	L. 9,680.00	L. 9,680.00		0.00	1.00	9,680.00	1.0	9,680.00	100.00%
2	DESUDIO PROVISIONAL CON RETROEXCAVADORA	HRS	10.00	L. 1,200.00	L. 12,000.00		0.00	10.00	12,000.00	10.0	12,000.00	100.00%
3	TRAZADO Y MARCADO	M.L	24.00	L. 20.15	L. 483.60		0.00	24.00	483.60	24.0	483.60	100.00%
4	EXCAVACION MATERIAL TIPO II (MATERIAL SEMI-DURO)	M3	27.17	L. 334.71	L. 9,094.07		0.00	27.17	9,094.08	27.2	9,094.08	100.00%
5	ACARREO DE MATERIAL (SIN VOLQUETA)	M3	29.90	L. 172.34	L. 5,152.97		0.00	29.90	5,152.97	29.9	5,152.97	100.00%
6	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	24.41	L. 2,059.46	L. 50,271.42		0.00	24.41	50,271.33	24.4	50,271.33	100.00%
7	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	68.37	L. 2,563.11	L. 175,239.84		0.00	68.37	175,239.61	68.4	175,239.61	100.00%
8	ENCOFRADO DE LOSA MONOLITICA PARA PUENTE	M2	48.00	L. 1,758.67	L. 84,416.16		0.00	48.00	84,416.38	48.0	84,416.38	100.00%
9	DEENCOFRADO ELEMENTOS DE CONCRETO	M3	48.00	L. 141.12	L. 6,773.76		0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00%
10	CURADO DE LOSA	M2	48.00	L. 18.04	L. 865.92		0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00%
11	CONCRETO DE 280 KG/CM (PARA LOSA E=35CM).	M3	16.80	L. 6,157.59	L. 103,447.51		0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00%
12	BARANDAL PRETIL TIPO SOPTRAVI DE 20X25 6#8,#4@30CM	M.L	60.87	L. 1,775.90	L. 108,099.72		0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00%
13	pozh	M3	250.00	L. 545.23	L. 136,307.50		0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00%
14	SUMIN/INSTAL VARILLA LONGITUDINAL #8@13.0CM(BARRAS A y B; VARILLA TRANSVERSAL (BARRAS C #5@25CM EN LOSA DE ACUERDO A PLANOS	M2	48.00	L. 1,557.88	L. 74,778.24		0.00	12.00	18,694.50	12.0	18,694.50	25.00%
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					L. 776,610.70		L. 0.00		L. 365,032.46		L. 365,032.46	47.00%

EJECUTOR	SUPERVISION MAMCEPAZ	ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: JUAN GABRIEL ARGUETA	NOMBRE: LUHA MEDINA RAMOS	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ
FECHA: 17 DE DICIEMBRE 2018	FECHA: 17 DE DICIEMBRE 2018	FECHA: 17 DE DICIEMBRE 2018

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 17 de Diciembre del 2018.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCION PUENTE RIO
CARRIZAL, COMUNIDAD LOS POZOS,
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA,
DEPARTAMENTO LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la mancomunidad "MAMCEPAZ", me permito entregar el INFORME N°1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 26 de Noviembre al 17 de Diciembre del 2018.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING LUHA MEDINA
Supervisor de Infraestructura.
Mamcepaz.



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL.		
UBICACIÓN:		COMUNIDAD DE LOS POZOS, SANTA MARIA, LA PAZ		
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		El proyecto consiste en la construcción de un puente con muros de mampostería y losa con pretilas.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ		
INVERSION DEL PROYECTO:				
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 776,610.70	L. 776,610.70	L. 0.00	L. 776,610.70
COSTO DE SUPERVISION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 776,610.70

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	ING. JUAN GABRIEL ARGUETA
SUPERVISION	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ "MAMCEPAZ" ING ASIGNADO: LUHA MEDINA.
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	23 DE AGOSTO 2018
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
FECHA DE ORDEN DE INICIO	31 DE AGOSTO DEL 2018

PLAZO CONTRACTUAL	90 días
FECHA DE SUSPENSION	17 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE REINICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2018

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA: se prepara el informe que corresponde a la estimación número uno del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 47 % que comprenden actividades ejecutadas al 100% tales como: desvió de puente p/o.t con peones, Desvió provisional con retroexcavadora, trazado y marcado, excavación material tipo II (material semi-duro), acarreo de material (sin volqueta), cimentación de mampostería y encofrado de losa monolítica para puente.

PRESENTANDO UN AVANCE FISICO DE UN 47%

SITUACIONES PRESENTADAS:

Se realizó un suspensión del proyecto debido a una crecida del rio lo que impedía avanzar con las obras.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Se decidió suspender el proyecto teniendo este una orden de reinicio para el día 26 de noviembre del 2018

CALIFICACION AL CONTRATISTA:

El ejecutor es un Ingeniero Civil colegiado con experiencia para lo cual se le ha contratado, el cual no se le dificulta el avance en las actividades contratadas.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.



La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.




FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

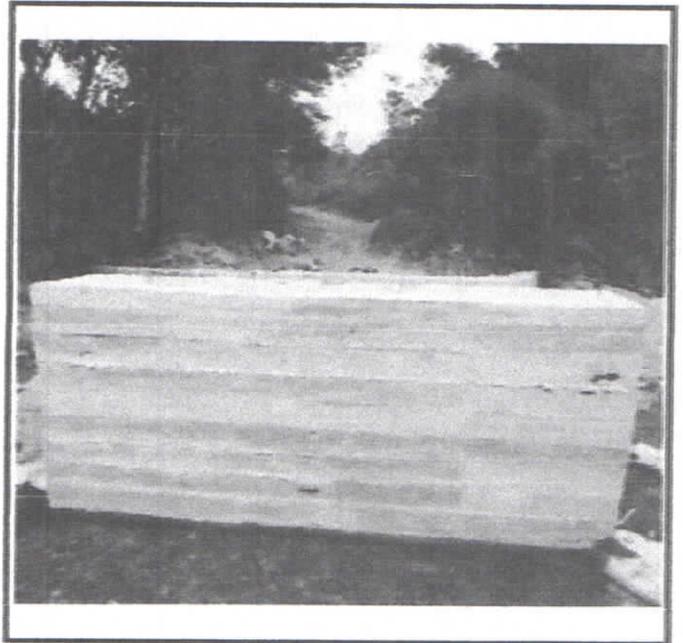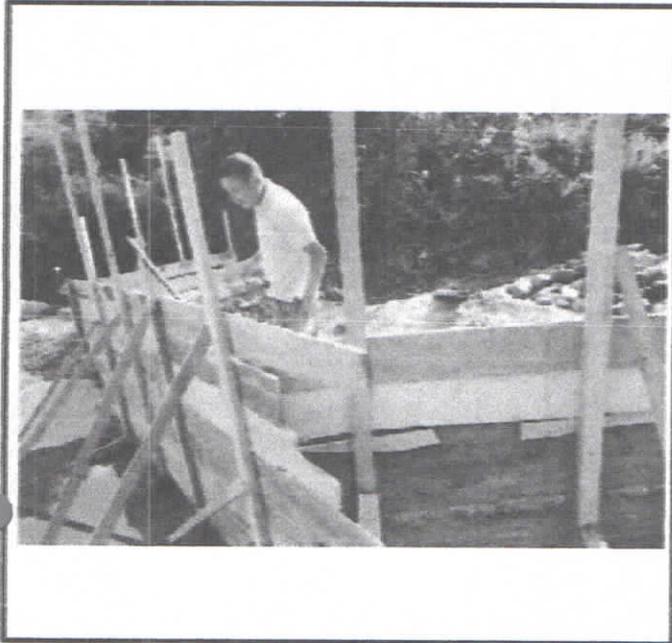

FOTOS I ESTIMACION PROYECTO: PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL

Observación fotografía Superior: FOTOGRAFIAS PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL
Superior derecha: FOTOGRAFIAS PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL

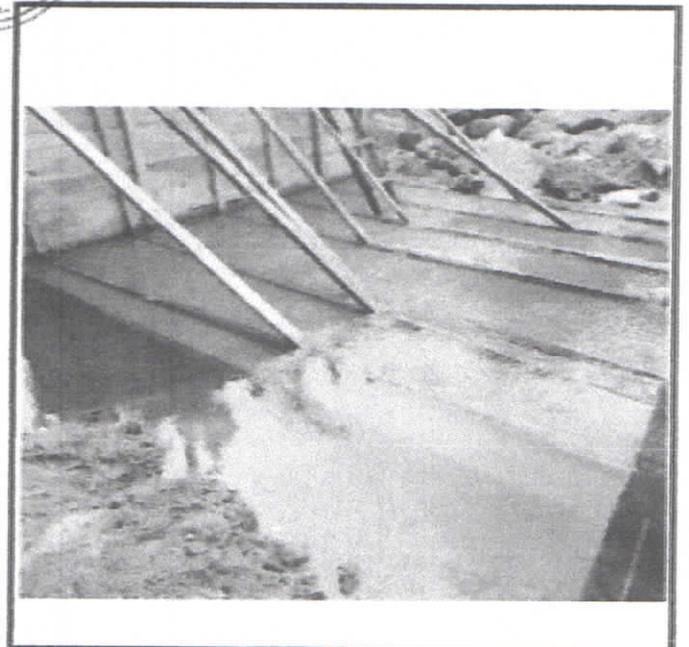

Observación fotografía Inferior: FOTOGRAFIAS PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL
Inferior derecha: FOTOGRAFIAS PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: municipalidadesantamarialapaz@yahoo.es
Tel. 2717-7803

REACTIVACION DE PROYECTOS.

Código: **COT-1217-06-2018**

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION PUENTE RIO CARRIZAL**

Ubicación **COMUNIDAD DE LOS POSOS , Santa María la Paz.**

Por medio de la presente en esta fecha se procede a la reactivación del proyecto antes mencionado, en vista que las condiciones climáticas permiten el desarrollo de las actividades en sitio, y se da la orden de reinicio para poder concluir las obras y dejar concluido el proyecto en un 100%.

Se le dan 5 días a la empresa a partir de la fecha para presentarse con el equipo y el personal para dar seguimiento a las obras contratadas.

Los Planes, Santa María, la paz, 22 de Noviembre de 2018.


Edna Medina
MAMCEPAZ
UTI-MAMCEPAZONDURAS, C.A.



1-30 000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
3865-2258
2754-8970


CHEQUE No. 74472911


PLANES, LA PAZ 20 Diciembre 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Juan Gabriel Argueta Montoya L 278,337.25

= Doscientos Setenta y ocho mil trescientos treinta y siete ^{25/100} Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆0 304079⑆00 1 30400006 1 1 74472911

REG. Direccion de Impuestos S.A. de C.V.

JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

San José, La Paz, Honduras. C.A.

Cel. 9928-6442 / Correo: juanargueta81@gmail.com

CAI: 0C88CF-4D883B-A049A4-EEE664-1090C1-BA

RTN: 12121977000908
BOLETA DE VENTA N°
000-001-02-00000114

Cliente Municipalidad de Santa Maria La Paz

Dirección Santa Maria La Paz RTN 121219003434704

DIA	MES	AÑO
20	12	2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS.
1	Construcción de Puente Rio Canizal Comunidad de los Pasos, Santa Maria La Paz		278,337.25

Original: Cliente - Copia 1: Archivo

[Handwritten Signature]
FIRMA



Cant en Letras doscientos setenta y ocho mil

trescientos treinta y siete pesos con 25/100

TOTAL L. 278,337.25

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón,
 Sanayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142
 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2018

Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 / 000-001-02-00000160
