



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 10092

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 75254578
Valor Efectivo: _____

Lps. 25,798.25

PAGUESE A: Yessica Del Socorro Medina Claros
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Veinticinco Mil Setecientos Noventa y Ocho con 25/100
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>38</u>

Gasto Corriente _____
Gasto de Inversión Social _____
Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social, Cultural y Com.</u>	<u>l. 25,798.25</u>	
<u>01</u>	<u>Servicio de Educacion</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Adición y Mejora de Edif. y O. Urbanis.</u>		
<u>469</u>	<u>Construcciones, adiciones y mejoras de O.U</u>		
<u>38</u>	<u>Construcción de Modelo Sanitario</u>		
	<u>Esc. Jose Ceilio del Valle, Sta. Maria.</u>		
	<u>Pago de Segunda Estimación de avance de obra de dicho Proyecto.</u>		
	TOTAL A PAGAR	<u>l. 25,798.25</u>	

EN.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Fecha 13-05-2019.

Firma del Responsable del Subprograma _____ Firma y Sello del Encargado del Presupuesto _____




Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) Yessica Del Socorro Medina Claros

Identidad No. 1201-1985-00481

Solvencia No. _____



Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 73 de Mayo del 2019.

Recibo por: Lps. 25,798.25

Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de

Veinticinco Mil Setecientos Noventa
y Ocho Lempiras con 25/100

(Lps. 25,798.25) correspondiente al pago de la Estimación,

02 de Avance de obra del proyecto

Construcción de Modulo Sanitario
Escuela Jose Cecilio del Valle

Con Numero 38 Ubicado en Casco Urbano Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	<u>L. 27,756.05</u>
-Menos deducción de anticipo	
-Menos deducción de ISR	
-Menos 5% Calidad de Obra	<u>L. 1,357.80</u>
MONTO NETO A PAGAR	<u>L. 25,798.25</u>

Firma del Contratista: 

Nombre del cotrastista: Jessica del Socorro Medina Claros

Identidad #: 101-1985-0049

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803



Santa María la Paz, 13 de mayo del

2019

FRANCIS LOANY VÁSQUEZ URQUIA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
Su oficina.

Estimada:


Se remite la documentación de Calidad de obra del proyecto **CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ**, de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Dicha documentación consta de:

- ESTIMACIÓN SOLICITADA
- INFORME DE ESTIMACIÓN
- TABLA DE RETENCIONES
- PAGO A CUENTA CON FECHAS VIGENTES
- FOTOCOPIA DE IDENTIDAD
- FOTOCOPIA DE RTN
- FOTOCOPIA DE BITÁCORA CON LA ULTIMA ESTIMACIÓN BITÁCORA ORIGINAL
- BOLETA CAI VIGENTE.
- FOTOGRAFÍAS DETALLANDO EL AVANCE MÍNIMO 3 HOJAS, 8 FOTOGRAFÍAS.
- NOTA DE REMISIÓN A TESORERÍA POR LA SUPERVISIÓN.

ESTIMACIÓN	MONTO PAGADO	RETENCIÓN CALIDAD DE OBRA	MONTO TOTAL	DE	AL
PRIMERA	L 252,445.81	L 13,286.62	L 265,732.44	5/2/2019	9/4/2019
SEGUNDA	L 25,798.25	L 1,357.80	L 27,156.04	10/4/2019	19/4/2019
TOTAL	L 278,244.06	L 14,644.42	L 292,888.48		

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING. LUIS AMADOR
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA SANTA MARÍA

11-304-00061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9665-2258
2754-8970


CHEQUE No. 75254518

PLACES, LA PAZ 13 de Mayo 2019
Lugar y Fecha

Jessica del Socorro Medina claros 25,798.25
Páguese a la orden de

Veinticinco mil Setecientos Noventa y ocho con 25/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firmado



⑆0 304079⑆00 1130400006 11 75254518

RD Dominican Republic, S.A. de C.V.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-26130

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEDINA CLAROS YESSICA DEL SOCORRO**
Con Registro Tributario Nacional: **12011985004816**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-26130 en fecha 13/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25712737416 de fecha 06/05/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 27714054706, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 01/07/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-26130** o mediante el siguiente código QR:




REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

YESSICA DEL SOCORRO / MEDINA CLAROS




HONDURENSE POR NACIMIENTO
NACIO EL: 27 MARZO 1985
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 03 SEPTIEMBRE 2004



1201-1985-00481

ARTICULO 10A LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: El registro de identidad es obligatorio para todas las personas que residen en el territorio de la República de Honduras y para quienes se encuentren en el territorio de la República de Honduras en virtud de un permiso de ingreso otorgado por el Poder Ejecutivo. La inscripción de este artículo tiene lugar a la solicitud correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.




SOLICITADA EN 1201

YESSICA DEL SOCORRO / MEDINA CLAROS

1201-1985-00481




 República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional


RTN: 12041985004816

YESSICA DEL SOGORRO MEDINA GUAROS
 Nombre o Razón Social


Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores-Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licorés
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licorés
Imprentas	Importador Alcoholes Licorés
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20.11.0209

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2007, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 38 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 del 19 de Abril de 2003, Art. 8 del Decreto de Ley N° 117 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial, la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Prestamía No Bancario Acuerdo 43 publicada el 13 de Enero de 1973.



 Director Ejecutivo



 Jefe de Departamento Asistencial
 Copribuyona


Señor contribuyente resuere su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412-584615 Transacción: BB7B4A

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	COT121701-2019		
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE		
DEPARTAMENTO:	LA PAZ		
MUNICIPIO:	SANTA MARIA		
ALDEA:	UBICADO EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ		
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEGUNDA ESTIMACION DEL:	19/4/2019
			AL:
			10/4/2019
CREDITO:	LPS		
	Monto Inicial de Contrato	L	298,638.68
	Monto Acumulado por O/C	-L	5,750.20
	Monto Acumulado por Adendum		
	Monto Final	L	292,888.48
	Monto de Segunda Estimacion	L	27,156.04

VoBo


SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
9.09%	1.25	11%		

Retencion Sobre Anticipo L 27,156.04
L 298,638.68

FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
1.050	5.00%	27,156.04	1,357.

Retencion de Calidad de obra L 27,156.04
L 292,888.48

RESUMEN

Monto Estimado	L 27,156.04450
Menos Deducion de Anticipo	
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 1,357.79623
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	L 25,798.25

Monto del Anticipo	
NO HAY ANTICIPO	
TOTAL AMORTIZADO	
FALTA POR AMORTIZAR	

Santa María la Paz, 03 de mayo del 2019.

GABINO ARGUETA GÁLVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARÍA LA PAZ
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
SANITARIOS, ESCUELA JOSÉ CECILIO
DEL VALLE CASCO URBANO SANTA
MARÍA LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, me permito entregar el INFORME N°1,
para Orden De Cambio del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUIS AMADOR
Supervisor de infraestructura
ALCALDÍA

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS			
UBICACIÓN:	ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO SANTA MARÍA LA PAZ			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	Construcción de módulos sanitarios para escuela. El cual consta de 3 sanitarios para niñas, dos sanitarios para varones y dos urinarios. Con un lavamanos.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal			
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCTURA	L 298,638.68	L 298,638.68	-L 5,750.20	L 292,888.48
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L 292,888.48

1.2- INFORMACIÓN CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):	ING. YESSICA MEDINA CLAROS
SUPERVISIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	SIN ANTICIPO
FECHA DE ORDEN DE INICIO	MARTES 05 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO CONTRACTUAL	75 días
FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	VIERNES 19 DE ABRIL 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA	DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA: se prepara el informe que corresponde a la estimación número dos del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 100% de las actividades del proyecto.

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 100%

SITUACIONES PRESENTADAS:

Suelo donde se pretendía realizar la excavación para el pozo séptico es material duro. Según el artículo 122 de la ley de contratación del estado no se puede exceder del 10% del monto original del contrato.

Reglamento: Artículo 202. Principio general: Administración solamente podrá introducir modificaciones a los contratos dentro de los límites previstos en los artículos 121,122 y123 de la Ley y en este Reglamento.

Ley: ARTICULO 122.-Forma de la modificación. Las modificaciones introducidas por la Administración que importen aumento o disminución en la cuantía de las prestaciones previstas originalmente en el contrato, siempre que no excedan del diez por ciento (10%) de su valor, se harán mediante órdenes de cambio emitidas por la autoridad responsable de la ejecución del contrato, previa la reserva presupuestaria correspondiente en el caso de incremento del monto original.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Se decidió revisar el pozo existente y realizar una limpieza, el cual se encuentra en buen estado. Se procedió a realizar limpieza y rehabilitar.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.

LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO EXISTENTE EL CUAL SE ENCONTRÓ EN BUEN ESTADO PARA UTILIZAR. SE LE CONSTRUCCIÓN DE UNA TAPADERA Y CASQUETE DE CONCRETO.

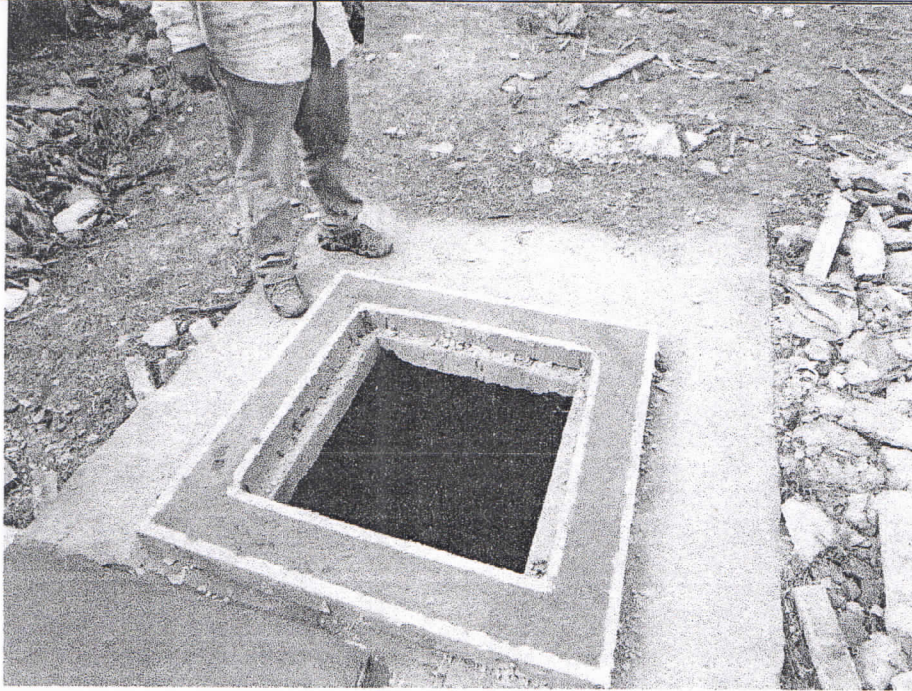


Figure 1 Se realizo la construcción de casquete para pozo existente, al igual que tapadera.

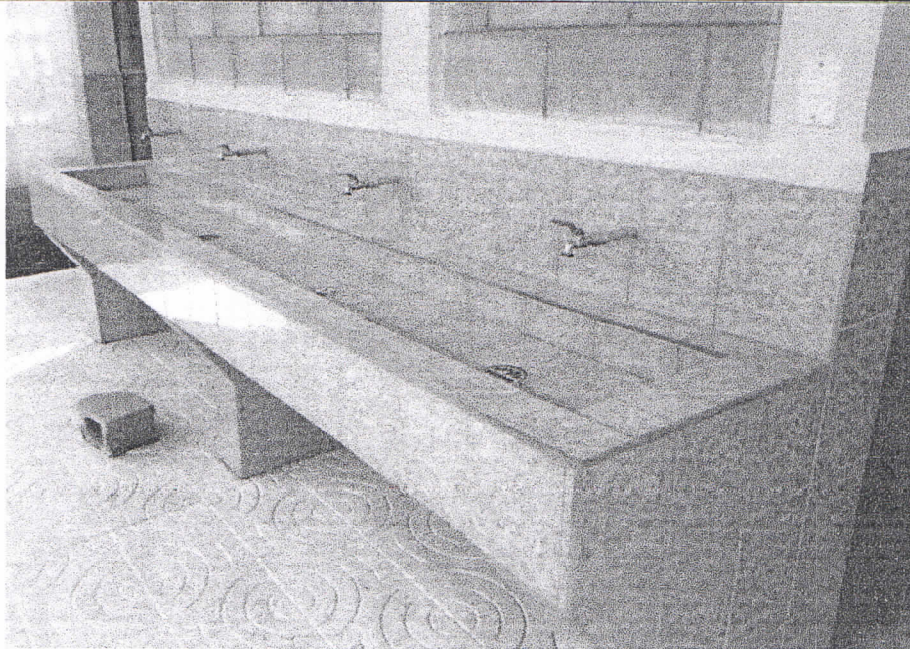


Figure 2 Instalación de Cerámica En Lavamanos

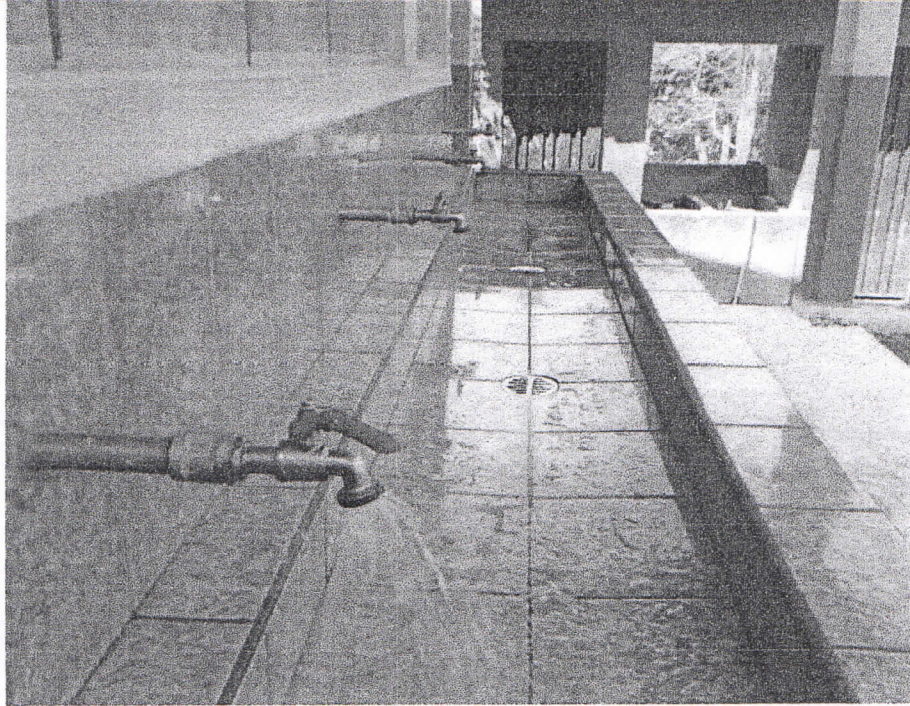


Figure 3 Instalación de Cerámica En Lavamanos

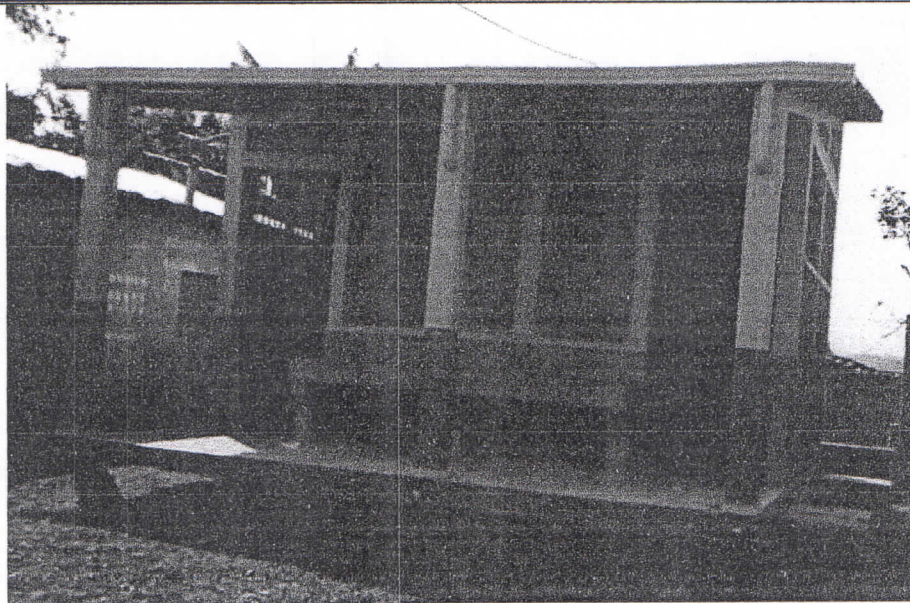


Figure 4 Pintado de Detalles

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 03 de mayo del 2019.

GABINO ARGUETA GÁLVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARÍA LA PAZ
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
SANITARIOS, ESCUELA JOSÉ CECILIO
DEL VALLE CASCO URBANO SANTA
MARÍA LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, me permito entregar el INFORME N°2,
para estimación del proyecto en mención.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUIS AMADOR
Supervisor de infraestructura
ALCALDÍA

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS			
UBICACIÓN:	ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CASCO URBANO SANTA MARÍA LA PAZ			
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	Construcción de módulos sanitarios para escuela. El cual consta de 3 sanitarios para niñas, dos sanitarios para varones y dos urinarios. Con un lavamanos.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal			
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	ORDEN DE CAMBIO	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCTURA	L 298,638.68	L 298,638.68	-L 5,750.20	L 292,888.48
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L 292,888.48

1.2- INFORMACIÓN CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):	ING. YESSICA MEDINA CLAROS
SUPERVISIÓN	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	SIN ANTICIPO
FECHA DE ORDEN DE INICIO	MARTES 05 DE FEBRERO DE 2019
PLAZO CONTRACTUAL	75 días
FECHA DE FINALIZACIÓN REAL	VIERNES 19 DE ABRIL 2019
FECHA DE FINALIZACIÓN PROGRAMADA	DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019



1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA: se prepara el informe que corresponde a la estimación número dos del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 100% de las actividades del proyecto.

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 100%

SITUACIONES PRESENTADAS:

Suelo donde se pretendía realizar la excavación para el pozo séptico es material duro.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Se decidió revisar el pozo existente y realizar una limpieza, el cual se encuentra en buen estado. Se procedió a realizar limpieza y rehabilitar.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA LOS CUALES CONSTAN DE 3 SANITARIOS, Y DOS URINARIOS. LAVAMANOS PARA USO COLECTIVO.

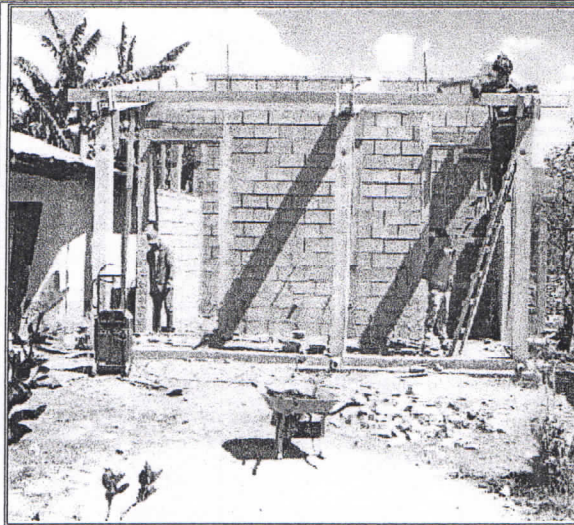


Figure 1 levantamiento de Paredes

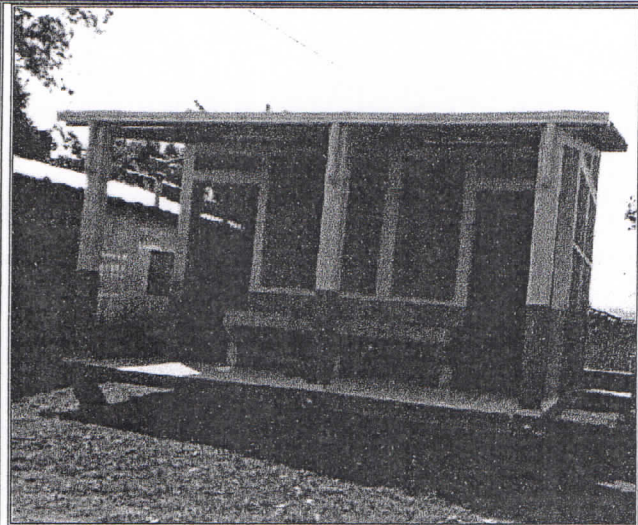


Figure 2 Proyecto finalizado



LIMPIEZA DE POZO SÉPTICO EXISTENTE EL CUAL SE ENCONTRÓ EN BUEN ESTADO PARA UTILIZAR. SE LE CONSTRUCCIÓN DE UNA TAPADERA Y CASQUETE DE CONCRETO.





Figure 3 Se realizo la construcción de casquete para pozo existente, al igual que tapadera.

DIVISIONES METÁLICAS PARA SERVICIOS
SANTARIOS EN AMBAS ÁREAS, TANTO DE
VARONES COMO DE NIÑAS.

INSTALACIÓN DE CERÁMICA, Y PINTADO DE
ÁREAS DE DETALLE.

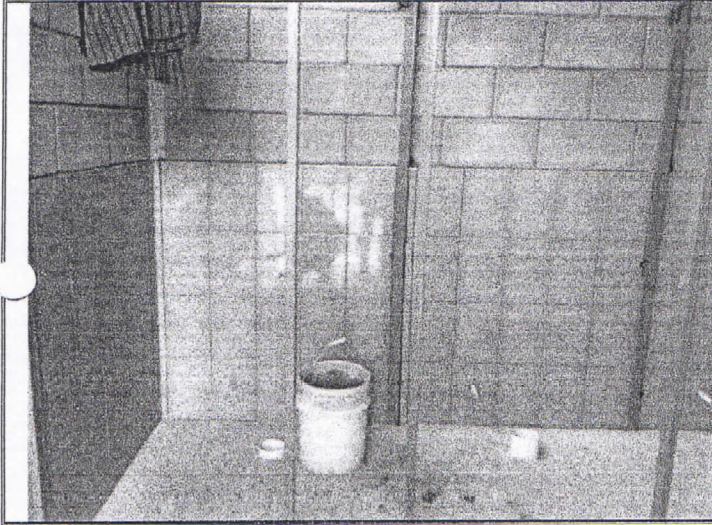

CONSTRUCCIÓN DE LAVAMANOS PARA USO DE AMBAS ÁREAS DE NIÑAS Y NIÑOS. A LOS CUALES
SE LES INSTALO CERÁMICA, LA CUAL ENTRA COMO ORDEN DE CAMBIO YA QUE NO ESTABA
CONTEMPLADA.

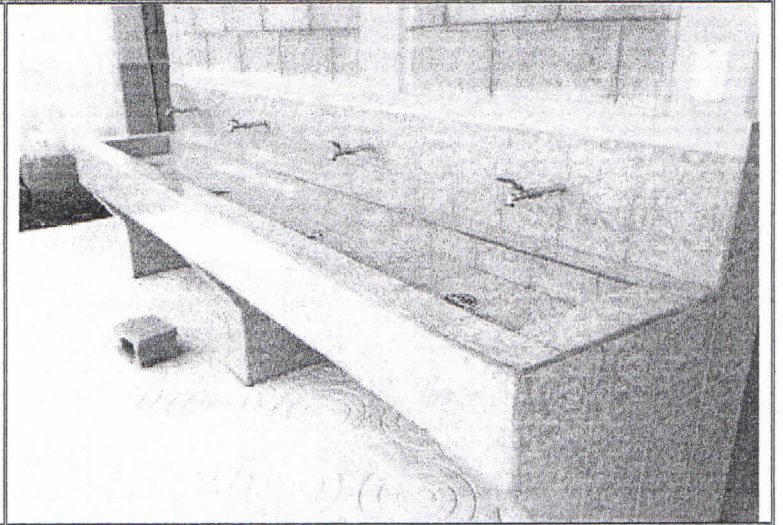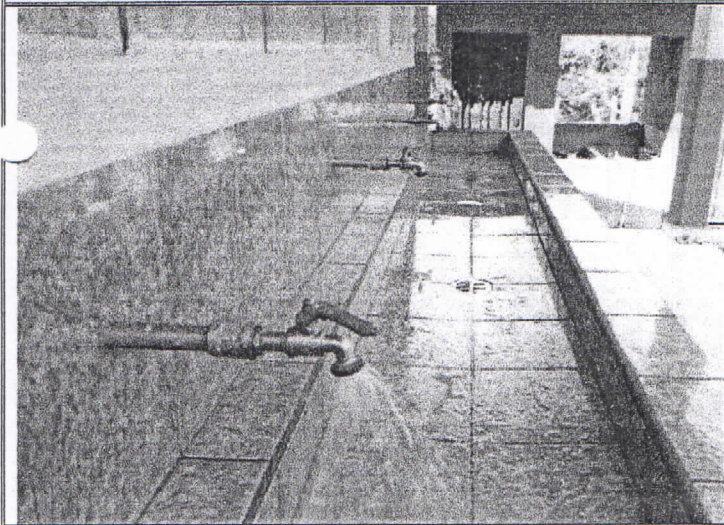

EN LA IMAGEN OBSERVAMOS LOS SERVICIOS SANITARIOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, VERIFICADO QUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ES SUFICIENTE.



Figure 4 Servicios sanitarios Probados

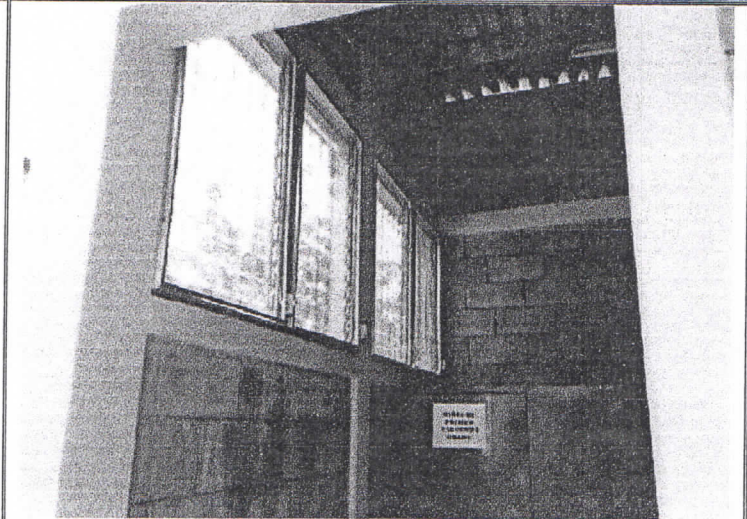


Figure 5 Servicios sanitarios

INSTALACIÓN DE URINARIOS PARA NIÑOS. LOS CUALES SE CONSIDERO UNA ALTURA ESTÁNDAR PARA SU UBICACIÓN.

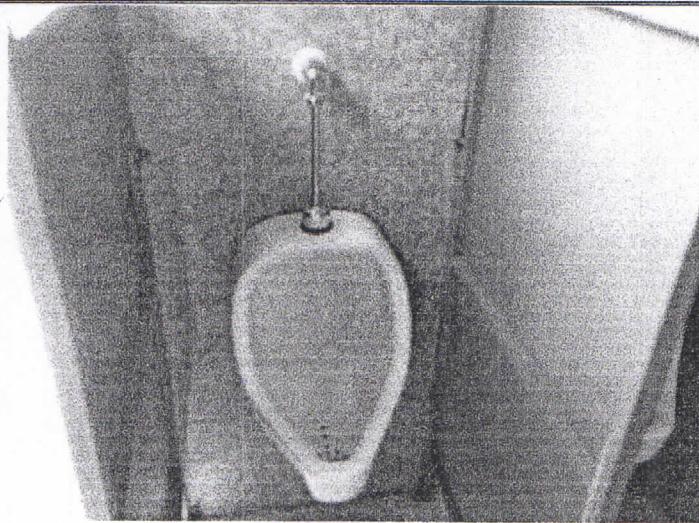


Figure 6 Urinarios para niños

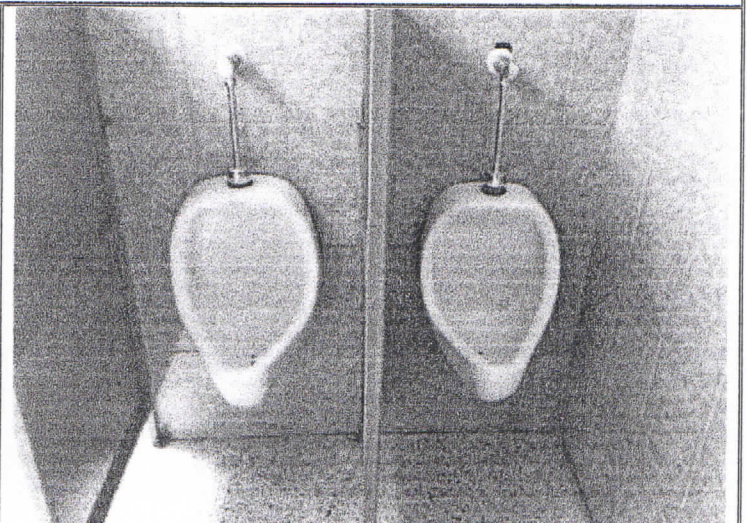


Figure 7 Urinarios Para Niños



FECHA: 04 / 19

10

Estos terminando la construcción de este módulo sanitario con la instalación de los vidrios, granito en el comedor y la pintura en elementos estructurales vistos (columnas y soleras) se mantuvo la calidad en cada una de las actividades y el mismo personal de trabajo. El tiempo de ejecución al tiempo estipulado en el proyecto. Se está terminando en tiempo y forma.

~~_____~~
~~_____~~



FECHA 19 de Abril

11

ESTE DIA SE DIO POR FINALIZADO EL PROYECTO MEDIANTE EL CUAL SE TIENEN DE COLOCAR LOS SERVICIOS SANITARIOS Y USINARIO LAMPARAS ELECTRICAS (ILUMINACION) CON LA REVISION Y VERIFICACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

SUPERVISOR
ALCALDIA
