

023604000020  
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.  
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.  
TEL: 687-16-89

CHEQUE No. 00013503

TRINIDAD 29 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

LEVI LOPEZ FERNANDEZ

L 70,113.25

Páguese a la orden de

SETENTA MIL CIENTO TRECE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆002142⑆00023604000020⑆00013503

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Segunda Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.181.048.32 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra, Equipo y Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el Barrio El Tempisque, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps. 73,803.42, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.3,690.17, TOTAL A PAGAR LPS.70,113.25

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Segunda Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.181,048.32 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra, Equipo y Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el Barrio El Tempisque, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps. 73,803.42, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.3,690.17, TOTAL A PAGAR LPS.70,113.25	70,113.25	



CHEQUE No.

00013503

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONF. ME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-9880, /CR (08-19) \* 67409-36 \* B201190800H



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2020  
Hora : 09:55 a.m.

USUARIO:  
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1848

L.: 73,803.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1451

Fecha de Emisión: 29/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEVI LOPEZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197200126

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Segunda Estimación del Contrato No.030-2020 por valor de Lps.181,048.32 por La Prestación de Servicios por Mano de Obra, Equipo y Dirección del Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras, en el Barrio El Tempisque, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA detallada de la siguiente forma: Valor de estimación Lps. 73,803.42, retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.3,690.17, TOTAL A PAGAR LPS.70,113.25

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 004 000 001 47210 11-001-01	RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCASIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA	73,803.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,690.17
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,690.17</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	73,803.42
<b>Monto Total:</b>		<b>73,803.42</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	73,803.42
- RETENCIONES	3,690.17
<b>TOTAL</b>	<b>70,113.25</b>

Recibido por:

Identidad No.: 1626 1972 0012

INGENIERO CIVIL  
 25-02-16  
 14-08-18  
 LEVI LOPEZ FERNANDEZ

# SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA

PROP. LEVI LOPEZ FERNANDEZ

R. T. N. 16261972001266

TEL. 9694-1270

Bo. ABAJO, CALLE PRINCIPAL,  
TRINIDAD SANTA BARBARA, HONDURAS, C. A.

Email: levi\_alfa02@yahoo.com

## RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

**Nº 000438**

Por Lps: **70,113.25**

CAI: 11DBFB-4D61CA-2A4FB5-989B03-2E8A68-E5

Recibí de: La Municipalidad de Trinidad S.B.

RTN: 1626999544337

La suma neta de: setenta mil ciento trece lps. con 25/100

Por concepto de: Pago de estimación N° 2 de avance  
de obra según contrato N° 030-2020

29 de 12 del 2020



Total por Honorarios:

Total Neto Recibido: lps 70,113.25

Original: Cliente  
Copia: Emisor

Bo. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
ST. d. N.º 00-001-04-00000401 - 000-001-04-00000500 - Fech. Recepción - 04/01/2020 - Limite. Emisión - 04/01/2021

**PROYECTO:** RECONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS  
**UBICACIÓN:** BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA.  
**FECHA:** 28 DE DICIEMBRE DEL 2020.  
**PRESENTADO POR:** SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA.

**ESTIMACION No.2 DE AVANCE DE OBRA.**

NO.	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACUMULADO ANTERIOR			AVANVE ESTE PERIODO			ACUMULADO ACTUAL			% EJECUTADO
		UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	CANTIDAD	P.U (LPS)	TOTAL (LPS)	
1	Preliminares	Global	1.00	5,000.00	5,000.00	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1.00	5,000.00	5,000.00	100.00
2	Topografía	Global	1.00	12,000.00	12,000.00	0.75	12,000.00	9,000.00	0.25	12,000.00	3,000.00	1.00	12,000.00	12,000.00	100.00
3	Diseño de Cambio de Línea del Colector	Global	1.00	15,000.00	15,000.00	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1.00	15,000.00	15,000.00	100.00
4	Excavación	m <sup>3</sup>	322.80	104.00	33,571.20	322.80	104.00	33,571.20	0.00	104.00	0.00	322.80	104.00	33,571.20	100.00
5	Desinstalación y limpieza de tubería de 12"	ml	110.00	23.64	2,600.40	30.00	23.64	709.20	0.00	23.64	0.00	30.00	23.64	709.20	27.27
6	Conformado de zanja	ml	269.00	14.50	3,900.50	269.00	14.50	3,900.50	0.00	14.50	0.00	269.00	14.50	3,900.50	100.00
7	Cama de limo de 10 cm de espesor	m <sup>3</sup>	16.14	260.00	4,196.40	8.00	260.00	2,080.00	8.14	260.00	2,116.40	16.14	260.00	4,196.40	100.00
8	Instalación de tubería de 10"	ml	269.00	14.50	3,900.50	0.00	14.50	0.00	269.00	14.50	3,900.50	269.00	14.50	3,900.50	100.00
9	Relleno de Limo, 10 cm sobre la corona del tubo	m <sup>3</sup>	43.28	260.00	11,252.80	0.00	260.00	0.00	28.00	260.00	7,280.00	28.00	260.00	7,280.00	64.70
10	Relleno y compactado de zanja	m <sup>3</sup>	250.17	156.00	39,026.52	0.00	156.00	0.00	130.17	156.00	20,306.52	130.17	156.00	20,306.52	52.03
11	Construcción de pozos	Unidad	4.00	3,900.00	15,600.00	0.00	3,900.00	0.00	3.00	3,900.00	11,700.00	3.00	3,900.00	11,700.00	75.00
12	Dirección del Proyecto	Global	1.00	30,000.00	30,000.00	0.70	30,000.00	21,000.00	0.85	30,000.00	25,500.00	1.55	30,000.00	46,500.00	155.00
13	Limpieza final	Unidad	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 181,048.32</b>			<b>90,260.90</b>			<b>L 73,803.42</b>			<b>L 164,064.32</b>	<b>90.62</b>
<b>RETENCION 5% POR CALIDAD DE OBRA</b>					<b>L 9,052.42</b>			<b>4,513.05</b>			<b>L 3,690.17</b>			<b>L 8,203.22</b>	
<b>TOTAL NETO (L.)</b>					<b>L 171,995.90</b>			<b>85,747.85</b>			<b>L 70,113.25</b>			<b>L 155,861.10</b>	


  
 Ing. Levi López Fernández  
 C.I.C.H 7031



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ALCALDIA MUNICIPAL**



## **CONTRATO N° 030-2020**

### **PRESTACION DE SERVICIO POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN EL BARRIO TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.**

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Ingeniero Civil **LEVI LÓPEZ FERNÁNDEZ**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número 1626-1972-00126, RTN 16261972001266, y con domicilio en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el que en lo sucesivo para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**. Por este medio **CONTRATA PRESTACION DE SERVICIO POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO DE "RECONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS, EN EL BARRIO TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.**

**QUE CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**

#### **PRESUPUESTO DE OBRA**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>TOTAL (LPS)</b>
1.00	PRELIMINARES	GLOBAL	1.00	L.5,000.00	5,000.00
2.00	TOPOGRAFIA	GLOBAL	1.00	L.12,000.00	12,000.00
3.00	DISEÑO DE CAMBIO DE LINEA DEL COLECTOR	GLOBAL	1.00	L.15,000.00	15,000.00
4.00	EXCAVACION	M3	322.80	L .104.00	33,571.20
5.00	DESINSTALACION Y LIMPIEZA DE TUBERIA DE 10	ML	110.00	L.23.64	2,600.40
6.00	CONFORMADO DE ZANJA	ML	269.00	L.14.50	3,900.50



## MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

**ALCALDIA MUNICIPAL**



7.00	CAMA DE LIMO DE 10 CM DE ESPESOR	M3	16.14	L. 260.00	4,196.40
8.00	INSTALACION DE TUBERIA DE 10	ML	269.00	L.14.50	3,900.50
9.00	RELLENO DE LIMO, 10 CM SOBRE LA CORONA DEL TUBO	M3	43.28	L.260.00	11,252.80
10.00	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA	M3	250.17	L.156.00	39,026.52
11.00	CONSTRUCCION DE POZOS	UNIDAD	4.00	L.3,900.00	15,600.00
12.00	DIRECCION DEL PROYECTO	GLOBAL	1.00	L.30,000.00	30,000.00
13.00	LIMPIEZA FINAL	UNIDAD	1.00	L.5,000.00	5,000.00
	<b>TOTAL MANO DE OBRA ,EQUIPO Y DIRECCION DEL PROYECTO</b>			<b>LPS.</b>	<b>181,048.32</b>

Hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente contrato, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** LA MUNICIPALIDAD declara que por este medio contrata la prestación de servicios Profesionales de Obra Terminada para la ejecución del proyecto antes mencionado. **CLAUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRATADO:** El monto contratado asciende a la cantidad de ciento ochenta y un mil cuarenta y ocho lempiras con treinta y dos centavos (**Lps. 181,048.32**), de acuerdo al monto de la oferta presentada. **CLAUSULA TERCERA: FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO:** El presente contrato será financiado con fondos provenientes de la transferencia municipal que se recibe por parte del Gobierno Central de la Republica. La forma de pago se hará según avance de obra **CLAUSULA CUARTA GARANTIAS:** El contratista presentará título valor única letra de cambio, **1) Por Cumplimiento de Contrato:** Por un monto equivalente al 15% del monto contratado es decir por Veintisiete mil ciento cincuenta y siete lempiras con veinticinco centavos (**Lps. 27,157.25**) la cual tendrá una vigencia de ciento once días (111) a partir de la fecha de emisión, le será devuelta una vez la Municipalidad reciba a satisfacción el proyecto a través de la firma del acta de recepción del mismo. **3) De Calidad de Obra:** por un monto equivalente al 5% del monto contratado es decir por nueve mil cincuenta y dos lempiras con cuarenta y dos centavos (**Lps. 9,052.42**) con una vigencia de un año a partir de la fecha de recepción del proyecto. **CLAUSULA QUINTA: RETENCION POR IMPUESTOS:** No se realizará retención del 12.5% de Impuesto sobre la Renta ya que El contratista presento constancia de Pagos a Cuenta del Servicio de Administración de Rentas "SAR" que acredita su solvencia. **CLAUSULA SEXTA: PERIODO DE EJECUCION:** Se ha establecido que el Proyecto



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.  
**ALCALDIA MUNICIPAL**



se ejecute en un periodo no mayor de veintiún (21) días calendarios contados a partir del día 09 de diciembre al 29 de diciembre de 2020.

**CLAUSULA SEPTIMA: RESOLUCION O TERMINACION DEL CONTRATO;** El incumplimiento en alguna de las clausulas por parte del contratista será motivo suficiente para que la MUNICIPALIDAD haga uso de la rescisión del contrato, dando por terminado el mismo sin responsabilidad alguna de su parte, si por fuerza mayor no se han terminado las actividades en el plazo indicado se prorrogará el mismo por el tiempo que la MUNICIPALIDAD estime conveniente, igual la mala calidad del trabajo en ejecución debidamente comprobada será motivo para dar por terminado este contrato sin perjuicio para la MUNICIPALIDAD. **CLAUSULA OCTAVA: SOLUCION DE CONFLICTOS;**

En caso de disputas, reclamos o desacuerdos que puedan surgir como resultado de este contrato, y de no llegarse a un acuerdo entre las partes, ambos tienen expedito derecho de acudir a los Tribunales de Justicia, para cuyos efectos, el Contratista renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente al domicilio de la MUNICIPALIDAD.

**CLAUSULA NOVENA: RECLAMOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA;** Queda establecido que **EL CONTRATISTA** es el único responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal, así como daños a terceros.

**CLAUSULA DECIMA: ACEPTACION;** Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las clausulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente contrato y lo suscriben en el Municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, el día ocho (08) de Diciembre del año 2020, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



\_\_\_\_\_  
**MANUEL LEOPOLDO REGALADO**  
ALCALDE MUNICIPAL  
TRINIDAD, SANTA BARBARA



\_\_\_\_\_  
**LEVI LÓPEZ FERNÁNDEZ**  
CONTRATISTA

**INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°2**

# **Proyecto de Reconstrucción del Colector de Aguas Negras**

**BARRIO EL TEMPISQUE, MUNICIPIO DE TRINIDAD,  
DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.**

**SERVICIOS DE INGENIERIA ALFA**  
**Ing. Levi López Fernández**



Trinidad, Santa Bárbara, 28 de diciembre de 2020

## **INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N°2**

**Período del 19 al 28 de diciembre de 2020**

### **I. DATOS GENERALES:**

Proyecto:	Reconstrucción de Colector de Aguas Negras
Ubicación:	Barrio El Tempisque, Trinidad, Sta. Bárbara
Cliente:	Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara
Fecha de Inicio del Proyecto:	Lunes 09 de diciembre de 2020
Período de trabajo:	Del 19 al 28 de diciembre de 2020

### **II. ACTIVIDADES REALIZADAS**

- 1) Demolición de pozo de inspección existente (el nivel no es funcional para la nueva línea del Colector de aguas negras).
- 2) Canalización de las aguas negras derramadas.
- 3) Construcción de Filtros.
- 4) Colocación de limo de 10 cm de espesor (cama y recubrimiento de tubería).
- 5) Instalación de tubería.
- 6) Construcción de 4 Pozos de inspección.
- 7) Aterrado de zanjas.



III. REPORTE FOTOGRÁFICO DE DESARROLLO DEL PROYECTO



Suministro de material (tubería, Limo)



Demolición de Pozo de inspección existente.



Canalización de las aguas negras






*Instalación de tubería de Drenaje de Aguas Negras*



*Colocación de Capa de Limo sobre tubería*

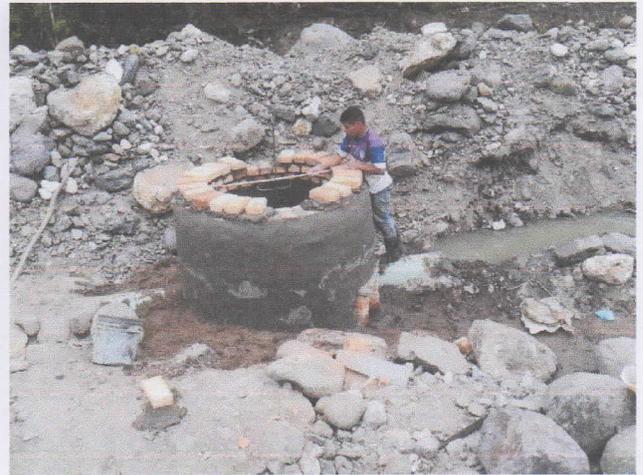

*Construcción de Pozo de inspección #1*






*Construcción de Pozo de Inspección #2*



*Construcción de Pozo de Inspección #3*



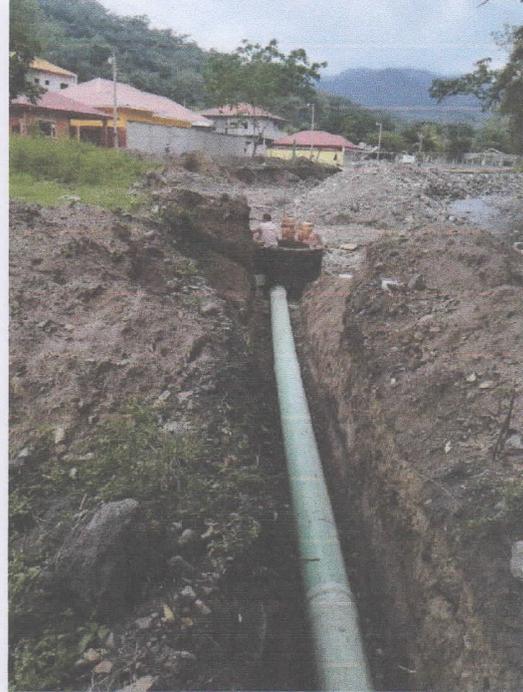

*Construcción de Pozo de Inspección #4*



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/07/2018

RTN: 16261972001266

LEVI LOPEZ FERNANDEZ  
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 265 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2976804

Transacción: EFEEBD

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**

201-20-10500-40899

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **LOPEZ FERNANDEZ LEVI**  
Con Registro Tributario Nacional: **16261972001266**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-40899 en fecha 11/08/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25412347922 de fecha 11/08/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27721315781, presentada el 30/06/2020, la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-20-10500-40899** o mediante el siguiente código QR:

