



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 25/03/2022  
Hora : 08:46 a.m.

USUARIO:  
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6442

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6412

Fecha de Emisión: 25/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: REINO ADALID ENAMORADO LARA

Id/RTN: 1605198300015

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla #1 por la Construcción De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta Y Iota (Convenio Firmado Con Aldea Global Y Municipalidad De Ceguaca) En La Comunidad De Santa Ana Y El Eden Del Miercoles 09 Al Sabado 12, Del Lunes 14 Al Sabado 19 Y Del Lunes 21 Al Viernes 25 De Marzo Del Año 2022.





CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Babara	31,500.00
11 04 011 000 001 47110 11-001-01	Mantenimiento De Tramo Carretero Desde La Comunidad De El Eden Hasta La Calle Pavimentada Que Conduce a Pito Sol, Mismos Que Fueron Provocados Por Los Huracanes Eta E Iota En El Año 2020.	13,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>



RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>45,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		45,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>45,000.00</b>



Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Reino Adalid Enamorado  
Identidad No.: 16 03 1983 000 15

0a+je/9JerdASVYRv4vGJJOMwTvdhNMAKmLoboC3gdo3TC8T+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KJSDQuSptq5NDjY4nTYMaDxboae6FjH6Mx1+OvC4OZOq8Pu  
m5wUzKXCZOA&E1e3ePw3Gdk9hz/woEVqIEMbKf+CwHXO1UQ0=

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p><b>PAGO DE Pago de planilla #1 por la Construcción De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta Y Iota (Convencido Firmado Con Acta Global Y Municipalidad De Ceguaca) En La Comunidad De Santa Ana Y 11 Idem Del Municipio 09 Al Sabado 12, Del Lunes 14 Al Sabado 19 Y Del Lunes 25 De Marzo Del Año 2022.</b></p>			
		44,000.00	
<p>AUTORIZADO POR CONTABILIDAD</p>		<p>IDENTIDAD 1605198300015</p>	<p>ELABORADO POR: Resuro Adalberto Yamamada</p>
<p>que sin Valor Comercial</p>		<p>R.T.N. SOLVENCIA MUNICIPAL</p>	<p>RECIBI CONFORME FIRMA</p>
<p>N.º 00006522</p>			



**Municipalidad de Ceguaca**

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE  
SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

CEGUACA

CHEQUE No. 00006522  
29 de marzo de 2022

**REINO ADALID ENAMORADO LARA**

44,000.00

Páguese a la orden de

**CUARENTA Y CINCO MIL CON CINCO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

140 2480000 140 00006522

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
<p><b>PAGO DE Pago de planilla #1 por la Construcción De 10 Viviendas Afectadas Por Los Huracanes Eta Y Iota (Convencido Firmado Con Acta Global Y Municipalidad De Ceguaca) En La Comunidad De Santa Ana Y 11 Idem Del Municipio 09 Al Sabado 12, Del Lunes 14 Al Sabado 19 Y Del Lunes 25 De Marzo Del Año 2022.</b></p>			
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD		IDENTIDAD 1605198300015	ELABORADO POR:
		R.T.N. SOLVENCIA MUNICIPAL	RECIBI CONFORME FIRMA
N.º 00006522			

## RECIBO

Por Lps. 45,000.00

Recibí de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara, la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS, como pago de PLANILLA N° 1 de mano de obra correspondiente al proyecto "CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y EL EDEN" monto que corresponde al pago de mano de obra de (Albañiles) que ha laborado durante el periodo de trabajo del miércoles 09 al sábado 12, del Lunes 14 al sábado 19 y del lunes 21 al viernes 25 de marzo del año 2022.

Se adjunta documentación soporte.

Ceguaca, Santa Bárbara, 25 de Marzo del año 2022.

Reino Adalid Enamorado

Reino Adalid Enamorado Lara

Ident. # 1805-1983-00015

Albañil Encargado



Huellas Digital

## NOTA DE AUTORIZACION

Yo **REINO ADALID ENAMORADO LARA** con Identidad **1605-1983-00015** AUTORIZO a **Angel Adelfo Reyes López** Ingeniero Supervisor del Proyecto **“CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA Y EL EDEN”**, para que cambie el Cheque para el pago de la **Planilla #1** por un monto total de **Lps. 45,000.00**.

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 25 días del mes de Marzo del año 2022.

Reino Adalid Enamorado

**REINO ADALID ENAMORADO LARA**  
**ALBAÑIL ENCARGADO**

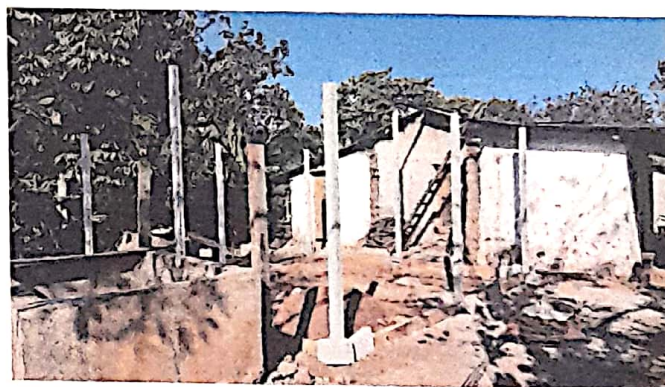




**INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO**  
**“CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y**  
**IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE**  
**CEGUACA) EN LAS COMUNIDADES SANTA ANA Y EL EDEN”**  
**PERIODO 09/MARZO/2022 AL 25/MARZO/2022**

**TRABAJO REALIZADO EN EL PERIODO**

- Se dio inicio con fabricación de columnas de las 10 viviendas
- Seguidamente se continuo con fundición de mampostería y parado de columnas
- Se hizo la solera inferior y se inició con la actividad de pegado de bloque
- De las 10 viviendas ya se finalizó el pegado de bloque en 4 y en las otras 6 se trabaja con dicha actividad
- El albañil encargado de coordinar las actividades es Reino Adalid Enamorado, se trabaja paralelamente en las 10 viviendas.
- La Municipalidad de Ceguaca realizo el suministro de materiales según convenio
- Se observa avance satisfactorio y obra de buena calidad

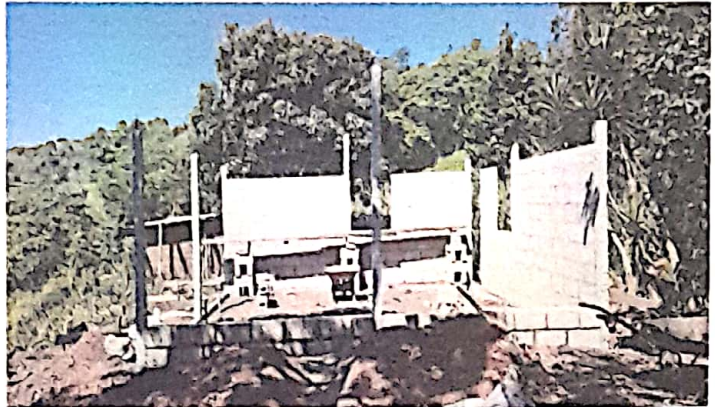


ANGEL ADALID ENAMORADO  
25/03/2022  
C.I.C.M. No. 1811



EN LAS IMÁGENES ARRIBA OBSERVAMOS EL PROCESO DE EJECUCION EN LAS DIEZ VIVIENDAS COMO SE PUEDE OBSERVAR SE TRABAJA PARALELAMENTE EN LAS 10





EN LAS IMÁGENES OBSERVAMOS EL AVANCE EN LAS DIFERENTES VIVIENDAS EN CONJUNTO SE TIENE UN AVANCE APROXIMADO DEL 45%

Ceguaca, Santa Bárbara 25 de Marzo 2022

  
**Ing. Angel Adolfo Reyes**  
**Ingeniero Civil #5507**  
**Supervisor Municipal**















