



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2022
Hora : 02:28 p.m.

USUARIO:
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6823
L.: 43,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6762

Fecha de Emisión: 23/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO ID/RTN: 1605198700100

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de planilla #3 de las fechas del lunes 15/08/2022 al sábado 20/08/2022, del lunes 22/08/2022 al sábado 27/08/2022, del lunes 29/08/2022 al miércoles 01/09/2022 y del jueves 01/09/2022 al lunes 05/09/2022. Construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes eta y iota (convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) en las aldeas de Santa Ana, San Juan, El Portillo y Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 008 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Viviendas en la Comunidad de Santa Ana, Ceguaca, Santa Barbara	43,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Walter Javier Enamorado
Identidad No.: 1605198700100

0s+jsf9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEHNmKMLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBjY4nTYMatXboae6FjH6Mx1+O/uc4OZQq8Pu
mSwK/2cKCZOAKE41e3ePw3Gdk5hz/weEVqLEMbKF+CwNXO1UQ0=



Municipalidad de Ceguaca

B.º EL CENTRO, FTE. AL PARQUE
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00006879

CEGUACA

23 de septiembre de 2022

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO

43,000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

[Handwritten signature]
Firma (s)

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

00006879

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de planilla #3 de las fechas: del lunes 15/08/2022 al sábado 20/08/2022, del lunes 22/08/2022 al sábado 27/08/2022, del lunes 29/08/2022 al miércoles 31/08/2022 y del jueves 01/09/2022 al lunes 05/09/2022. Construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes Agostón (convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) en las aldeas de Santa Ana, San Juan, El Portillo y Casco Urbano.		43,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 1605198700100	ELABORADO POR:	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006879	SOLVENCIA MUNICIPAL	Walter Javier Enamorado	FIRMA

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de planilla #3 de las fechas: del lunes 15/08/2022 al sábado 20/08/2022, del lunes 22/08/2022 al sábado 27/08/2022, del lunes 29/08/2022 al miércoles 31/08/2022 y del jueves 01/09/2022 al lunes 05/09/2022. Construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes Agostón (convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) en las aldeas de Santa Ana, San Juan, El Portillo y Casco Urbano.		43,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 1605198700100	ELABORADO POR:	
	R.T.N.	RECIBI CONFORME	
N.º 00006879	SOLVENCIA MUNICIPAL	Walter Javier Enamorado	FIRMA

RECIBO

Por Lps. 43,000.00

Recibí de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara, la cantidad de **CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS, (43,000.00)** como pago de **PLANILLA N° 03** de mano de obra correspondiente al proyecto **“CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO”** monto que corresponde al pago de mano de obra de (Albañiles) que ha laborado durante el periodo de trabajo del lunes 15 al sabado 20, del lunes 22 al sábado 27, del lunes 29 de agosto al sabado 03 de septiembre y el lunes 05 de septiembre del año 2022.

Se adjunta documentación soporte.

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 23 días del mes de Septiembre del año 2022.

Monto Total a Pagar.....Lps. **43,000.00**


Neto a pagar.....Lps. **43,000.00**

Walter Javier Enamorado

Walter Javier Enamorado Erazo

Ident. # 1605-1987-00100

Albañil Encargado



Huellas Digital

NOTA DE AUTORIZACION

Yo **WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO** con Identidad **#1605-1987-00100** AUTORIZO a **Angel Adeldo Reyes López** Ingeniero Supervisor del Proyecto **"CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO"**, para que cambie el Cheque para el pago de la **Planilla #03** por un monto total de **Lps. 43,000.00**

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 23 días del mes de Septiembre del año 2022.

Walter Javier Enamorado Erazo

Walter Javier Enamorado Erazo
Albañil Encargado



MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
SANTA BARBARA, HONDURAS
TEL: 95501019



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO"

PLANILLA N° 3

PERIODO TRABAJADO: DEL LUNES 15 AL SABADO 20, DEL LUNES 22 AL SABADO 27, DEL LUNES 29 DE AGOSTO AL SABADO 03 DE SEPTIEMBRE Y EL LUNES 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	NOMBRE	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL N°	Puesto	AGOSTO														SEPTIEMBRE					Total días trabajados	Pago por día Lps / día	Neto a pagar	FIRMA O HUELLA DIGITAL
					L	M	M	J	V	S	L	M	M	J	V	S	L	M	M	L	V	S	L				
					15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	29	30	31	1	2	3	5				
1	WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO	1605-1987-00100	700951	ALBAÑIL	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0	12	500.00	6.000.00	<i>Walter Javier Enamorado</i>
2	REINO ADALID ENAMORADO LARA	1605-1984-00015	700811	ALBAÑIL	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X	0	0	12	500.00	6.000.00	<i>Reino Adalid Enamorado</i>
3	MANUEL ANTONIO ENAMORADO ENAMORADO	1601-1995-00649	700953	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18	500.00	9.000.00	<i>Manuel Antonio Enamorado</i>
4	ANGEL RENE ENAMORADO LARA	1605-1985-00100	700957	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	16	500.00	8.000.00	<i>Angel Rene Enamorado</i>
5	YIMY ANTONIO ENAMORADO LARA	1605-1994-00115	700950	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	12	500.00	6.000.00	<i>Yimy Antonio Enamorado</i>
6	RUBEN OMAR ENAMORADO LARA	1605-1993-00086	700952	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	16	500.00	8.000.00	<i>Ruben Omar Enamorado</i>
TOTALES A PAGAR													IP\$	43,000.00													

NOTAS:

- EL PAGO SE HARA A NOMBRE DEL SEÑOR WALTER JAVIER ENAMORADO COMO ALBAÑIL ENCARGADO
- EN EL PROYECTO SE TRABAJA DE LUNES A SABADO Y SE PAGA AL FINALIZAR LA JORNADA

CEGUACA, SANTA BARBARA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Darwin Castellanos
DARWIN CASTELLANOS
ENLACE TECNICO

Angel Adolfo Reyes
ANGEL ADOLFO RYES
SUPERVISOR MUNICIPAL

Walter Javier Enamorado
WALTER JAVIER ENAMORADO ERAZO
ALBAÑIL ENCARGADO

Guadalupe Pineda
GUADALUPE PINEDA
TESORERA MUNICIPAL

Darwin Castellanos
DARWIN CASTELLANOS
CONTADOR


Luis Enrique Enamorado
LUIS ENRIQUE ENAMORADO
ALCALDE MUNICIPAL





INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA
(CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA
COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO”
PERIODO DEL LUNES 15 AL SABADO 20, DEL LUNES 22 AL SABADO 27, DEL
LUNES 29 DE AGOSTO AL SABADO 03 DE SEPTIEMBRE Y EL LUNES 05 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022
(ZONA SANTA ANA)

TRABAJO REALIZADO EN EL PERIODO

- Se finalizaron todas las actividades
- El Técnico Municipal Davadi Castellanos es el enlace municipal del proyecto el cual en compañía de Glendy Maribel López secretaria de la Comisión Ciudadana de Transparencia (CCT) se encarga de verificar horarios de trabajo, control de materiales, entre otras actividades de campo relacionadas con el proyecto.
- Se observa obra de buena calidad finalizada en tiempo y forma



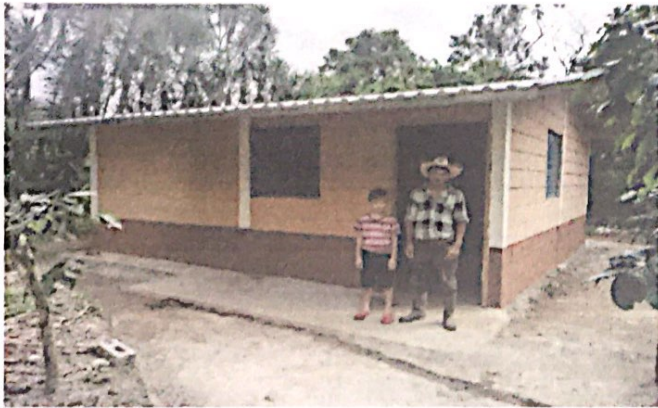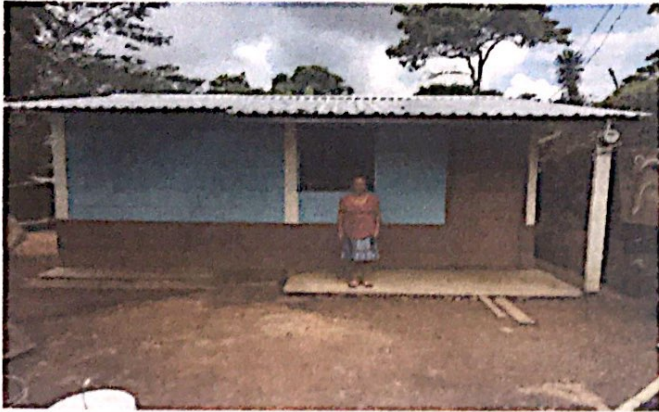

LAS 6 VIVIENDAS EN SANTA ANA FUERON FINALIZADAS SATISFACTORIAMENTE

Ceguaca, Santa Bárbara 23 de septiembre 2022


Ing. Angel Adolfo Reyes
Ingénieur Civil #5507
Supervisor Municipal



Honduras, C.A.

CEGUACA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2022

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO:
DARWIN.ENAMORADO

Orden de Pago No.: 6822

L. 52,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6761

Fecha de Emision: 23/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NACISO TROCHEZ HERNANDEZ

IU/RTN: 160519580020

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de planilla #4 de las fechas del lunes 29/08/2022 al viernes 02/09/2022, del lunes 05/09/2022 al viernes 09/09/2022, del lunes 12/09/2022 al viernes 16/09/2022 y del lunes 19/09/2022 al viernes 23/09/2022. Construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes eta y iota (convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) en las aldeas de Santa Ana, San Juan, El Portillo y Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 010 000 001 47110 11-001-01	001 - Construccion De Vivienda En La Comunidad Del Portillo, Ceguaca	17,333.33
11 04 013 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Viviendas Casco Urbano Ceguaca	11,555.56
11 04 012 000 001 47110 11-001-01	Construccion de Viviendas en la Comunidad de San Juan Ceguaca, Santa Barbara.	22,111.11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorenia:

Firma y Sello de Alcaldia (SA):

Recibido por: Naciso Trochez H
Identidad No.: 160519580020

0s+js/j9JmdASUYRNJRv4vGIJOMwTxlEhNMKmLebeC3gdo3TCST+qw4APzQXZ+pUDn4A2WZ6KjSdGuSptqSNBJY4nTYMatXboae6FJH6Mx1+O/uC4OZQq8Pu mSwK/2cKCZOAKe41e3ePw3Gdk5hz/weEVqIEMbKF+CwNXO1UQ0=



Municipalidad de Ceguaca

B° EL CENTRO, FTE. AL PARQUE
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.

CHEQUE No. 00006878

CEGUACA

23 de septiembre de 2022

Cuenta N.º: 11-248-000014-0

Lugar y Fecha

NACISO TROCHEZ HERNANDEZ

52,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1012480790011248000014000006878

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de planilla #4 de las fechas: del lunes 29/08/2022 al viernes 02/09/2022, del lunes 05/09/2022 al viernes 09/09/2022, del lunes 12/09/2022 al viernes 16/09/2022 y del lunes 19/08/2022 al viernes 23/09/2022. Construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes (convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) en las aldeas de Santa Ana, San Juan, El Portillo y Casco Urbano.		52,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 605195800020 R.T.N. SOLVENCIA MUNICIPAL	ELABORADO POR:	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006878		NOMBRE	FIRMA

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	PAGO DE Pago de planilla #4 de las fechas: del lunes 29/08/2022 al viernes 02/09/2022, del lunes 05/09/2022 al viernes 09/09/2022, del lunes 12/09/2022 al viernes 16/09/2022 y del lunes 19/08/2022 al viernes 23/09/2022. Construcción de 15 viviendas afectadas por los huracanes (convenio firmado con Aldea Global y Municipalidad de Ceguaca) en las aldeas de Santa Ana, San Juan, El Portillo y Casco Urbano.		52,000.00
AUTORIZADO POR CONTABILIDAD	IDENTIDAD 605195800020 R.T.N. SOLVENCIA MUNICIPAL	ELABORADO POR:	RECIBÍ CONFORME
N.º 00006878		NOMBRE Narciso Trochez H	FIRMA

RECIBO

Por Lps. 52,000.00

Recibí de la Municipalidad de Ceguaca, Santa Bárbara, la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS, (52,000.00) como pago de PLANILLA N° 04 de mano de obra correspondiente al proyecto "CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO" monto que corresponde al pago de mano de obra de (Albañiles) que ha laborado durante el periodo de trabajo del lunes 29 de agosto al viernes 02 de septiembre, del lunes 05 al viernes 09, del lunes 12 al viernes 16 y del lunes 19 al viernes 23 de septiembre del año 2022.

Se adjunta documentación soporte.

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 23 días del mes de Septiembre del año 2022.

Monto Total a Pagar.....Lps. 52,000.00

Neto a pagar.....Lps. 52,000.00

Naciso Trochez H

Naciso Trochez Hernández

Ident. # 1605-1958-00020


Albañil Encargado



NOTA DE AUTORIZACION

Yo **NACISO TROCHEZ HERNANDEZ** con Identidad **#1605-1958-00020** AUTORIZO a **Angel Adelfo Reyes López** Ingeniero Supervisor del Proyecto **"CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO"**, para que cambie el Cheque para el pago de la **Planilla #03** por un monto total de **Lps. 52,000.00**

Y para los interesados firmo la presente en Ceguaca, Santa Bárbara a los 23 días del mes de Septiembre del año 2022.



Naciso Trochez Hernandez

Albañil Encargado



MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
SANTA BARBARA, HONDURAS
TEL: 95501019



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO"

PLANILLA N° 4 (SECTOR ABAJO CASCO URBANO, EL PORTILLO Y SAN JUAN)

PERIODO TRABAJADO: DEL LUNES 29 DE AGOSTO AL VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE, DEL LUNES 05 AL VIERNES 09, DEL LUNES 12 AL VIERNES 16 Y DEL LUNES 19 AL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	NOMBRE	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL N°	Puesto	AGOSTO		SEPTIEMBRE																							Total dias trabajados	Pago por dia Lps./dia	Neto a pagar	FIRMA O HUELLA DIGITAL
					L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V									
					29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23									
1	SELVIN JAVIER LOPEZ CASTELLANOS	1605-1994-00079	700927	ALBAÑIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	500.00	10,000.00	Selvin Javier Lopez			
2	NARCISO PINEDA MONTERROSA	1605-1966-00017	701238	ALBAÑIL	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	500.00	6,000.00	Narciso Pineda			
3	JOSE LINO JIMENEZ ANDINO	1601-1982-00179	701237	ALBAÑIL	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	500.00	6,000.00	Jose Lino J				
4	ELIAS PINEDA RAMIREZ	1605-1977-00011	701236	ALBAÑIL	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	500.00	6,000.00	Elias Pineda				
5	MARTIR PINEDA	1605-1973-00074	701235	ALBAÑIL	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	500.00	6,000.00	Martir Pineda				
6	IVAN RIOS MEJIA	1605-1982-00096	701240	ALBAÑIL	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	500.00	6,000.00	Ivan Rios Mejia				
7	WELDER JOSUE MONTERROSA CASTELLANOS	1605-1993-00086	701234	ALBAÑIL	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	500.00	6,000.00	Welder J.M.C				
8	NARCISO TROCHEZ HERNANDEZ	1605-1958-00020	701239	ALBAÑIL	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12	500.00	6,000.00	Narciso Trochez H				
TOTALES A PAGAR.....															LPS.	52,000.00																	

NOTAS:
1) EL PAGO SE HARA A NOMBRE DEL SEÑOR NARCISO TROCHEZ HERNANDEZ COMO ALBAÑIL ENCARGADO
2) EN EL PROYECTO SE TRABAJA DE LUNES A VIERNES, Y SE PAGA AL FINAL DE LA JORNADA
3) EL PROYECTO SE DIVIDE EN TRES SECTORES: 2 ALBAÑILES DE EL PORTILLO, 4 ALBAÑILES EN SAN JUAN Y 2 ALBAÑILES CASCO URBANO CEGUACA, SANTA BARBARA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022



MUNICIPALIDAD DE CEGUACA
SANTA BARBARA, HONDURAS
TEL: 95501019



PROYECTO: "CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LAS COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO"

PLANILLA N° 4 (SECTOR ABAJO CASCO URBANO, EL PORTILLO Y SAN JUAN)

PERIODO TRABAJADO: DEL LUNES 29 DE AGOSTO AL VIERNES 02 DE SEPTIEMBRE, DEL LUNES 05 AL VIERNES 09, DEL LUNES 12 AL VIERNES 16 Y DEL LUNES 19 AL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

N°	NOMBRE	IDENTIDAD N°	SOLVENCIA MUNICIPAL N°	Puesto	AGOSTO		SEPTIEMBRE																	Total dias trabajados	Pago por dia Lps./dia	Neto a pagar	FIRMA O HUELLA DIGITAL	
					L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J					V
					29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23				

DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ
ENLACE MUNICIPAL

ANGEL ADEOSO REYES
SUPERVISOR MUNICIPAL

NACISO TROCHEZ HERNANDEZ
ALBAÑIL ENCARGADO

JUANA SARAHÍ PINETA
TESORERA MUNICIPAL

DARWIN ENAMORADO
CONTADOR

ALCALDE MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL
El suscrito, HACE CONSTAR: que el contribuyente
Alcides Trochez Hernandez
Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022
por lo que se extiende esta constancia de pago para que pueda
efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg.
No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto
adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº. 701239
Ceguaca Santa Barbara 19/08/2022
Lugar y Fecha

Válido Hasta:

31 de diciembre 2022




Firma y Sello del Alcalde

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL
El suscrito, HACE CONSTAR: que el contribuyente
Welder Jesús Monterrosa
Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022
por lo que se extiende esta constancia de pago para que pueda
efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg.
No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto
adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N°. 701234
Ceguaca Santa Barbara 19/08/2022
Lugar y Fecha

Válido Hasta:

31 de diciembre 2022



Firma y Sello del Alcalde

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL
El suscrito, HACE CONSTAR: que el contribuyente

Martin Pineda

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022 por lo que se extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº. 701235

Ceguaca Santa Barbara 19/08/2022

Lugar y Fecha

Válido Hasta:

31 de diciembre 2022




Firma y Sello del Alcalde

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL
El suscrito, HACE CONSTAR: que el contribuyente
Elvas Pineda Ramirez
Ha pagado sus Impuestos municipales correspondientes al año 2022 por lo que se extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.
N°. 701236
Ceguaca Santa Barbara 19/10/2022
Lugar y Fecha

Válido Hasta:

31 de diciembre 2022



Firma y Sello del Alcalde

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL

El suscrito, HACE CONSTAR: que el contribuyente

Joselino Jimenez Andino

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022 por lo que se extiende esta constancia de pago para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N°. 701237

Ceguaca Santa Barbara 19/08/2022

Lugar y Fecha

Válido Hasta:

31 de diciembre 2022





Firma y Sello del Alcalde

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL
El suscrito, HACE CONSTAR: que el contribuyente
Narciso Pineda Monterrosa
Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2022
por lo que se extiende esta constancia de pago para que pueda
efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg.
No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto
adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N°. 701232
Ceguaca Santa Barbara 19/08/2022
Lugar y Fecha

Válido Hasta:

31 de diciembre 2022



Firma y Sello del Alcalde



INFORME DE SUPERVISION DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA (CONVENIO FIRMADO CON ALDEA GLOBAL Y MUNICIPALIDAD DE CEGUACA) EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA, SAN JUAN, EL PORTILLO Y CASCO URBANO”
PERIODO DEL LUNES 29 DE AGOSTO AL VIERNES 02 DE SWPTIEMBRE, DEL LUNES 05 AL VIERNES 09, DEL LUNES 12 AL VIERNES 16, DEL LUNES 19 AL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

TRABAJO REALIZADO EN EL PERIODO

- Se finalizaron todas las actividades de obra gris en 7 viviendas
- Quedan pendientes finalizar las actividades de piso y tallados en 2 viviendas
- También está pendiente la pintura por parte de Aldea Global
- El Técnico Municipal Davadi Castellanos es el enlace municipal del proyecto el cual se encarga de verificar horarios de trabajo, control de materiales, entre otras actividades de campo relacionadas con el proyecto.
- Se observa obra de buena calidad





EL PROYECTO FUE FINALIZADO SATISFACTORIAMENTE CON SU 9 VIVIENDAS

Ceguaca, Santa Bárbara 23 de Septiembre 2022


Ing. Angel Adolfo Lopez
Ingeniero Civil #5200
Supervisor Municipal

