



Municipalidad de Jocon, Yoro

Tel 2433 – 40 23




Trabajando para el desarrollo del Municipio

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE
ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA

AÑO 2017.

OFICINA DE DIMAJ:



ELABORADO POR: CARMEN CASTRO
JEFE DE DEPARTAMENTO



Municipalidad de Jocon, Yoro

Tel 2433 – 40 23



Trabajando para el desarrollo del Municipio

Informe técnico

Alcantarillado Sanitario primera Etapa de la Zona Urbana del Municipio

En el presente informe se describen cada una de las actividades que se ejecutaron durante todo el mes

- Supervisión del proyecto en fundición de pozos de diferente nivel de altura, acometidas domiciliarias, instalación de tuberías de PVC. de 6 pulgadas, 8 pulgadas, y tubería de 4 pulgadas para acometidas domiciliarias, también se fundieron casquetes y tapaderas para los pozos de inspección y se fabricaron varios moldes de madera para fundiciones en diferentes procesos del proyecto
- Tomas de Fotografía en ejecución del proyecto
- Llenado de acta de recepción de materiales por fecha durante todo el mes
- Llenado de hoja de supervisión del proyecto
- Verificación de material en bodega

Avance del proyecto en el mes de Febrero año 2017

Se ha logrado un avance 4,845.22 Metros lineales de instalación de Tubería que incluye zanjeado o excavación e instalación de la misma completamente terminada y hay 1,059.10 metros lineales solo de excavación para hacer la instalación de tubería en diferentes diámetro según planos.

75 pozos de inspección terminados

272 acometidas domiciliarias terminadas

El proyecto tiene un avance global de 75%


Reporte Fotográfico: B. Lagunas de Oxidación



Panorámica de Lagunas de Oxidación.



Excavación mecanizada de las Lagunas de Oxidación.

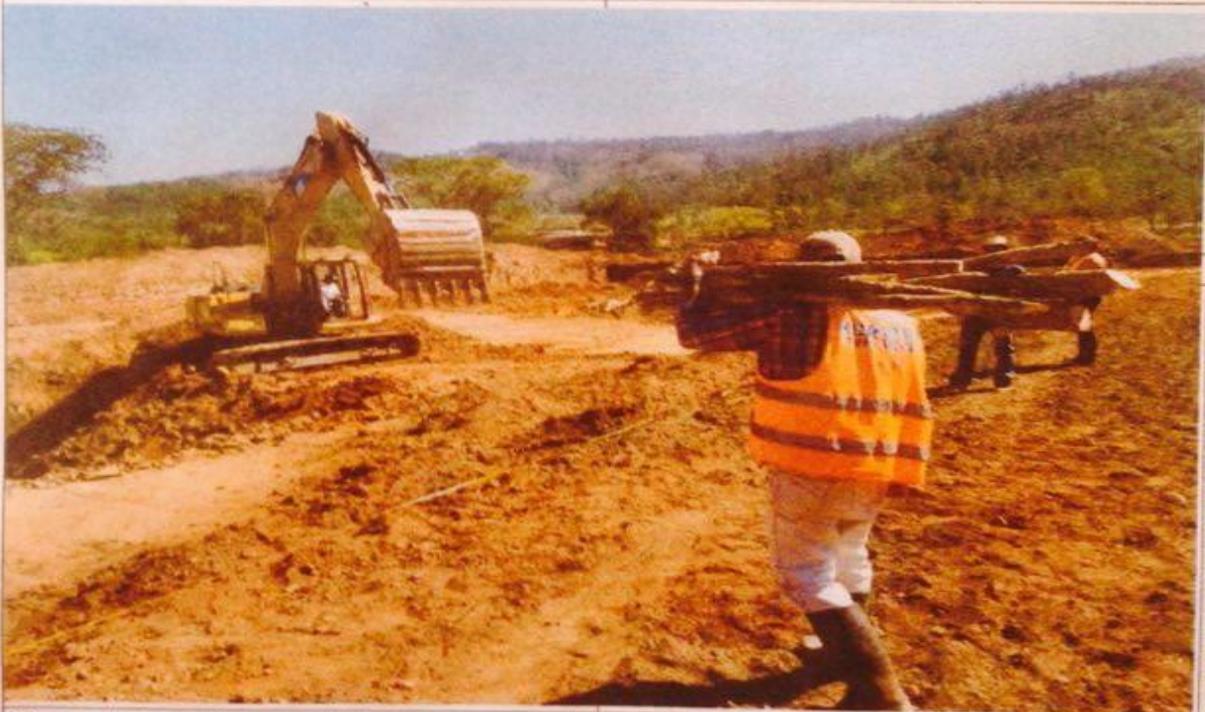

Proceso de Excavación Mecanizado de las lagunas de

Oxidación

Reporte Fotográfico: A. Red Principal



Excavación para colector principal, a 120 m de Lagunas de Oxidación.




Excavación Interrumpida por corredera natural de agua. Se hará obra complementaria



Excavación prevista para cara de limpieza y derivación



Caja de Terminal de Limpieza con su tapadera quebrada

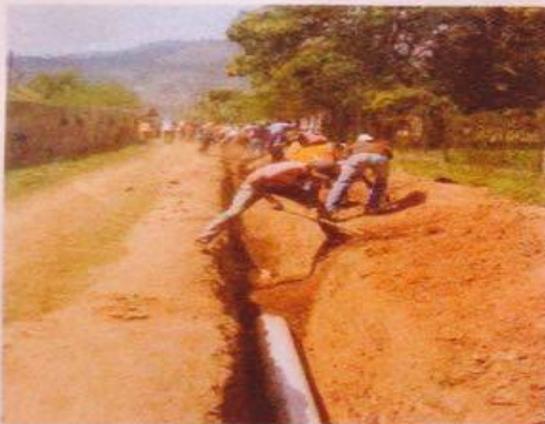

Aterrado de Tubería con M.O. local



Pozo con casquete expuesto



DISEÑO DE ALICATADO Y REJILLA DE CEMENTO MANEJO DE BLOQUE Y CEMENTO		PLANO DE PLANTA Y PERFILES 1ra. ETAPA 1990		DISEÑO DRA. ROSALEY SACON PUESTO GENERAL DISEÑO DRA. ROSALEY SACON PUESTO GENERAL DISEÑO DRA. ROSALEY SACON PUESTO GENERAL	DISEÑO PLANTA CABLEADO GENERAL DISEÑO DE CABLEADO ALICATADO	004 048 004 53
--	--	---	--	---	--	-------------------------
