

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 30/09/20Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd	15% Funcion.		
Sector: 01 Sector Salud																			
111	Programa Fuerza Honduras 45% Tgr/ Abril 2020	Bo Suyapita	03-02-581	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	Programa Fuerza Honduras	Bo Suyapita, Bo El	03-07-573	16	0.00	1,388,004.00	1,388,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
107	Construccion Salon De Reuniones En La Cruz Roja Se	Col Las Americas	06-01-461	1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	Construccion De Modulo Sanitario, Pila, Incinerado		06-01-469	33	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	Contraparte Materiales Clinica El Diabetico	Bo. San Juan	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	51,940.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,940.00	
41	Construccion De Centro De Salud		03-02-461	33	800,000.00	0.00	800,000.00	458,816.25	95.00	301,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,879.80	
78	Programa De Salud	Siguatepeque	03-02-581	33	2,895,000.00	806,761.85	3,701,761.85	1,870,970.42	66.00	0.00	0.00	0.00	576,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447,920.42	
Total del Sector					4,195,000.00	2,394,765.85	6,589,765.85	2,381,726.67		301,063.55	0.00	0.00	576,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259,740.22	

Sector: 02 Sector Educacion																			
50	Construccion De Dos Aulas En Ceb Renacimiento	Bo El Parnaso	06-01-461	33	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	Construccion De Losa Para Segundo Piso En Escuela	Bo El Centro	06-01-461	33	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
79	Programa De Educacion	Siguatepeque	03-01-581	33	3,044,262.00	806,761.85	3,851,023.85	1,130,150.00	46.00	0.00	0.00	0.00	652,632.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,782.95	
30	Modulo De 1 Aulas En Escuela	Aldes Las Cruces	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	Cambio De Techo Escuela Estados Unidos	Bo. El Carmen	06-01-461	33	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	Construccion 1 De Aulas En Escuela Santiago Ventur	Col. 8 De Mayo	06-01-461	33	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	Aula Escolar		06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	284,991.64	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,991.64	
68	Contraparte I Etapa Construccion De Losa Edificaci	Bo. El Centro	06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE
 Fecha de Elaboración del Informe: 30/09/20

Departamento de : COMAYAGUA
 Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
38	Aula Escolar Y Modulo De Baños Para Jardin De Niño	Bo. Altamira	06-01-461	33	420,000.00	0.00	420,000.00	411,916.78	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,916.78	
39	Tachado Del Kinder		06-01-461	33	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	Aula Escolar Escuela Alfonso Guillen Zelaya	Bo Saragoza	03-02-461	33	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	61.00	195,804.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,804.31	
63	Construccion De Dos Aulas Mas Modulo De 4 Baños		06-01-461	33	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
62	Construccion De Dos Aulas Ceb Jose Cecilio Del Val		06-01-461	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	Muro Perimetral En Escuela San Francisco	Bo. San Francisco	06-01-461	33	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
61	Construccion De Un Aula Mas Modulo De 4 Baños		06-01-461	33	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	Modulo De 1 Aulas En Escuela Lampira	Bo. Las Colinas	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	Construccion De Aula En Escuela Dionisio De Herre		06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
85	Proyecto Amhon Escuela Rafael Pineda Ponce (const)		06-01-461	1	0.00	167,700.00	167,700.00	159,290.99	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,290.99	
89	Proyecto Amhon Escuela Estenislao Dominguez (const)		06-01-461	1	0.00	51,770.00	51,770.00	49,180.65	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.65	
90	Proyecto Amhon Ceb Presentacion Centeno (construcc		06-01-461	1	0.00	51,770.00	51,770.00	49,180.65	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.65	
91	Proyecto Amhon Ceb Renacimiento construccion Modu	Barrio El Parnazo	06-01-461	1	0.00	51,770.00	51,770.00	49,180.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.00	
88	Proyecto Amhon Jardin De Niños Nuevo Amanecer (con		06-01-461	1	0.00	167,700.00	167,700.00	159,290.99	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,290.99	
102	Proyecto Cambio De Techo Y Modulos Sanitarios Ceb		06-01-461	1	0.00	92,974.55	92,974.55	0.00	100.00	0.00	92,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,974.54	
07	Construccion De Modulos Sanitarios Con Fosa Septic		06-01-461	33	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/09/20

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
106	Proyecto Escuelas Varias	Siguatepeque	06-01-461	1	0.00	200,000.00	200,000.00	52,260.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.00	
03	Construccion De Cocina, Bodega Y Cielo Falso En Au	Bo Abajo	06-01-461	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	Construccion De Un Aula De Clases En Escuela Jose		03-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	87,970.31	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,970.31	
16	Materiales Para Acondicionamiento De Pabo En Escu		06-01-461	33	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	Cerco Perimetral Escuela Honduras	Bo Arriba	06-01-469	33	229,635.80	0.00	229,635.80	217,988.98	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,988.98	
19	Aula De Clases Y Modulo De Baños Kinder Mi Tesoro	Bo San Antonio	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	Aula Escolar En Escuela Eduardo Oseguera	Bo. San Ramon	06-01-461	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	Proyecto Amhon Ceb La Igualdad construccion 1 Aul		06-01-461	1	0.00	167,700.00	167,700.00	159,290.99	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,290.99	
68	Proyecto Amhon Ceb Juan Jose Castro construccion		06-01-461	1	0.00	167,700.00	167,700.00	159,290.99	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,290.99	
Total del Sector					11,988,897.80	1,925,846.40	13,914,744.20	2,969,982.97		195,804.31	92,974.54	0.00	652,632.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911,394.77	
Sector: 03 Sector vivienda																			
77	Pisos Y Techos Solidarios	En Diferentes Sectores	03-03-463	33	1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	89,500.00	20.00	0.00	0.00	0.00	240,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,050.00	
Total del Sector					1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	89,500.00		0.00	0.00	0.00	240,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,050.00	
Sector: 04 Sector Niñez y Adolescencia																			
93	Proyecto Comida Unical	Siguatepeque	03-10-581	1	0.00	49,560.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
81	Programa Niñez Y Juventud	Siguatepeque	03-10-573	33	1,313,705.00	322,704.73	1,636,409.73	783,569.11	53.00	0.00	0.00	0.00	87,014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	870,583.25	
Total del Sector					1,313,705.00	372,264.73	1,685,969.73	783,569.11		0.00	0.00	0.00	87,014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	870,583.25	
Sector: 05 Sector Atencion a la Mujer																			
80	Programa De La Mujer	Siguatepeque	03-11-573	33	1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	100,332.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,332.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 30/09/20Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd	15% Funcion.		
Total del Sector					1,313,705.00	322,704.74	1,636,409.74	100,332.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,332.00	
Sector: 06 Sector Cultura																			
45	Reconstruccion De Iglesia Catolica	Aldea El Caliche	06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	Contraparte Para Construcion De Cerco En Iglesia		06-01-469	33	55,960.00	0.00	55,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	Construccion Casa De La Cultura	Bo El Carmen	06-01-461	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
83	Programa Todo Por La Paz (cultura)	Siguatpeque	03-04-573	33	245,474.17	322,704.74	568,178.91	23,500.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,985.00	0.00	0.00	155,485.00	
Total del Sector					801,434.17	322,704.74	1,124,138.91	23,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,985.00	0.00	0.00	155,485.00	
Sector: 07 Sector Deportes																			
84	Programa Todo Por La Paz (deportes)	Siguatpeque	03-05-573	33	106,852.00	164,040.37	270,892.37	103,750.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.60	0.00	0.00	108,073.60	
49	Cancha Multiusos, Campo Siguatepeque	Bo. Campo Alegre	03-05-461	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	Construccion De Cancha Multiusos	Aldea Los Chaguites	06-01-461	33	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	Graderias Del Campo De Futbol Semilleros	Bo. San Juan	06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	474,800.50	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,800.50	
Total del Sector					1,756,852.00	164,040.37	1,920,892.37	578,550.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.60	0.00	0.00	582,874.10	
Sector: 08 Sector Part. ciudadana																			
40	Reconstruccion De Centro Comunal		06-01-461	33	500,000.00	0.00	500,000.00	474,954.21	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,954.21	
82	Programa Todo Por La Paz (participacion Ciudadana)	Siguatpeque	03-07-573	33	154,303.32	922,704.74	1,077,008.06	4,136,953.75	392.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,275.00	0.00	0.00	4,225,828.75	
28	Cerca Perimetral En Salon Comunal	Bo. Buena Vista	03-07-469	33	379,401.68	0.00	379,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					1,033,705.00	922,704.74	1,956,409.74	4,611,907.96		21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,275.00	0.00	0.00	4,700,782.96	
Sector: 09 Sector Preservacion del Patrimonio																			
25	Reconstruccion De Antigua Comandancia	Bo Arriba	03-04-461	33	568,230.83	0.00	568,230.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					568,230.83	0.00	568,230.83	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/09/20

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO																			Monto del Gasto Acumulado	Obs
Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia								
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.			
Sector 10 Sector Seguridad																				
57	Contraparte Del Proyecto Convivir 3%	Diferentes Barrios De	03-09-461	33	1,500,000.00	322,704.74	1,822,704.74	167,909.04	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,550.00	0.00	0.00	962,459.04		
109	Programa Honduras Solidaria	Siguatpeque	03-07-573	0	0.00	10,152,000.00	10,152,000.00	10,152,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	***.***	
100	Proyecto Convivir Aldea Las Crucitas		06-01-467	1	0.00	24,612.29	24,612.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
68	Proyecto Convivir Linea Base	Siguatpeque	06-01-467	1	0.00	7,851.03	7,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					1,500,000.00	10,507,168.06	12,007,168.06	10,319,909.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,550.00	0.00	0.00	***.***		
Sector 11 Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña																				
75	Contra Parte Pdm	Siguatpeque	03-09-573	33	1,050,964.00	258,163.82	1,309,127.82	190,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00		
74	Contra Parte De La Udel	Siguatpeque	05-01-573	33	788,223.50	193,622.84	981,846.34	524,085.91	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,220.00	0.00	584,305.91		
73	Contra Parte Proyecto Care	Siguatpeque	05-01-573	33	460,000.00	193,622.84	653,622.84	237,170.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,070.00	0.00	267,240.00		
92	Proyecto Jovenes Emprendedores	Siguatpeque	03-10-581	1	0.00	108,537.21	108,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					2,299,187.50	753,946.71	3,053,134.21	951,255.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,290.00	0.00	1,041,545.91		
Sector 12 Sector Turismo																				
99	Proyecto Convivir Orma	Siguatpeque	06-01-467	1	0.00	283,717.16	283,717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
103	Proyecto Pacot	Siguatpeque	06-01-467	1	0.00	58,080.25	58,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
94	Proyecto Plan De Manejo De Montecillos	Siguatpeque	06-01-467	1	0.00	84,526.25	84,526.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					0.00	426,323.66	426,323.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sector 13 Sector Saneamiento																				
95	Proyecto Del Chupadero	Sito El Chupadero	06-01-469	1	0.00	95,675.35	95,675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	Contraparte Para Ampliacion De Red De Agua Potable		06-01-464	33	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	Contraparte Para Ampliacion De Red De Agua Potable	Bo San Ramon	06-01-464	33	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
76	Contra Parte Proyecto De Agua,aldea Villa		06-01-464	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	219,632.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,632.00		

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUE

Departamento de : COMAYAGUA

Fecha de Elaboración del Informe: 30/09/20

Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Actn	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Ob
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd.	15% Funcion.		
	Alicia																		
23	Ampliacion De La Red De Agua Potable		06-01-464	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	Contraparte Para Perforacion De Pozo	Col. Union Y Esfuerzo	06-01-464	33	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Contraparte Proy Agua	Bo. Altos De Santa	06-01-464	33	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	44.00	123,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,120.00	
70	Contraparte Para Cierre Tecnico De Botadero		06-01-469	33	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,761,905.70	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,905.70	
64	Contraparte Proy Agua	Bo. Oriente	06-01-464	33	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	Tanque De Distribucion Y Almacenamiento De Agua		06-01-464	33	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sector: 14 Sector electrificacion																			
65	Contraparte Electrificación	Aldes Casitas	06-01-481	33	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Ampliacion De La Red Electrica		06-01-481	33	350,000.00	0.00	350,000.00	225,000.00	95.00	107,486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,486.70	
35	Ampliacion De La Red De Electrificación	Bo. Calan	03-07-481	33	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	Const Adicc Y Mejoras Al Sistema Electrico Del Mun	Siguatepeque	06-01-481	1	0.00	541,191.71	541,191.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					700,000.00	541,191.71	1,241,191.71	225,000.00		107,486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,486.70	

Sector: 16 Sector Red Vial																			
08	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo San Miguel	06-01-466	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	500 Metro Lineales De Huellas Der Concreto	Col. San Fernando	06-01-466	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	501 Metro Lineales De Huellas Der Concreto	Bo. Altos De Fatima	06-01-466	33	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104	Construccion De Huellas Plan Del Parnazo	Col Plan Del Parnazo	06-01-466	1	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 30/09/20Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi- caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hind	15% Funcion.		
06	Mantenimiento De Calles Rurales		06-01-466	33	6,000,000.00	9,676.81	6,009,676.81	2,204,500.00	50.00	802,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,940.66	
05	Mantenimiento De Calles Urbanas	Casco Urbano	06-01-466	33	8,000,000.00	790,475.74	8,790,475.74	4,443,315.75	68.00	1,573,715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,031.30	
51	Construccion De 120 Metros De Quinela Para Manejo D	Bo. Cabañas	06-01-466	33	350,000.00	0.00	350,000.00	271,334.20	95.00	60,803.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,138.05	
106	1 Cuadra Pavimento Concreto Hidraulico Bo Abajo	Bo Abajo	06-01-466	5	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	Conformacion, Cuneteado Y Balastreado De 2 Km De C		06-01-466	33	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	Construccion De Puentes Peatonales Para Paso De Qu	Bo Altos De San	06-01-466	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico - B	Bo San Juan	06-01-466	33	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,114,283.11	59.00	65,494.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,777.46	
54	Caja Puente		06-01-475	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44.00	65,726.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,726.98	
44	Construccion De Canal De Aguas Lluvias- Desde Esc	Bo San Antonio - Col El	06-01-464	33	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60	Calle Semipeatonal Frente Al Parque Central	Bo El Centro	06-01-466	33	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
59	Colocacion Senaforos	Bo El Centro	06-01-454	33	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
58	Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo. El Carmen	06-01-466	33	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	Puente Peatonal	Bo. Purañ	06-01-466	33	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
20	100 Metros De Huellas De Concreto	Col. Victor Chavez	06-01-466	33	350,000.00	0.00	350,000.00	332,034.30	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,034.30	
13	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo Arriba	06-01-466	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
69	Caja Puente		06-01-475	33	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	3 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo Fatima	06-01-466	33	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo San Francisco	06-01-466	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

Municipalidad de : SIGUATEPEQUEDepartamento de : COMAYAGUAFecha de Elaboración del Informe: 30/09/20Informe del Trimestre : TRIMESTRE:

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO							Monto del Gasto Acumulado	Obs
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia						
												15 % Proy	35% Vida Mejor	5% Prog Mujer	20% Todos/Paz	10% Pro-Hnd		
10	4 Cuadras De Pavimento Con Concreto Hidraulico	Bo San Antonio	06-01-466	33	2,000,000.00	719,203.05	2,719,203.05	1,178,103.85	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,103.85	


Total del Sector 29,650,000.00 2,149,355.60 31,799,355.60 9,638,571.21 2,568,181.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sector 17 Sector Edificacion de Bienes Municipales																		
72	Mantenimiento Y Mejoras En El Edificio	Bo El Centro	06-01-461	33	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	418,322.73	75.00	336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,822.73
24	Construccion De Comedor Para Empleados	Bo El Centro	06-01-461	33	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	Mantenimiento De Plazas Y Parques	Casco Urbano	06-01-467	33	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,003,015.90	76.00	131,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,765.90
96	Proyecto Convivir Bo San Juan	Bo San Juan	06-01-467	I	0.00	283,113.40	283,113.40	16,864.56	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,864.56
32	Construccion De Nichos Cementerio Las Mercedes	Bo Las Mercedes	06-01-461	33	870,634.69	0.00	870,634.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	Proyecto Convivir Bo El Carmen	Bo El Carmen	06-01-467	I	0.00	283,113.41	283,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Escuela Taller	B. Campo Alegre	06-01-461	33	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	Garantias De Calidad De Proyectos	Siguatepeque	06-01-467	I	0.00	3,591.12	3,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total del Sector 5,120,634.69 569,817.93 5,690,452.62 1,438,203.19 468,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,906,453.19

TOTAL PROYECTOS	70,995,056.99	21,791,215.33	92,786,272.32	39,093,546.26		3,785,505.95	92,974.54	0.00	1,557,147.09	0.00	998,133.60	90,290.00	0.00	45,617,597.44
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--------------	-----------	------	--------------	------	------------	-----------	------	---------------

SALDO DEL TRIMESTRE ANTERIOR L 4,143,417.74 MAS VALOR RECIBIDO DE LA TRANSFERENCIA DEL CUARTO TRIMESTRE L 2,100,631.62 SUMA TOTAL L6,244,049.36 MENOS GASTOS EJECUTADOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2,990,409.80 SALDO DEL CUARTO TRIMESTRE L3,253,639.56

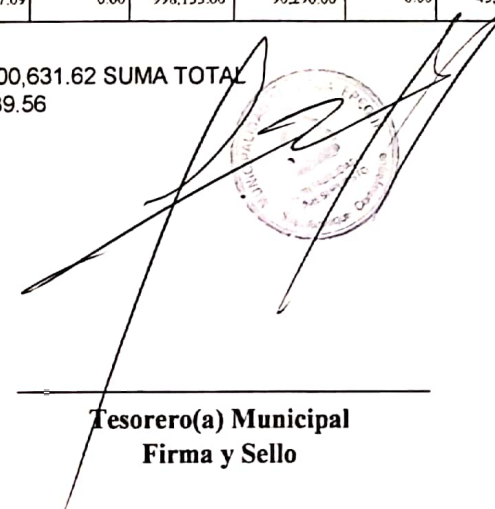

Alcalde(sa) Municipal
Firma y Sello

Secretario(a) Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Firma y Sello
