

MEMORANDO No. 3106-SGIMSG-2024

PARA:

OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:

ING. FERNANDO SALGADO
SUBGERENTE DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES



FECHA:

06 DE DICIEMBRE DE 2024

ASUNTO:


ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Se adjunta el informe de proyectos en ejecución por parte del IHSS para el mes de noviembre 2024

Información de Proyectos mes de noviembre 2024:

- 1- Memorando No. 3098 SGIMSG-2024
- 2- Memorando No. SGM-HRN-1088-2024

Atentamente.

 Cronológico Expediente/Archivo FS/ED

Receptor: Gustavo
6/12/2024
03:10 P.M.
Adjuntos: Seis (6) Folios



MEMORANDO
No. 3098-SGIMSG-2024

5 de Diciembre de 2024

PARA: ING. FERNANDO SALGADO
SUBGERENTE DE INGENIERIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. VICTOR VILAFRANCA
DISEÑADOR Y SUPERVISOR DE OBRAS

ASUNTO: AVANCE DE PROYECTOS

En continuación a Memorándum SGIMSG-0196 del año 2016, donde solicita dar respuesta al ítem N°2 del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **Noviembre del 2024**:

1. "Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS" y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** "Construcción de los Edificios para los Servicios de Hemodiálisis en la Ciudad de La Ceiba y Choluteca del IHSS"
- 4. Ubicación de Proyecto:** La Ceiba y Choluteca.
- 5. Propósito:** Construcción de dos Edificios que puedan brindar los servicios de Hemodiálisis a los pacientes de estas dos ciudades, a fin de que se mejore la atención de los pacientes de esas zonas.
- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizaron trabajos de nivelación de terrenos, cimentaciones, construcción de cimentaciones, paredes de bloque, colocación de pisos y firmes de concreto, paredes de tabla roca, puertas, ventanas, pintura, instalaciones eléctricas, aires acondicionados, losas sanitarias, cisterna, entre otros.

MEMORANDO
No. 3098-SGIMSG-2024

B. Elaboración del Proyecto:

1. Alcance del Proyecto (principal producto): Mejorar la atención de los pacientes de Hemodiálisis del IHSS en las ciudades de La Ceiba y Choluteca.

2. Impacto Ambiental: No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.

3. Impacto en el Terreno y Asentamientos: No representa ningún daño al terreno del Instituto.

4. Detalles del contacto:

- Ing. Fernando Salgado
- Tel: 8957-0963
- fernando.salgado@ihss.hn

5. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios

6. Presupuesto del Proyecto: L. 16, 103,703.91

7. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 25 de Noviembre de 2019.

8. Estado del Proyecto: El proyecto se encuentra detenido desde junio del 2022.

9. Costo de Finalización: El Presupuesto del Contrato era de L. 14, 970, 402.78. Se analiza monto final por análisis técnico, como consecuencia del análisis técnico administrativo.

10. Fecha de Finalización: No se cuenta con fecha de finalización porque se encuentra en análisis técnico-administrativo.

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto está parado desde junio de 2022. Se encuentra en análisis técnico y financiero, para cierre administrativo del proyecto.

MEMORANDO
No. 3098-SGIMSG-2024

2. “Servicios de Evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS” y se informa lo siguiente

A. Identificación del Proyecto:

- 1. Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
- 2. Sector Subsector:** Salud
- 3. Nombre del Proyecto:** “Servicios de evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS”
- 4. Ubicación de Proyecto:** Nivel Nacional
- 5. Propósito:** Contar con un evaluó de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS
- 6. Descripción del Proyecto:** Se realizaron trabajos de avalúo a los terrenos Propiedad del IHSS, esto para realizar una actualización de la situación actual de estos a solicitud de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, adicionalmente actualizar mejoras en Registros Contables. Se aprovechara esta información para solicitar a la Unidad de Asesoría Legal que actualicen sus datos de escrituración.

B. Elaboración del Proyecto:

- 1. Alcance del Proyecto (principal producto):** Realizar Avalúos de los Bienes Inmuebles Propiedad del IHSS.
- 2. Impacto Ambiental:** No se han realizado estudios de impacto ambiental del proyecto.
- 3. Impacto en el Terreno y Asentamientos:** No representa ningún daño a Los terrenos o Edificios del Instituto.
- 4. Detalles del contacto:**
 - Ing. Fernando Salgado
 - Tel: 8957-0963
 - fernando.salgado@ihss.hn

5. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios

6. Presupuesto del Proyecto: L 2, 934,951.00

MEMORANDO
No. 3098-SGIMSG-2024

- 7. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 25 de Febrero de 2022
- 8. Estado del Proyecto:** El proyecto está finalizado.
- 9. Costo de Finalización:** El Costo Final del proyecto quedo en L. 2, 934,951.00
- 10. Fecha de Finalización:** El proyecto se recepciono Parcialmente el 08 de marzo de 2023; pero se les dieron Treinta (30) días calendarios para correcciones de los Entregables y con ello entregarles el Acta de Recepción Final, la cual se entregó en fecha 06 de abril del 2023.

C. Ejecución del Proyecto

Se remitió el informe de validación de servicio a Gerencia Administrativa y Financiera, para trámite de pago, actualmente en la Unidad de Asesoría Legal.

Sin más que agregar.

Atentamente,

VV/FS

cc: Archivo

MEMORANDO
No. SGM-HRN-1088-2024

Diciembre 04 del 2024

PARA: **ING. FERNANDO SALGADO**
Sub Gerente de Ing. Manto y Servicios Generales a Nivel Nacional
IHSS-Tegucigalpa

DE: **ING. ALLAN ZAVALA**
Subgerente de Mantenimiento H.R.N.

ASUNTO: Información de Proyecto Hospital Regional del Norte IHSS-San Pedro Sula.



Por este medio se remite información en relación a la ejecución de proyectos en el Hospital Regional del Norte, correspondiente al mes de **NOVIEMBRE del 2024**:

El proyecto de **“REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”. Contrato No. 0129-2022**” y se informa lo siguiente:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “REPARACIÓN DE TECHOS LOSAS DEL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE ETAPA 1 DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital Regional del Norte S.P.S. Col. Tara, San Pedro Sula.
5. **Propósito:** reparación de estructura y cubierta de techos, reemplazo de encielados e impermeabilización de losas del ala norte del HRN.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de demoliciones, desmontajes de aires acondicionado, montaje de las misma unidades colocación de láminas de aluzic, cielo falso, entre otros.

B. Elaboración del Proyecto:

7. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Mejorar la atención en el servicio de Salas de Ginecología, Maternidad, Cirugía de Mujeres, Cirugía de Hombres, Medicina de Mujeres, Medicina de Hombres, Pediatría A, Pediatría B, Ortopedia y Almacén Regional del Hospital Regional del Norte, IHSS.
8. **Impacto Ambiental:** No aplica

9. Impacto en el Terreno y Asentamientos: No aplica

10. Detalles del contacto:

- Ing. Fernando Salgado
- Tel: 8957-0963
- Fernando.salgado@ihss.hn

11. Fuentes de financiamiento: Fondos Propios


12. Presupuesto del Proyecto: L. 8,272,677.29

C. Ejecución del Proyecto:

El proyecto se encuentra en suspensión de labores desde 02 de Mayo del 2023, actualmente en proceso de cierre administrativo.

Sin más que agregar.

Atte.

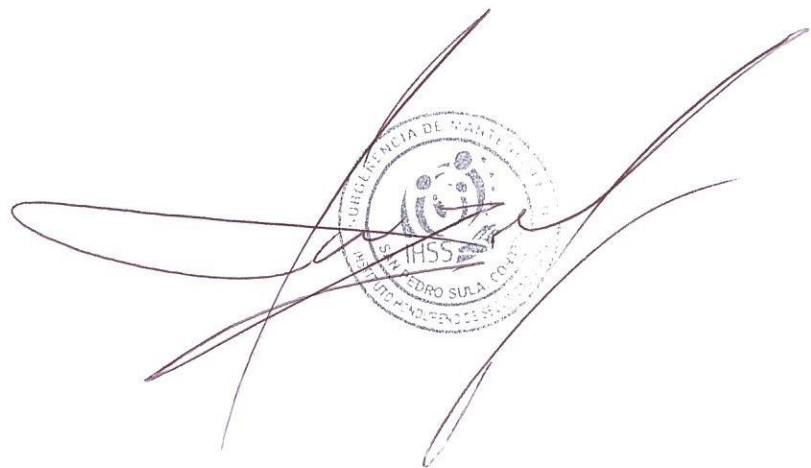

cc. Archivo

