



*Municipalidad de Jocón, Yoro*

Tel 2433 - 40 23

E-MAIL munijocon@hayoo.com



---

Trabajando para el desarrollo del Municipio

**Informe técnico: Proyecto de Alcantarillado Sanitario Primera  
Etapa  
Carmen Castro  
Jefe de DIMAJ:  
Mes de Mayo Año 2017**



## *Municipalidad de Jocón, Yoro*

Tel 2433 - 40 23

E-MAIL munijocon@hayoo.com



---

**Trabajando para el desarrollo del Municipio.**

### **Informe técnico del proyecto de Alcantarillado Sanitario primera Etapa.**

En el Mes de Mayo del presente año se ejecutaron diversas actividades en relación al proyecto de alcantarillado sanitario de la primera Etapa de la Zona Urbana de Jocon, procesos de fundición, pegado de ladrillos en levantado de pozos de inspección de diferentes diámetros y acometidas Domiciliarias y así mismo repello, pulido en cada uno de estos procesos, y se han desarrollado muchas actividades en las laguna de oxidación, el cual comprenden 3 Lagunas 2 madurativas y una facultativa las que llevan un avance del 92% y tienen una profundidad de 2.70 metros cada una, también se ha avanzado en lo que son 2 pozos de inspección los que forman parte de las lagunas, es importante mencionar que todos los procesos y avances del proyecto actual se está ejecutando con personal contratado por la Alcaldía, que son peones, albañiles y otros.


Se realizaron diariamente supervisión en cada proceso y avance del proyectó con la coordinación del ingeniero supervisor del proyecto contratado por la corporación municipal, comisión ciudadana de Transparencia y el comisionado Municipal.

Se entregó constantemente materiales para la ejecución del proyecto como cemento, varillas corrugadas de 3/8, ¼ lisa ,3/4 corrugada legitima, ladrillos rafon , madera para encobrar y se fabricaron varios armados de hierro para tapaderas y casquetes de pozos y acometidas Domiciliarias del Proyecto todo esto fue supervisado por el ingeniero encargado del proyecto


El proyecto está en un avance del 95% global.

Ejecutado en el Mes de Mayo Año 2,017

N.	Numero de Programa	Nombre de Programa	Monto Ejecutado en el Mes de Mayo
-	11- Servicios Públicos	Proyecto de Alcantarillado Sanitario Primera Etapa	LPS.754,445.00




DIFERENTES PROCESO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO  
PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE JOCON.

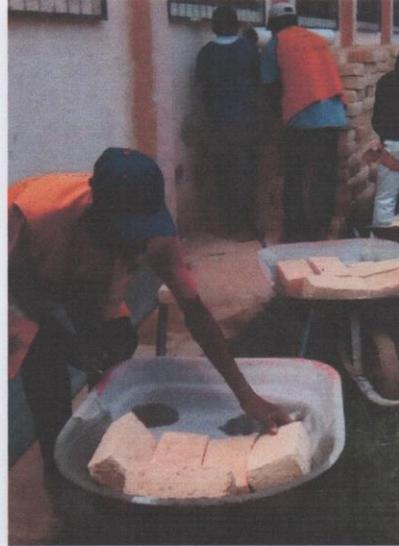



*[Handwritten signature]*

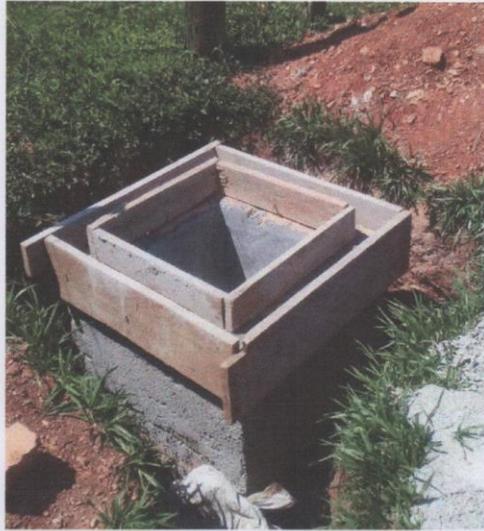

*[Handwritten signature]*
