



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

Informe del estatus de la Cartera de Proyectos ejecutados por la SAG


Mayo

## Presentación

En cumplimiento a las normas establecidas en las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigentes, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), tiene a bien presentar el Informe de Avance Físico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al mes de **Mayo** del Año 2021.

La SAG, cumple con un rol normador y coordinador en el Sector Agroalimentario, implementando los lineamientos de política establecidos en el Plan Operativo y Presupuesto 2021, las prioridades definidas en el Plan de Nación, como requisito para el cumplimiento del Decreto No. 286-2009, correspondiente a la Ley para el establecimiento de una Visión de País; además de las áreas programáticas de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP), disposiciones que han sido adoptadas por la SAG, en la planificación operativa y presupuestaria de corto y mediano plazo con el propósito de promover el bienestar de la población rural y contribuir al alcance de reducción de la Pobreza en Honduras.

Este informe tiene como propósito proporcionar información oportuna que facilite la toma de decisiones por parte de autoridades superiores de la SAG, así como mostrar la transparencia de las acciones ejecutadas en el sector, en relación al manejo de los fondos, tanto nacionales como externos, además de demostrar los impactos socio-económicos que se están generando con la implementación de las políticas del sector agroalimentario en el área rural a través de los logros obtenidos por los proyectos.

  
Ing. Ricardo Peña Ramírez

Director UPEG-SAG



## **Gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería**

La Secretaría de Agricultura y Ganadería, fue creada mediante Decreto Legislativo número 218-96 del 17 de diciembre de 1996 de conformidad a lo establecido en la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola.

El objetivo general de la SAG es la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas relacionadas con la producción, conservación y comercialización de alimentos.

Impulsa procesos que permiten agregar valor, en la reducción de la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria, respondiendo a una economía globalizada y a las necesidades del mercado interno integrado en un esquema de desarrollo humano, social ambiental y productivo basado en la autogestión, la participación comunitaria con enfoque de género y del manejo sostenible de los recursos.

Los lineamientos estratégicos para la implementación de las metas, resultados estratégicos y lineamientos de política se basan, en Programa de Gobierno "Honduras avanza con paso firme".

En este contexto, la SAG cumple en la Administración Pública un triple papel:

- a) Ejercer acciones como coordinador del sector público agroalimentario,
- b) Atender las funciones institucionales específicas y
- c) Representar al sector agroalimentario nacional a escala regional e internacional.

La SAG perteneciente al Gabinete Económico, para el presente año contempla 3 proyectos que se detallan en el presente documento.

## **Resumen Ejecutivo**

Actualmente, la Institución cuenta con un Programa de Inversión Pública conformado por 3 proyectos:

1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)
2. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en el Valle de Jamastrán (JAMASTRÁN)
3. Proyecto de Competitividad y Desarrollo Rural Sostenible del Corredor Fronterizo Suroccidental de Honduras (PROLENCA).


Estos proyectos son financiados con fondos Nacionales, fondos del BCIE, FIDA y Exim Bank, de la India, mismos que están focalizados en distintos departamentos del país para atender pequeños productores. En su conjunto los Proyectos de inversión cuentan con un presupuesto vigente de L. **868, 647,951.00** representando un **39.29%** del presupuesto total de la institución L.2, 210, 605,358. Los Proyectos de inversión reflejan una ejecución en el mes de mayo de L **15, 314,680.69**

Ejecución Financiera por Tipo de Fondos  
(En Lempiras)

FUENTE	Proyectos de Inversión Pública		
	Presupuesto Vigente	Ejecución Mayo	Ejecución acumulada al 31 de Mayo
Fuente 11: Fondos Nacionales	20,035,359.00	187,459.40	417,651.74
Fuente 21: Crédito Externo	834,320,202.00	15,085,821.29	68,657,085.08
BCIE	415,719,774.00	10,302,824.47	30,088,864.41
FIDA	231,206,843.00	4,782,996.82	38,568,220.67
INDIA	187,393,585.00	-	-
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	14,292,390.00	41,400.00	4,742,303.50
	<b>868,647,951.00</b>	<b>15,314,680.69</b>	<b>73,817,040.32</b>

Fuente: SIAFI

Presupuesto Vigente vs Presupuesto mensual y Acumulado

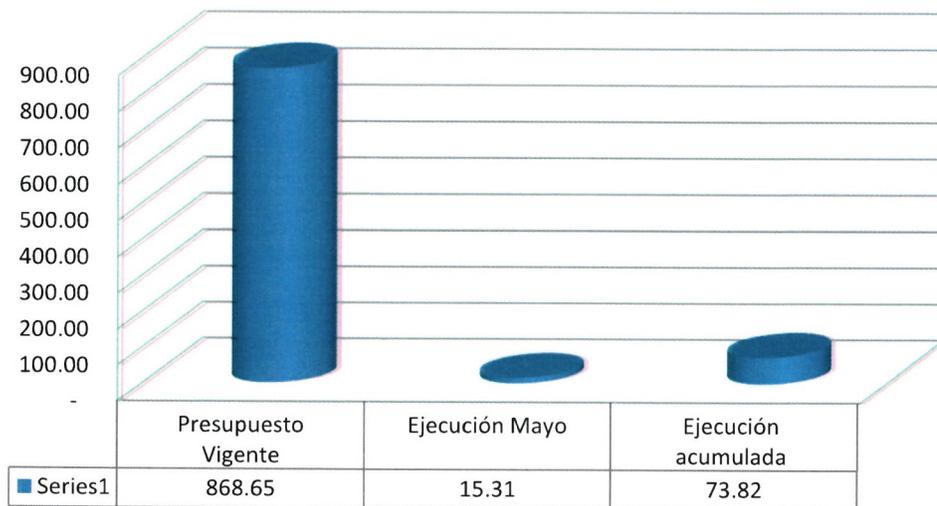

## 1. Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Objetivo: El PDABR tiene como principal objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Descripción del proyecto: El Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) ejecutará cinco subproyectos que se detallan a continuación:

1. Construcción y rehabilitación del Sistema de Riego de San Sebastián
2. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Selguapa
3. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Olomán
4. Diseño y construcción del Sistema de Riego Valle de Sulaco
5. Diseño y construcción de Pequeño Riego

El programa beneficiará a 3,371 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 8,476 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.1,118,047,750.00.

El Proyecto inició el 30/11/2013 y su fecha de finalización es el 30/11/2019, es relevante destacar que se le ha autorizado a dicho Proyecto una ampliación por 24 meses adicionales (29/11/2021), mediante la Resolución N°. PRE-99/2019 por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) del plazo para el retiro de la totalidad de los fondos del préstamo N° 2101 otorgado a la Republica de Honduras para financiar la ejecución del Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), mediante Resolución N°. DI-89/2012.

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en los departamentos de Comayagua y Yoro.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

### Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PDABR (En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Mayo						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Mayo	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 11: Fondos Nacionales	20,035,359.00	20,035,359.00	187,459.40	0.94	417,651.74	2.08	19,608,610.50
Fuente 21: Crédito Externo (BCIE)	423,729,071.00	415,719,774.00	10,302,824.47	2.48	30,088,864.41	7.24	385,6 <sup>^</sup>
<b>Total</b>	<b>443,764,430.00</b>	<b>435,755,133.00</b>	<b>10,490,283.87</b>	<b>2.41</b>	<b>30,506,516.15</b>	<b>7.00</b>	<b>405</b>

Fuente: SIAFI

Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021

PDABR

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado Mayo	Ejecutado Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
<b>Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)</b>	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores / as.	Hectárea	212	0	0	2,026	0	0
	Nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores / as.	Hectárea	0	0	0	363	0	0
	Hectáreas de tierra agrícolas con infraestructura de riego rehabilitadas en parcelas de los productores / as.	Hectárea	0	0	0	1,200	0	0
	Sistemas de riego instalados en parcelas de tierra agrícolas de los Productores/as.	Sistema de Riego	0	0	0	363	0	0
	Represas construidas para los sistemas de riego instalados, en tierras agrícolas de los productores /as.	Obra de Infraestructura	2	0	0	24	0	0
	Hectáreas sembradas con cultivos no tradicionales en parcelas de tierra agrícola de los productores/as.	Hectárea	0	0	0	363	0	0
	Grupos empresariales de productores/as organizados, de acuerdo a la producción agrícola.	Grupo	0	0	0	7	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Fuente: SIAFI

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado Mayo	Ejecutado Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
<b>Rehabilitación, Construcción y Modernización de Áreas de Riego</b>	Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)	Kilómetro	11	2.3	21	150	4.3	3
<b>Asistencia Técnica y Comercialización</b>	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial). Aplicando medidas de bioseguridad	Capacitación	13	4	31	82	13	16
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	Contrato	0	0	0	17	0	0
<b>Organización y Desarrollo Local</b>	Capacitaciones brindadas a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias).	Capacitación	2	22	1100	19	35	184
<b>Gestión Ambiental</b>	Capacitaciones impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas. Aplicando medidas de bioseguridad.	Capacitación	2	2	100	13	7	54
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>250</b>	<b>Anual</b>		<b>51</b>

Fuente: SIAFI

**Principales actividades realizadas en el mes:**

- No presenta logros ni actividades relevantes para este mes de mayo.

**Problemática que afecto la ejecución en el mes de mayo:**

- Se continúa con la elaboración de los Convenios de Servidumbre de los sectores de riego y de los convenios de cesión de las obras de infraestructura como ser: Unidades de Riego, Unidades de Purga, toma-granjas, han tardado más tiempo de lo programado.
- Se continua con la mayoría de los Proyectos están parados por diferentes motivos como ser: trámites de extensiones de contratos a través de la firma de adendas. Más sin embargo se están realizando todas las gestiones para agilizar dichos trámites.
- **PROYECTO DE SULACO**
  - La No firma de la Adenda 3 y 4 del Proyecto de Sulaco.
  - Definir y Aprobar Presupuesto de daños por tormentas ETA y IOTA todos Los Proyectos.
  - Se continua con la Pandemia de la COVID-19 y la desmotivación de beneficiarios por la casi paralización total de actividades en la construcción.
- **PEQUEÑOS PROYECTOS DE RIEGO PPR**
  - Se continua con el referente al Lote (No.1 y No. 2) de PPR, se realizó la evaluación de la precalificación y oferta técnica, el informe fue remitido al BCIE el 22 de Enero 2021, pero aún no se ha tenido respuesta de las observaciones o la no objeción del BCIE para continuar con la apertura de la oferta económica de dichos lotes.
  - Se continúa con el estancamiento en la construcción de los proyectos de riego, la población beneficiaria ha mostrado duda en su finalización y muestran desinterés en participar en eventos de formación.
  - Se continua con la Pandemia de la COVID-19 y la desmotivación de beneficiarios por la casi paralización total de actividades en la construcción.
  - la participación de los beneficiarios a los diferentes eventos de capacitación sea muy baja, alrededor del 40%.
  - Recopilación de documentación requerida por el Reglamento de Inversiones de PPR.
  - Se continúa con la falta de contratación de la empresa que formulara los planes de manejo de cuencas y la empresa que desarrollará los talleres de capacitación en temas ambientales.

**2. Proyecto de Desarrollo Agrícola bajo Riego del Valle de Jamastrán**

Objetivo: Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Descripción del proyecto: Cada módulo tendrá una obra de derivación, un estanque construido de acuerdo con las condiciones topográficas, una estación de bombeo, las líneas de conducción y distribución hasta las cabeceras de las parcelas, los mecanismos de control, filtrado y regulación.

El programa beneficiará a 1,259 familias rurales por medio del acceso al agua para riego de 2,276 hectáreas con un costo total del Proyecto de L.609, 235,000.00.

El Proyecto inició 01/12/2016 y su fecha de finalización es de 28/08/2022

Localización: La zona de intervención del Proyecto es en el departamento de El Paraíso, Municipio de Danlí, Valle de Jamastrán.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del mes:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos JAMASTRAN  
(En Lempiras)**

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Mayo						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Mayo	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (India)	187,393,585.00	187,393,585.00	-	0.00	-	0.00	187,393,585.00
<b>TOTAL</b>	<b>187,393,585.00</b>	<b>187,393,585.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>187,393,585.00</b>

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021  
JAMASTRÁN**

Programa	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado Mayo	Ejecutado Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
<b>Proyecto Desarrollo Agrícola bajo Riego Valle de Jamastrán Fase I</b>	Estaciones de Bombeo y Equipamiento instalado en los módulos de riego, en las parcelas agrícolas de los productores /as integrados en la asociación de regantes del Valle de Jamastran .	Estación	0	0	0	630	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Actividad/Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado Mayo	Ejecutado Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
<b>Infraestructura de Riego</b>	Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	0	0	0	100	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Fuente: SIAFI

**Principales actividades realizadas en el mes:**

- No presenta logros ni actividades relevantes para este mes de Mayo.

**Problemática que afecto la ejecución en el mes de Mayo:**

- Las garantías bancarias fueron entregadas de manera tardía por lo que todo acto administrativo estaba en pausa. De igual manera se está a la espera del Informe de Auditoría.
- Se continúa con atrasos administrativos por parte del proveedor, el proyecto no se pudo reactivar a tiempo, lo cual hizo que no se pudiera realizar la solicitud de pago directo. De igual manera el contratista aún no presenta las facturas correspondientes al siguiente embarque, ya que existe un nuevo brote de COVID-19 en la India.
- Se continúa en la India con un nuevo brote de COVID-19 el cual ha afectado el actuar del contratista, quienes no pueden movilizar a sus técnicos a Honduras.
- La carta de crédito Banco Central de Honduras y EXIM Bank de la India se encuentra vencida.

**3. Proyecto para la Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental (PROLENCA).**

Objetivo: Mejorar los ingresos, las oportunidades de empleo, la seguridad agroalimentaria y las condiciones de vida de la población rural pobre, con un enfoque de inclusión social y equidad de género y con miras a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

Descripción del proyecto: El grupo objetivo del Proyecto incluye: (a) pequeños productores agropecuarios con limitaciones de acceso a recursos productivos y diversos grados de organización y vinculación con los mercados; (b) artesanos rurales con organización incipiente y débilmente vinculadas a los mercados; y (c) micro-empresarios rurales y comerciantes de pequeña escala.

La población considerada como beneficiarios directos del Proyecto, la conformarán 11,000 familias rurales pobres localizadas en 36 municipios de los departamentos de Lempira, La Paz e Intibucá, que además incluye las 826 familias rurales de los 11 municipios de los departamentos de Atlántida, Cortés y Santa Bárbara, correspondientes a Horizontes del Norte (estimándose la totalidad de beneficiarios en 33.000 familias/264,000 personas) que están asociados a organizaciones rurales legalmente constituidas.

El Proyecto tiene un costo total del Proyecto de L.574, 086,000. El Proyecto inició 15/04/2016 y su fecha de finalización es de 30/09/2022.

Localización: La zona de intervención del Proyecto se localiza en los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira, Adicionalmente se incluyen 11 municipios para acciones concretas dejadas por el Proyecto Horizontes del Norte: Atlántida, Cortés y Santa Bárbara.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros actualizados:

**Ejecución Financiera por Tipo de Fondos PROLENCA**  
(En Lempiras)

FUENTE	Ejecución Presupuestaria al 31 de Mayo						
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Mayo	% de Ejecución	Ejecutado Acumulado	% de Ejecución	Saldo Presupuestario
Fuente 21: Crédito Externo (FIDA)	242,328,443.00	231,206,843.00	4,782,996.82	2.07	38,568,220.67	16.68	191,965,434.83
Fuente 22: Donaciones Externas (FIDA)	2,700,000.00	14,292,390.00	41,400.00	0.29	4,742,303.50	33.18	9,550,086.50
<b>Total</b>	<b>245,028,443.00</b>	<b>245,499,233.00</b>	<b>4,824,396.82</b>	<b>1.97</b>	<b>43,310,524.17</b>	<b>17.64</b>	<b>201,515,521.33</b>

Fuente: SIAFI

**Avance Físico del Plan Operativo – SIAFI – 2021**  
**PROLENCA**

Proyecto	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado Mayo	Ejecutado Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
Programa de Competitividad Rural	Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias.	Plan de Inversión	0	0	0	65	0	0
Programa de Competitividad Rural	Desembolsos realizados a las Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados.	Cantidad	0	0	0	70	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Actividad / Obra	Resultado de Producción	Unidad de Medida	Avance Físico mes de Mayo			Ejecución Acumulada		
			Programado Mayo	Ejecutado Mayo	%	Programado Anual	Ejecutado Acumulado a Mayo	%
Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiadores.	Plan	0	0	0	65	0	0
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas.	Plan	0	0	0	65	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios	Convenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	Convenio	0	0	0	40	0	0
	Asistencias técnicas a Productores (as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.	Asistencia técnica	0	0	0	65	0	0
Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	0	0	0	2	0	0
Desarrollo Productivo y de Negocios FIDA II	Convenio suscritos con las organizaciones ( hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	Convenio	0	0	0	30	0	0

<b>Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social FIDA II</b>	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	Kilómetro	0	0	0	48	0	0
	Rehabilitación de líneas de conducción tuberías para sistemas de riego instalado en parcelas de tierra agrícola	Kilómetro	0	0	0	20	0	0
	Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego.	Hectárea	0	0	0	50	0	0
	Instalados eco-fogóns en hogares de familias de productores (as).	Eco-Fogón	0	0	0	100	0	0
	Instaladas letrinas en hogares de familias de productores(as).	Letrina	0	0	0	100	0	0
<b>Manejo de Recursos Naturales y Mejora de Infraestructura Económica y Social</b>	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación.	Hectárea	0	0	0	125	0	0
<b>Nivel de Ejecución</b>			<b>Mensual</b>		<b>0</b>	<b>Anual</b>		<b>0</b>

Fuente: SIAFI

**Principales logros y actividades relevantes realizadas en el mes de Mayo:**

- Se realizó un levantamiento topográfico de un posible sistema de Riego, en la aldea de El Rosario, Municipio de San Antonio, Departamento de Intibucá, el cual está en proceso de diseño.
- 60 Familias sensibilizadas sobre las medidas de adaptación al cambio climático en los hogares por medio de los eco fogones instalados.  
Spots radiales desarrollada de sensibilización a la problemática ambiental.
- En el mes de mayo se reporta según los informes de asistencia técnica la generación de 32 nuevos empleos temporales valorados en L 105,650.00.

## Conclusiones

- El presupuesto ejecutado en el mes de mayo es de L.15, 314,680.69 de la cartera de proyectos vigente correspondiente a L.868, 647,951.00. A la fecha se a ejecutado un monto de L.73, 817,040.32 que representa un 8.50%.
- Es importante mencionar que la ejecución financiera para este mes de mayo, tuvo una leve disminución con respecto al mes anterior.
- Los Proyectos a la fecha no tienen la ejecución física y financiera esperada.

## Recomendaciones

- Seguimiento conjunto con los Proyectos de Inversión, la Unidad Administradora de Proyectos, la Gerencia Administrativa y la UPEG, a fin de identificar los cuellos de botella que desfasen la ejecución tanto financiera como física.
- Se debe de dar celeridad a los procesos de adquisiciones para obtener un mejor nivel de ejecución tanto físico como financiero en los Proyectos anteriormente mencionados.

**Fecha de Elaboración: 08 de junio de 2021**

**Elaborado por: Alidio Donaire Pereira / Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.**

**Cargo: Técnico de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos.**
