

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Unidad Técnica Municipal. (UTM)
REPORTE DE ACTIVIDADES



04/09/2024

Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Ing. Víctor Exequiel Saucedá García



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

ÍNDICE:

ÍNDICE-----	1
INTRODUCCIÓN-----	2
OBJETIVOS-----	3
ACTIVIDADES-----	4
REGISTRO FOTOGRÁFICO -----	5-6



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

INTRODUCCIÓN:

El siguiente informe tiene como finalidad dar a conocer las actividades que he realizado en el mes de abril del presente año, Las actividades que he realizado se enfocan en supervisar los proyectos que se llevan a cabo en dicho mes, Proyectos que se desarrollan con la parte administrativa de la municipalidad, y visitas a diferentes comunidades y caseríos de nuestro municipio con el objetivo de brindar aspectos técnicos para el buen desarrollo de los mismos.

Es necesario mencionar que dentro de proyectos que se desarrolla se encierran una cierta cantidad de actividades previas al mismo, como por ejemplo, conocimiento del tipo de perfil, levantamiento en campo, cotización de materiales costos, presupuestos, y el, seguimiento continuo de avances de aprobación del proyecto, también es importante mencionar que por parte nuestra le doy asesorías técnicas a los demás departamentos de la municipalidad, para hacer los trabajos en conjunto garantizando que los métodos técnicos sean ejecutados de la mejor manera, para beneficio de los beneficiarios directos que son los pobladores del municipio y de nuestra institución.



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

OBJETIVOS:

Generales:

Dar a conocer las actividades y el trabajo que desarrollo como empleado de la Municipalidad de Santa Lucía, en el tiempo determinado para cada informe.

Específicos:

- Dar a conocer las actividades realizadas.
- Control de seguimiento.
- Eficiencia y eficacia laboral.
- Plan de desarrollo personal.
- Justificación laboral.
- Orden y disciplina laboral



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Presupuestos
- Perfilación de nuevos proyectos
- Supervisión de proyectos
- Ejecución de proyectos
- Contratación de personal
- Control de personal técnico
- Procesos administrativos de compras públicas
- Procesos de ley de contratación del estado
- Dirección de personal
- Colaboración constante al departamento de UMA
- Colaboración constante al departamento de catastro municipal
- Colaboración con los demás departamentos en relación a asuntos técnicos y de logística laboral.
- Reuniones con diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de traer proyectos al municipio
- Reuniones con comunidades para ejecución de proyectos
- Control y seguimiento al plan de desarrollo municipal
- Propuestas para desarrollas de manera más eficiente las actividades laborales
- Atención a los contribuyentes
- Atención a los pobladores en la solicitudes de nuevos proyectos
- Participación en actividades y reuniones comunitarias
- Socializaciones de proyectos
- Entrega de materiales para ejecución de proyectos.
- Visitas de campo con personal de instituciones públicas.


Ing. Víctor Exequiel Saucedo

Coordinador UTM
Alcaldía municipal de Santa Lucia








Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

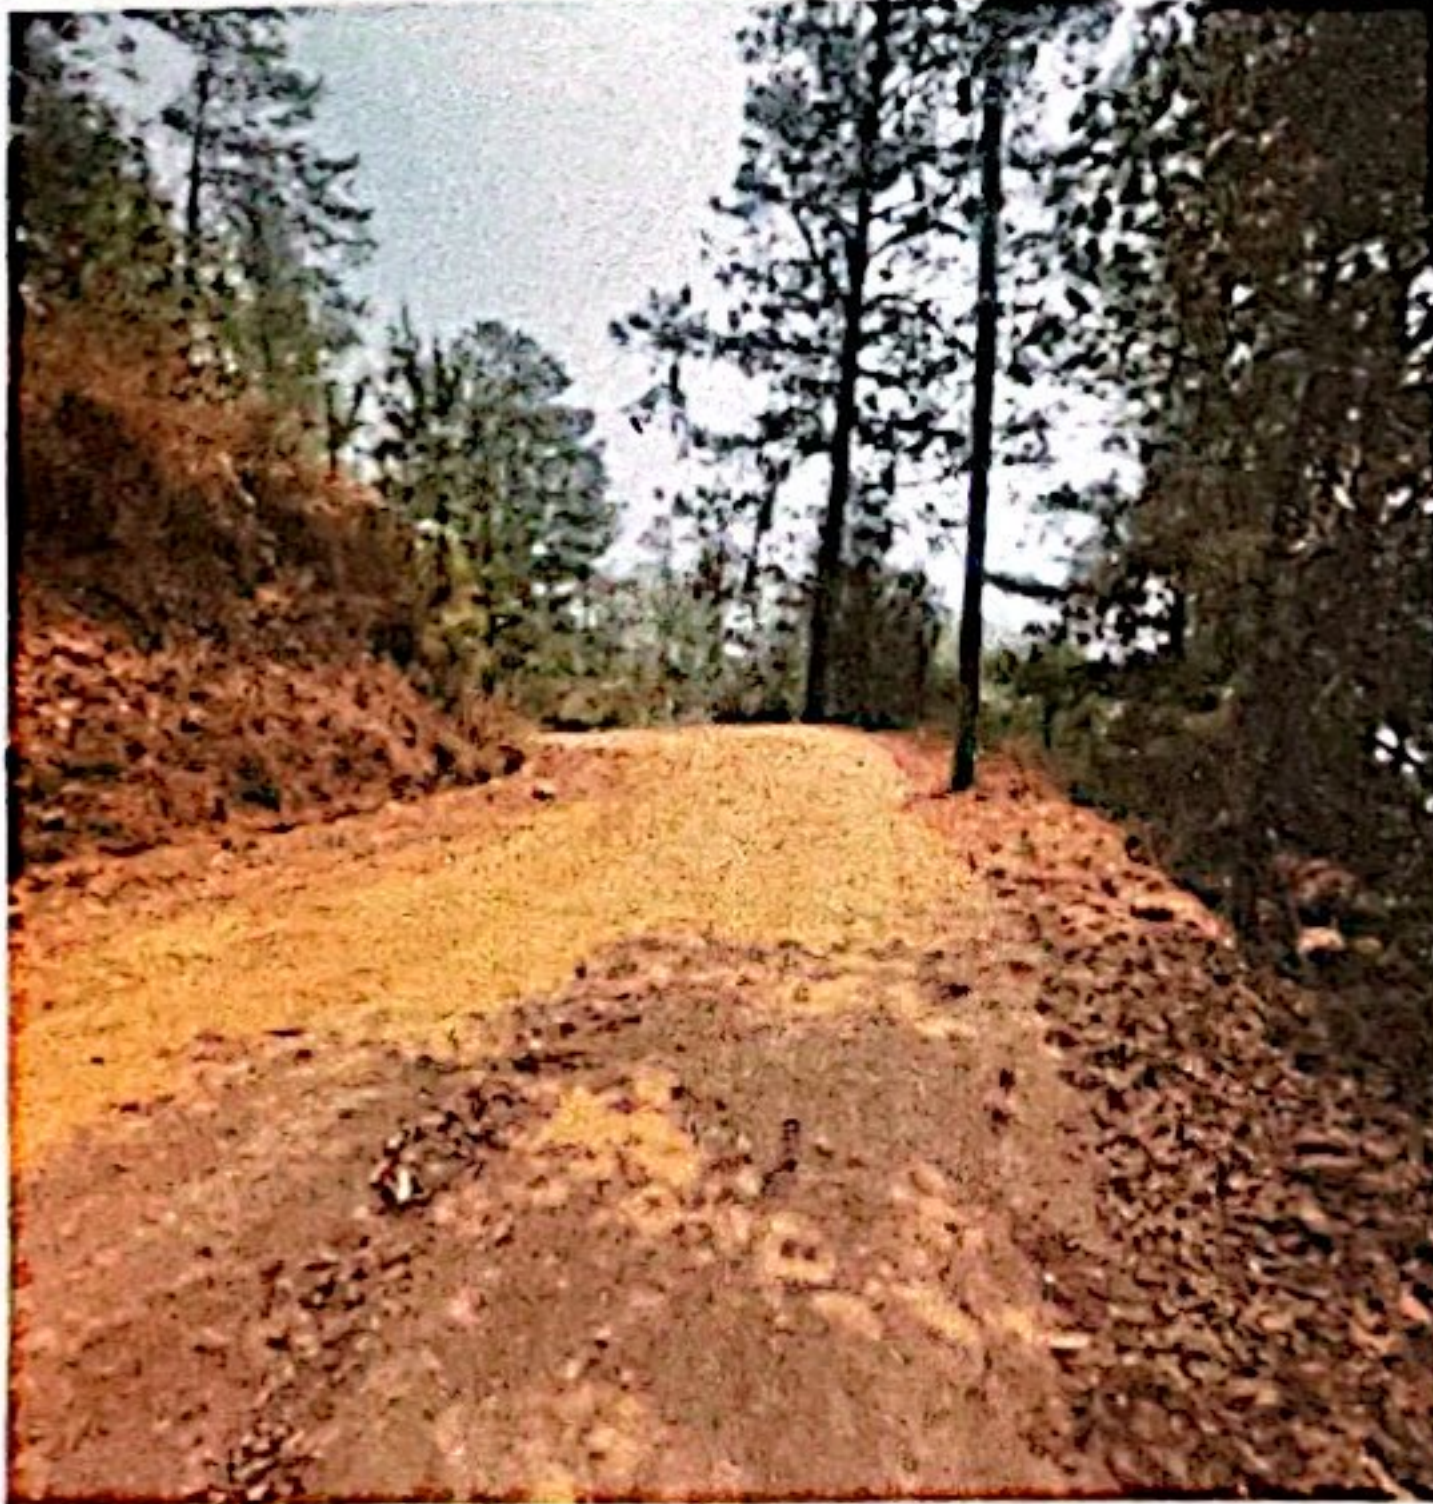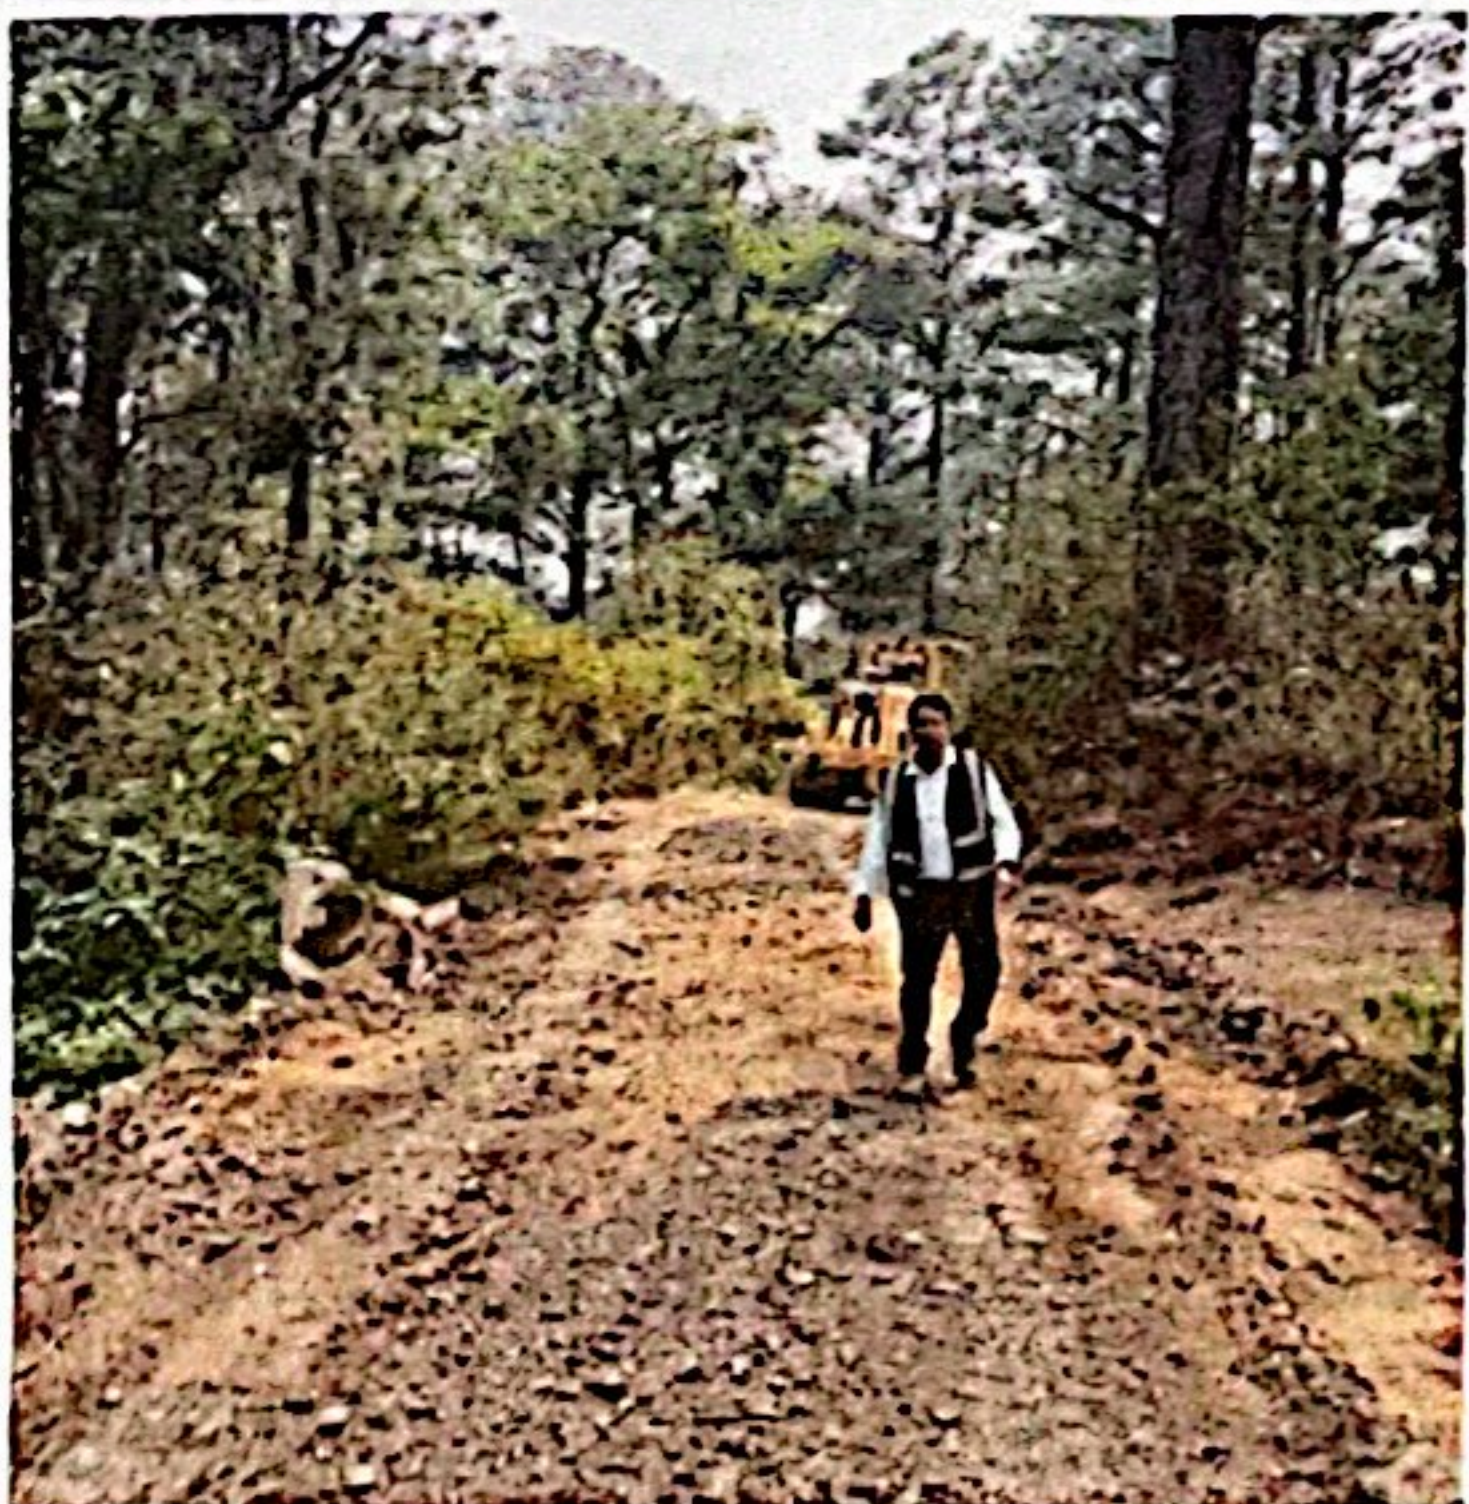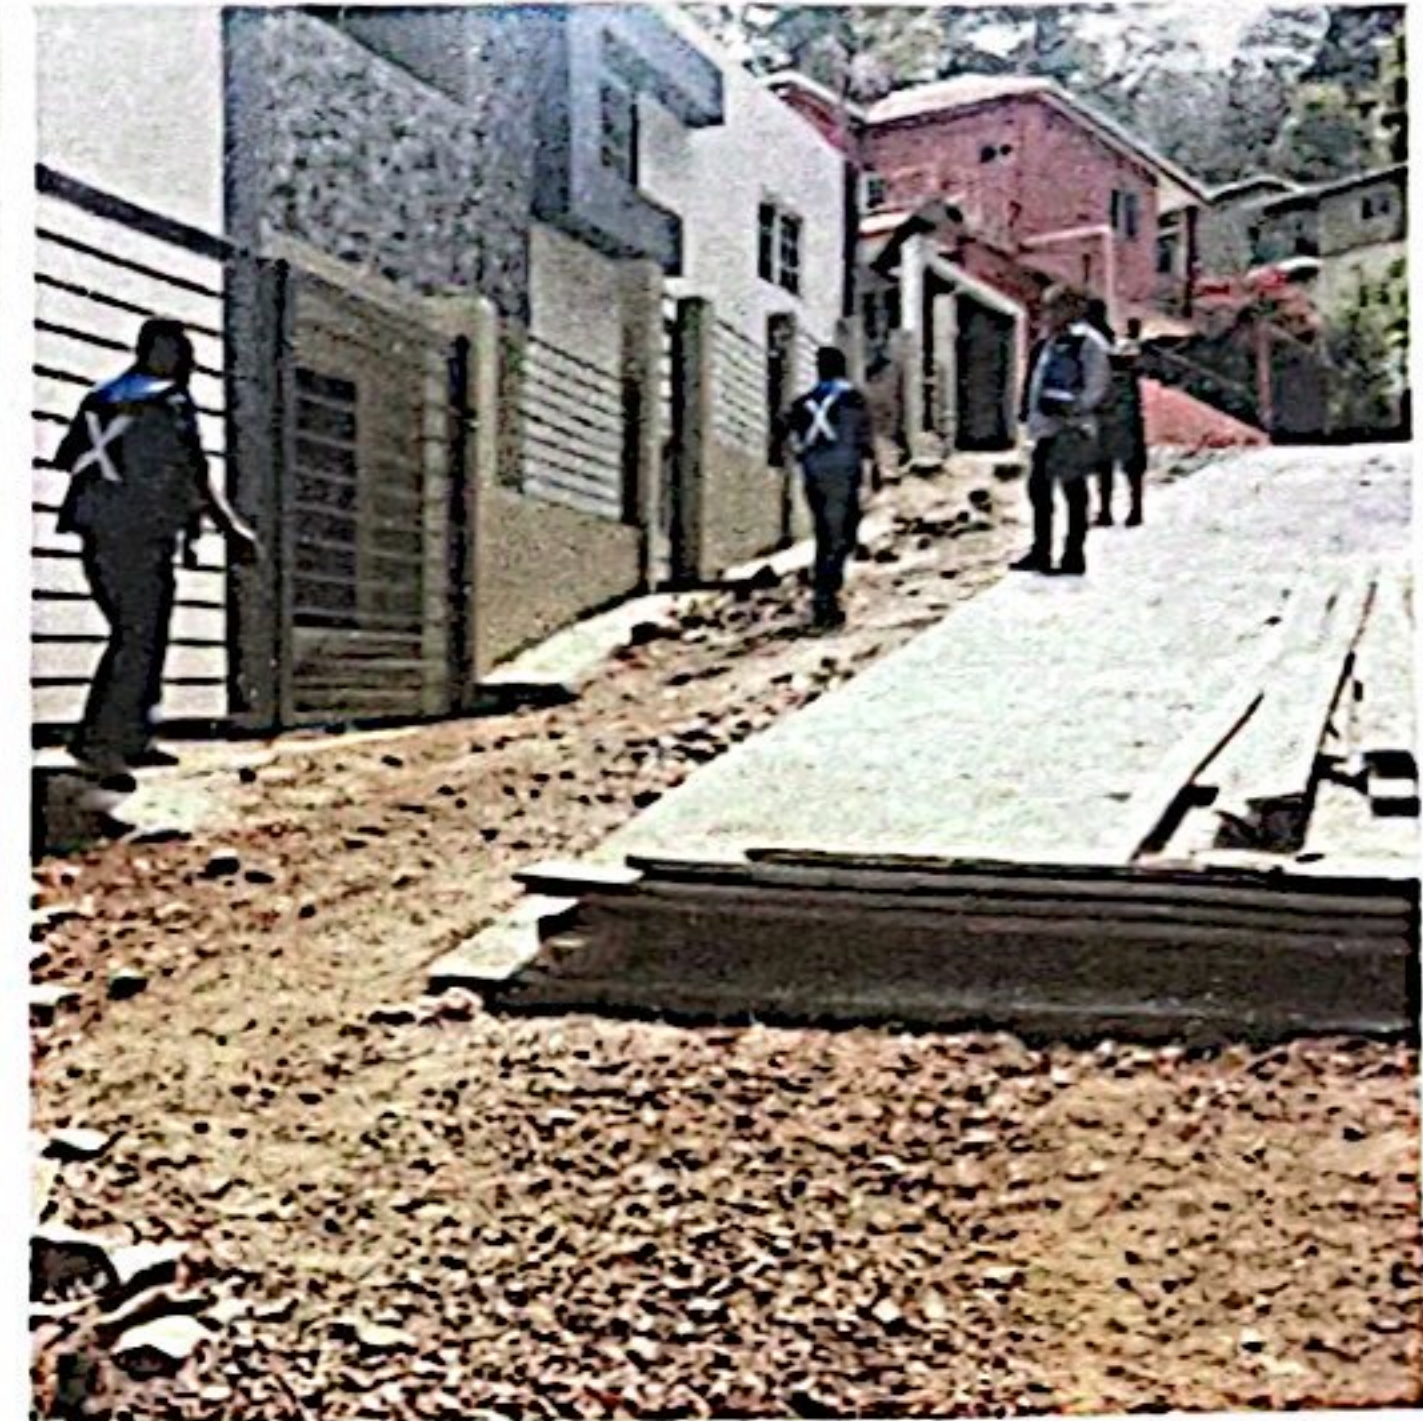

Supervisión y ejecución de proyectos





Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

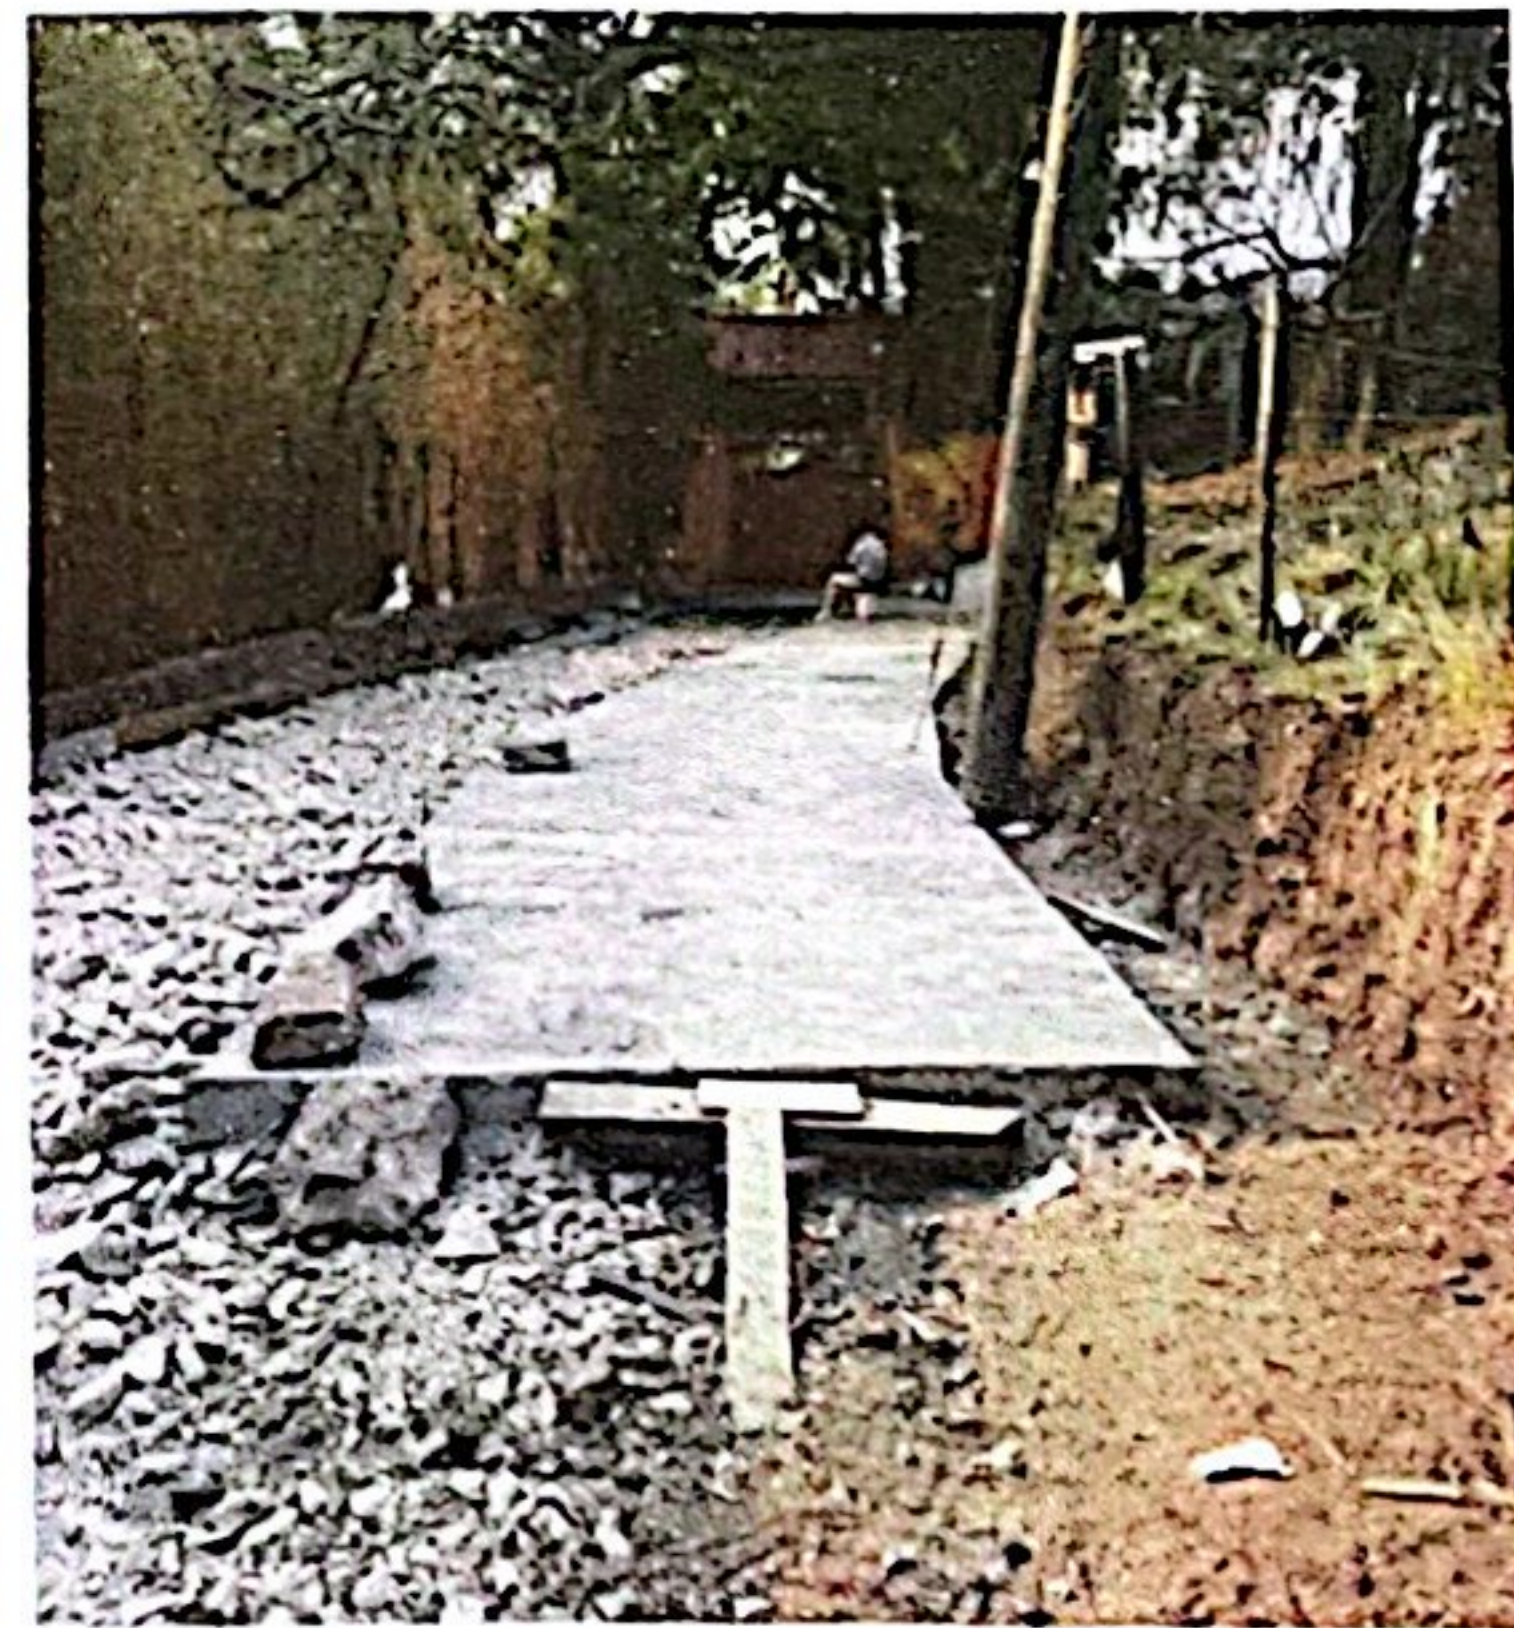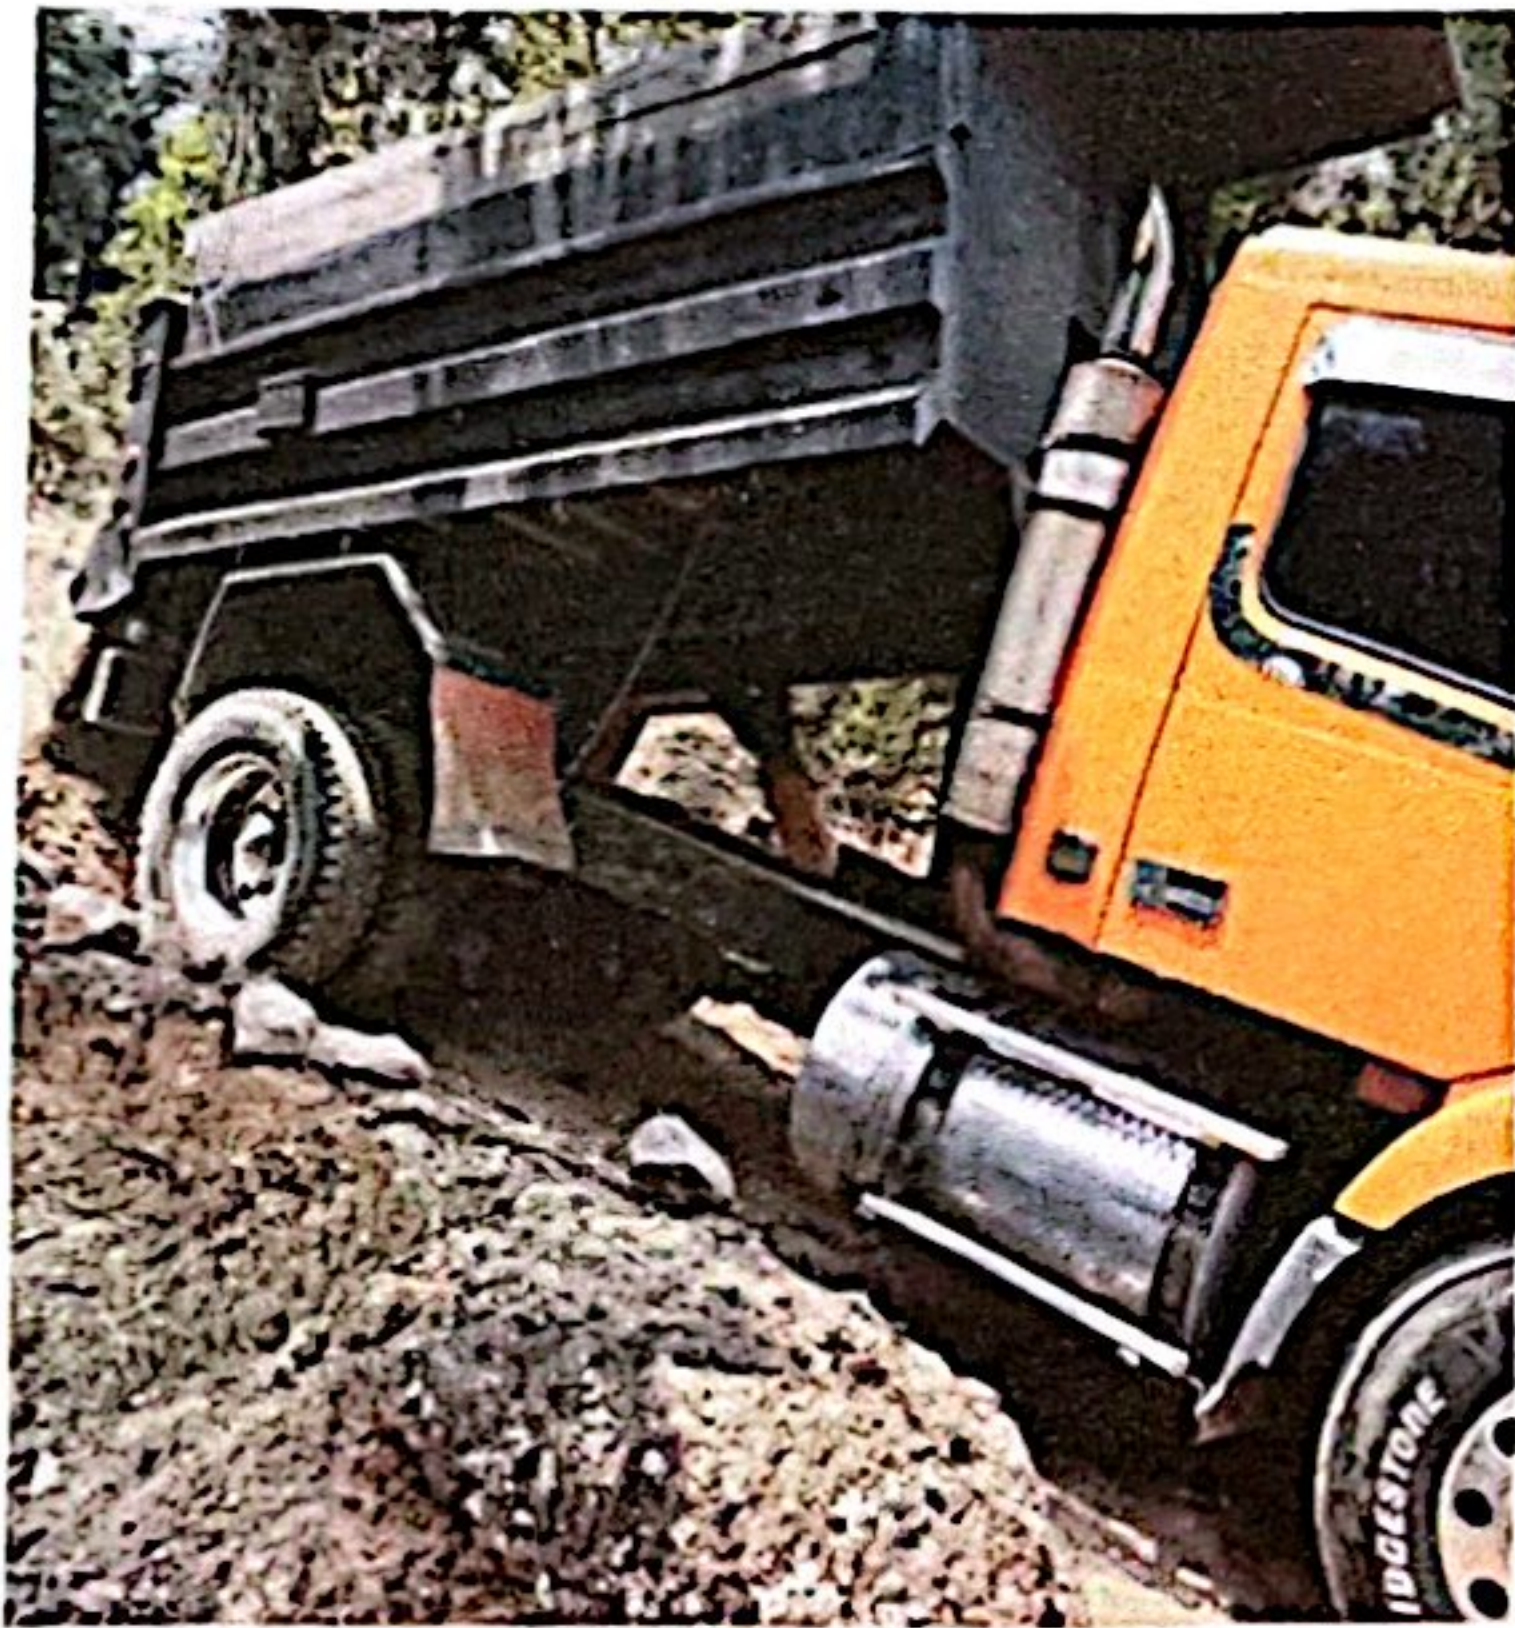



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 011

- 1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: Ing. Víctor Exequiel Saucedá García
- 2) Sector y Sub Sector: : Unidad Técnica Municipal (UTM)
- 3) Nombre del Proyecto: Mejoramiento del campo de Fútbol Aldea El Chimbo.
- 4) Ubicación del Proyecto: Aldea El Chimbo.
- 5) Descripción de gastos de Proyecto: Pago del personal para el mantenimiento y compra de combustible para bomba de riego.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

- 6) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento del Campo de Fútbol aldea El Chimbo.
- 7) Impacto en el Terreno y Asentamientos:
Edificios Municipales Públicos, por lo tanto, no hay Perjuicios ni daños a particulares.
- 8) Detalles del Encargado del Proyecto.
Ing. Víctor Exequiel Saucedá García
DNI: 0823-1987-00118
- 9) Fuente de Financiamiento: Fondos de Transferencia.
- 10) Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:
La Corporación Municipal Aprobó la Cantidad de Lps 10,800.00 para ejecutar el proyecto de Mejoramiento del campo de futbol aldea El Chimbo durante el mes de abril del 2024
- 11) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:
21 de diciembre de año 2023

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

12) Fecha de Finalización del Proyecto:

31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para el mantenimiento de obras urbanísticas en todo el municipio

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

13) Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de mejoramiento de campo

14) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto:

Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a la transferencia que realiza la secretaria de finanzas a la municipalidad.

Ing. Victor Exequiel Saucedo
Coordinador UTM
Alcaldia municipal de Santa Lucia





Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mantenimiento del campo de futbol aldea El Chimbo

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 012

- 1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: Ing. Víctor Exequiel Saucedá García
- 2) Sector y Sub Sector: Unidad Técnica Municipal (UTM)
- 3) Nombre del Proyecto: Mantenimiento De Campo De Futbol Estrella
- 4) Ubicación del Proyecto: Barrio La Emisora, Casco urbano Santa Lucia.
- 5) Propósito: Pagos por mantenimiento y vigilancia del campo.
- 6) Descripción del Proyecto: Pagos por compras vigilancia y mantenimiento del predio deportivo.
- 7) **ELABORACIÓN DEL PROYECTO**
- 8) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mantenimiento De Campo De Futbol Estrella
- 9) Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales Públicos, por lo tanto, no hay Perjuicios a particulares.
- 10) Detalles del Encargado del Proyecto.
Ing. Víctor Exequiel Saucedá García
DNI: 0823-1987-00118
- 11) Fuente de Financiamiento: Fondos de Transferencia.
- 12) Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:
La Corporación Municipal Aprobó la Cantidad de Lps. 9,800.00 para la ejecución del proyecto Mantenimiento De Campo De Futbol Estrella. Durante el mes de abril del año 2024.
- 13) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023
- 14) Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para el proyecto de Construcción, Sistema de Agua Potable Montanita El Edén.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029


EJECUCIÓN DEL PROYECTO

15) Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto Mantenimiento De Campo De Futbol Estrella.

16) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto:

Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la transferencia que realiza la secretaria de finanzas a la municipalidad.


Ing. Víctor Exequiel Saucedo
Coordinador UTM
Alcaldía municipal de Santa Lucia



Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mantenimiento y vigilancia de previo deportivo.



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 015

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
2. Sector y Sub Sector: Unidad Técnica Municipal (UTM)
3. Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras del Sistema de Alumbrado Público.
4. Ubicación del Proyecto: Varias Zonas del Municipio
5. Propósito: Instalación de lámparas en la calle principal y en aldeas del municipio esto para proporcionar seguridad, para peatones y vehículos que circulación por las diferentes zona de Santa Lucía.
6. Descripción del Proyecto: Pagos realizados por instalacion y reparación de lamparas para alumbrado públicos.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

7. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción, Adiciones y mejoras de Sistema de alumbrado público.
8. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales Públicos, por lo tanto, no hay Perjuicios a particulares.
9. Detalles del Encargado del Proyecto.
Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
DNI: 0823-1987-00118
10. Fuente de Financiamiento: Fondos de transferencia.
11. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

La Corporación Municipal Aprobó la Cantidad de Lps **64,485.00** para la ejecución del proyecto de Construcciones, adiciones y mejoras del sistema de alumbrado público en todo el municipio, durante el mes de abril del año 2024.

12. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023

13. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para el proyecto de construcción, adiciones y mejoras del sistema de alumbrado público en todo el Municipio.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de reparación y mantenimiento del alumbrado público.

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

Ing. Víctor Exequiel Saucedo
Coordinador UTM
Alcaldía municipal de Santa Lucía

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalacion de Lamparas Para alumbrado publico

Santa Lucía, vale la pena llevar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 026

- 1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: José Benito Medina Tobías
- 2) Sector y Sub Sector: Unidad Municipal Ambiental
- 3) Nombre del Proyecto: Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de Recreo.
- 4) Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio
- 5) Propósito: Mantener un ambiente limpio en las calles y vías de acceso en todo el municipio
- 6) Descripción del Proyecto: Los trabajos de limpieza se realizaron en diferentes zonas del municipio entre ellas: Zonas, Sitio Arriba, Aldea el Chimbo, Santa Elena, Desvió, Casco Urbano y diferentes barrios y caseríos del municipio de Santa Lucia.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

- 7) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mantener limpias las vías de acceso, calles, caminos, lugares de recreación, así mismo mejorar la imagen y presentación para los habitantes y visitantes del Municipio.
- 8) Impacto en el Terreno y Asentamientos: Las limpiezas se realizan en vías públicas por lo tanto no hay perjuicios a terceros.
- 9) Detalles del Encargado del Proyecto.
José Benito Medina Tobías, Coordinador de (UMA)
DNI. 0826- 1982- 00071
- 10) Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

11) Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:

La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. **89,774.49** Para ejecución en el mes de abril, del proyecto, Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de recreo, en todo el municipio.

12) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023

13) Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para el Mantenimiento, Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de recreo.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

14) Variación en el Costo Total del Proyecto:

Si existen Variaciones en el monto de Mantenimiento y Reparación y Limpieza de Calles, Caminos y Lugares de Recreo.

15) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo disponibilidad financiera de la Municipalidad.



José Benito Medina Tobías
Coordinador Municipal de Medio Ambiente, UMA.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de desechos sólidos en el municipio

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 027

- 1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
- 2) Sector y Sub Sector: Unidad Técnica Municipal. (UTM)
- 3) Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras y mantenimiento de Carreteras y puentes.
- 4) Ubicación del Proyecto: En diferentes aldeas y caseríos del municipio.
- 5) Propósito: Mejorar las condiciones de calles, y accesos peatonales y vehiculares.
- 6) Descripción del Proyectos: pago por suministro de materiales, para proyectos de pavimentaciones en aldeas y caseríos de nuestro municipio.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

- 7) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción, Adiciones y mejoras de carreteras y puentes en todo el municipio.
- 8) Impacto en el Terreno y Asentamientos: Calles y predios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
- 9) Detalles del Encargado del Proyecto
Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
DNI: 0823-1987-00118
- 10) Fuente de Financiamiento: Fondos de transferencia.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

11) Presupuesto Técnico - Proyectado del Proyecto:

La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. **510,197.00** a ejecutar en la Construcción de pagos por, suministro de materiales, en la pavimentación y ampliaciones de calles en diferentes aldeas y caseríos del municipio. En el mes de abril de 2024.

12) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023

13) Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

14) Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcción, Adiciones y Mejoras de carreteras y puentes en todo el Municipio.

15) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a la transferencia que hace la secretaria de finanzas a la Municipalidad.

Ing. Victor Exequiel Saucedo
Coordinador UTM
Alcaldia municipal de Santa Lucia





Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO

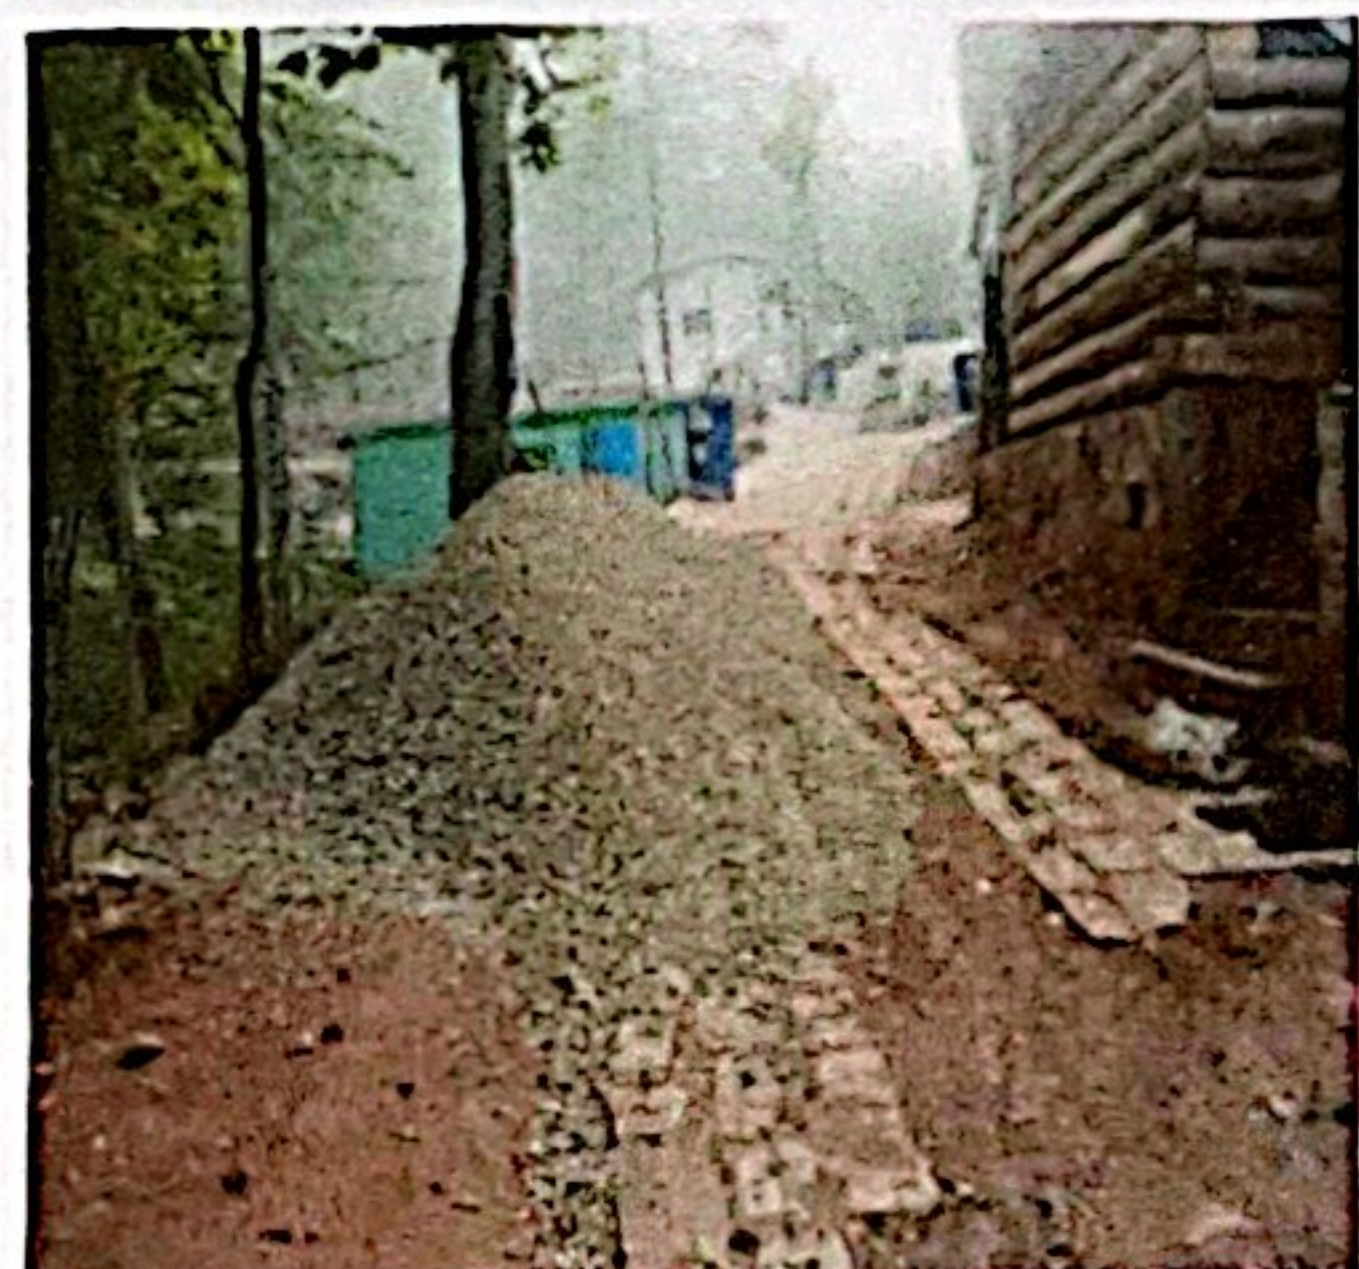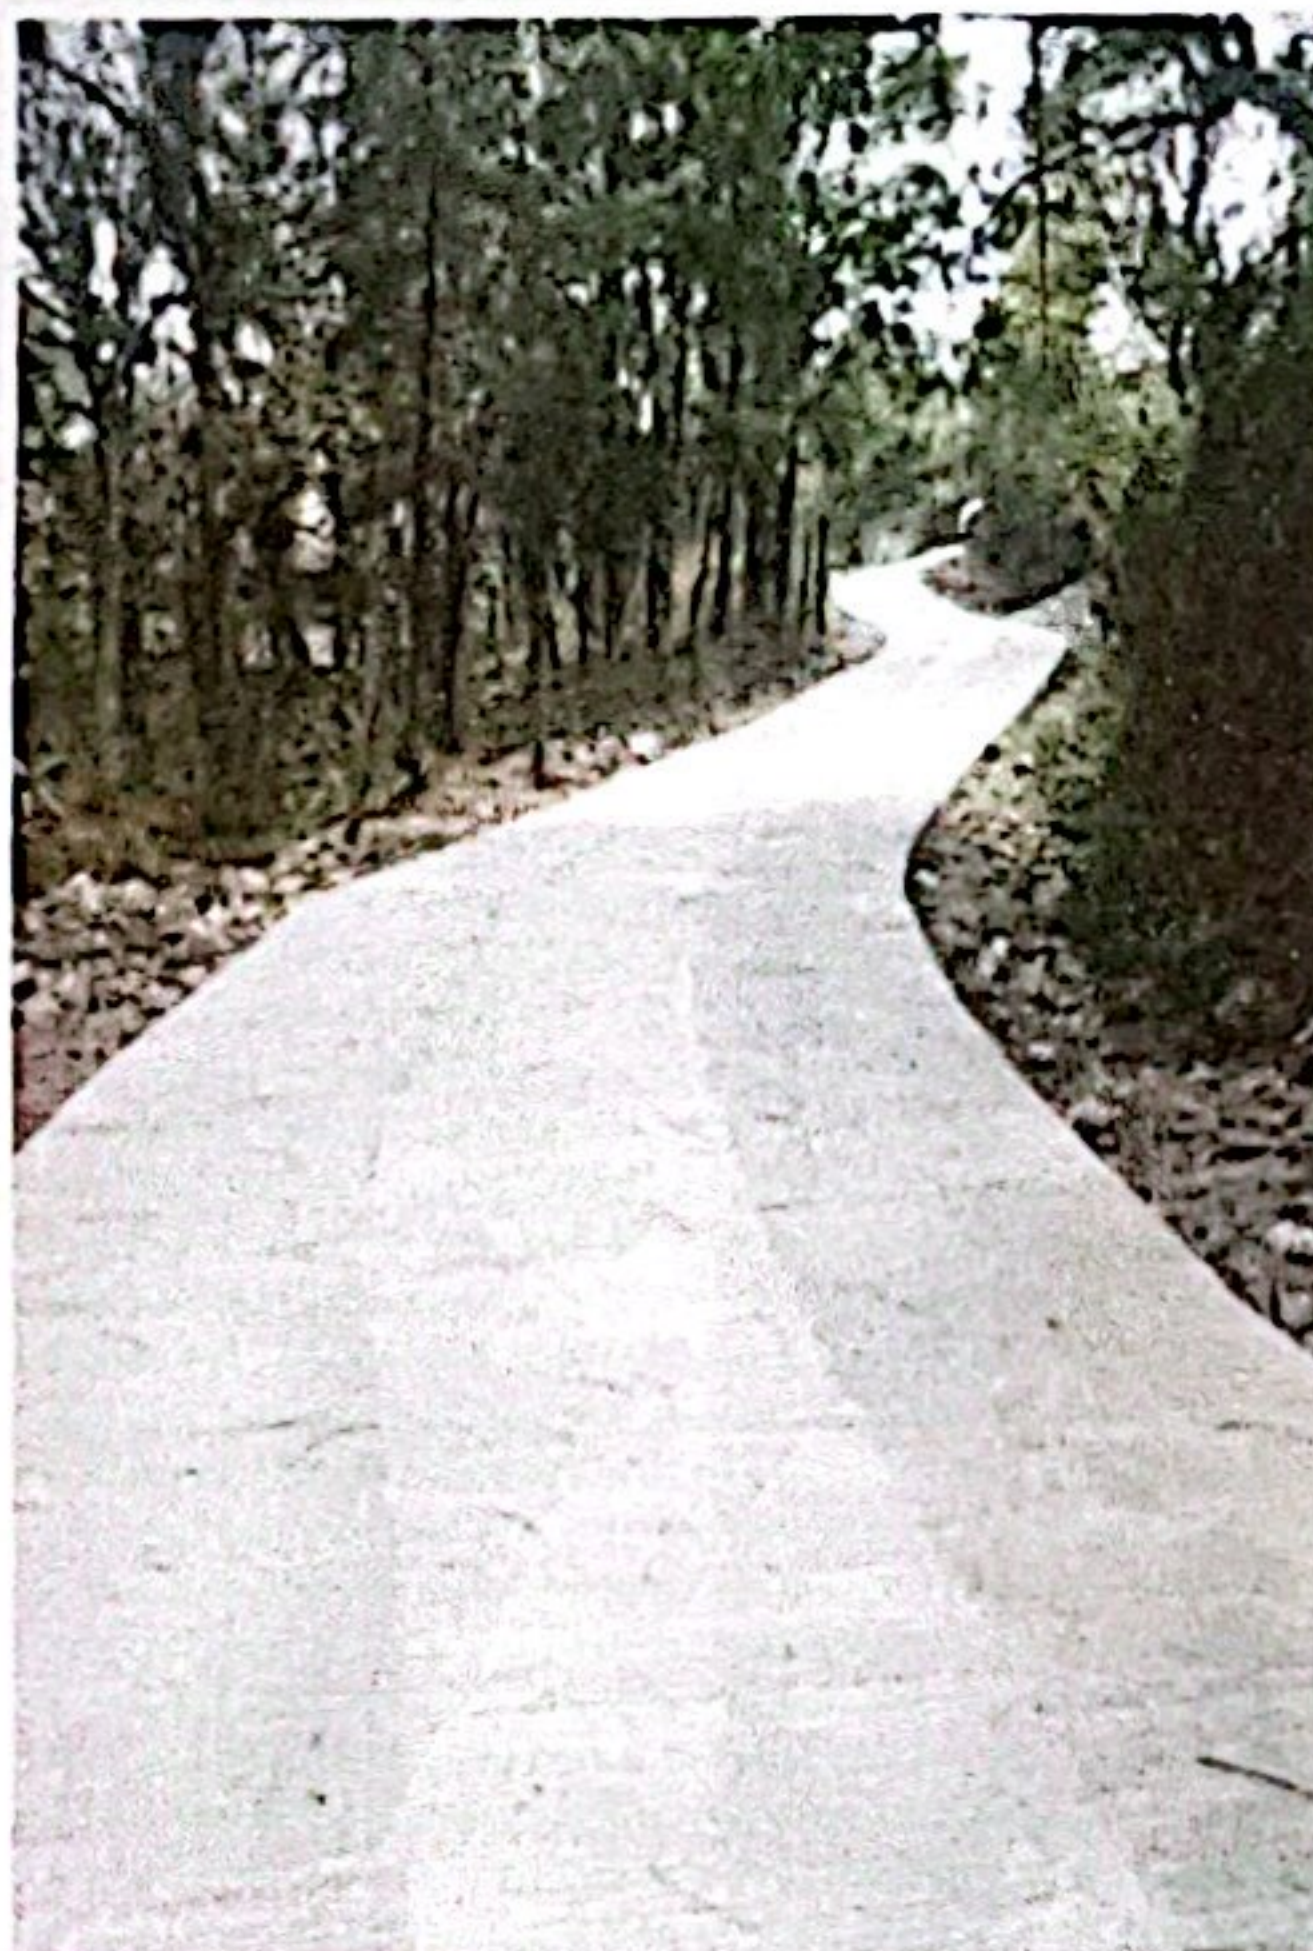

Construcción de calle, concreto ciclópeo

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!





Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

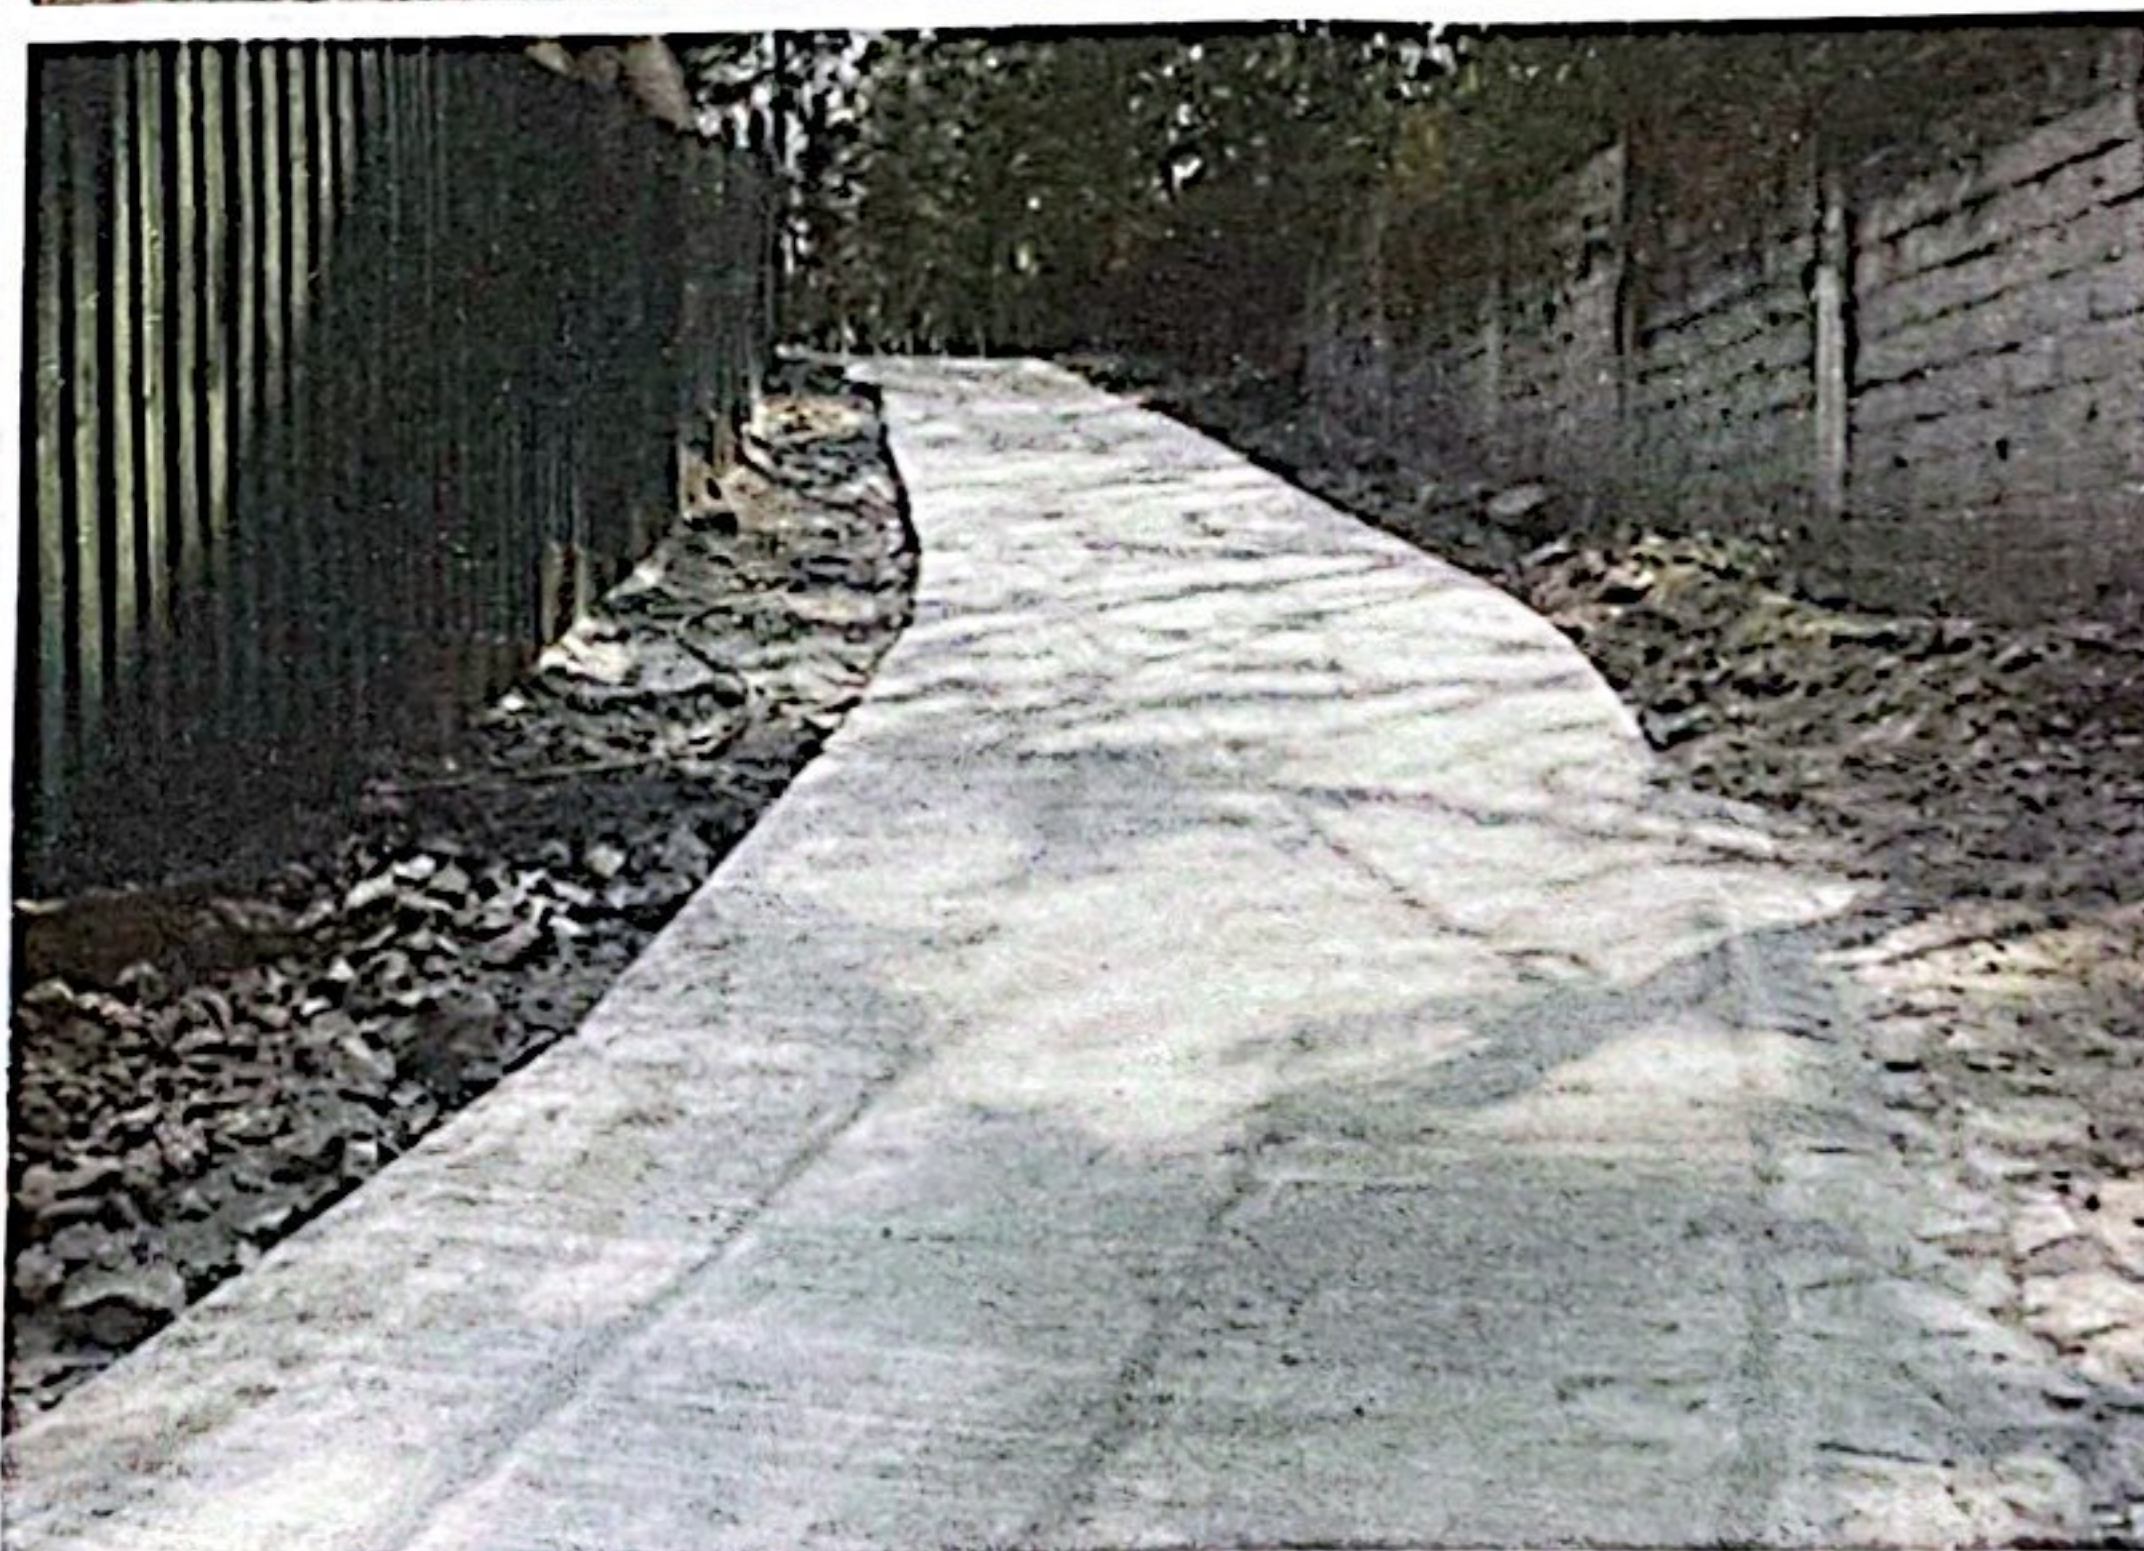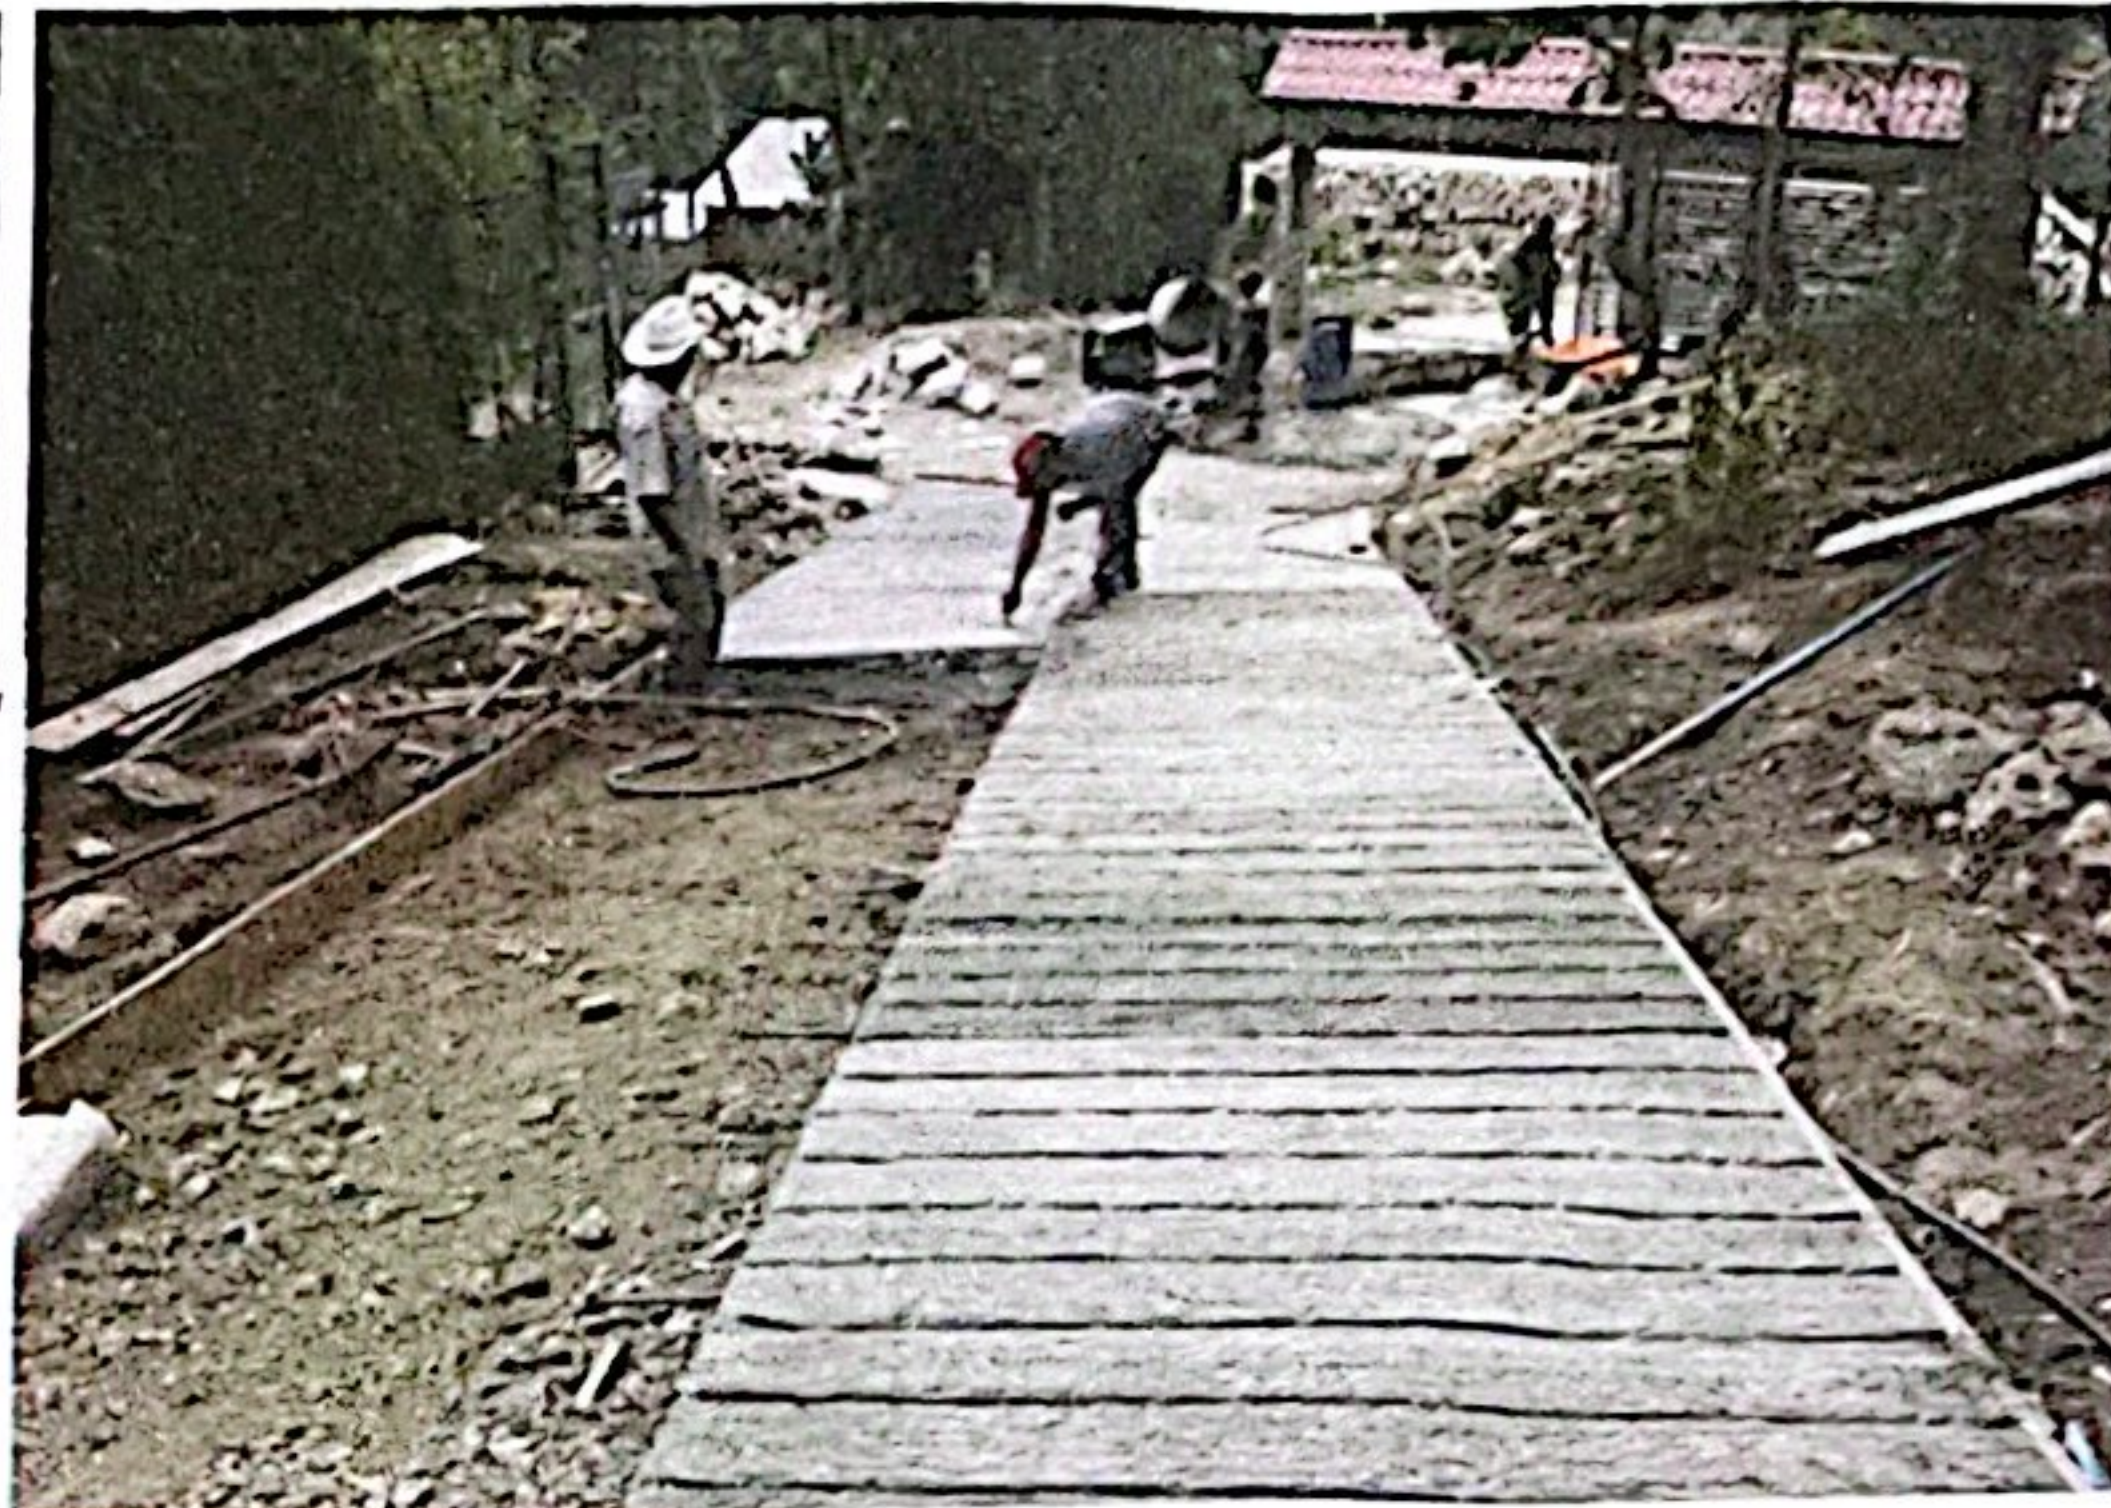

Mejoras en carreteras

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 047

- 1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
- 2) Sector y Sub Sector: Unidad Técnica Municipal (UTM)
- 3) Nombre del Proyecto: Pavimentación De Calles y Caminos en todo el Municipio.
- 4) Ubicación del Proyecto: Diferentes lugares del Municipio
- 5) Propósito: Mejorar las condiciones accesos personales y vehiculares.
- 6) Descripción del Proyecto: Pago por suministro de materiales Cemento, arena, grava y otros materiales importantes para los proyectos como ser madera, clavos, alambre de amarre, acelerante de concreto, estos Materiales para la ejecución de ampliación de calles en el municipio.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

- 7) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Pavimentación De Calles y Caminos en todo El Municipio
- 8) Impacto en el Terreno y Asentamientos: Calles y predios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
- 9) Detalles del Encargado del Proyecto
Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
DNI: 0823-1987-00118
- 10) Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales.
- 11) Presupuesto Técnico - Proyectado del Proyecto:
La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de **Lps. 840,515.63** Para la ejecución de proyectos de Construcciones de Pavimentación De Calles y Caminos en todo el Municipio. Durante el mes abril del 2024.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

12) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023

13) Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para Pavimentación De Calles y Caminos en todo el Municipio.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

14) Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Pavimentación De Calles y Caminos en todo el Municipio

15) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera municipal.

Ing. Víctor Exequiel Saucedo
Coordinador UTM
Alcaldía municipal de Santa Lucia



Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!








Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO

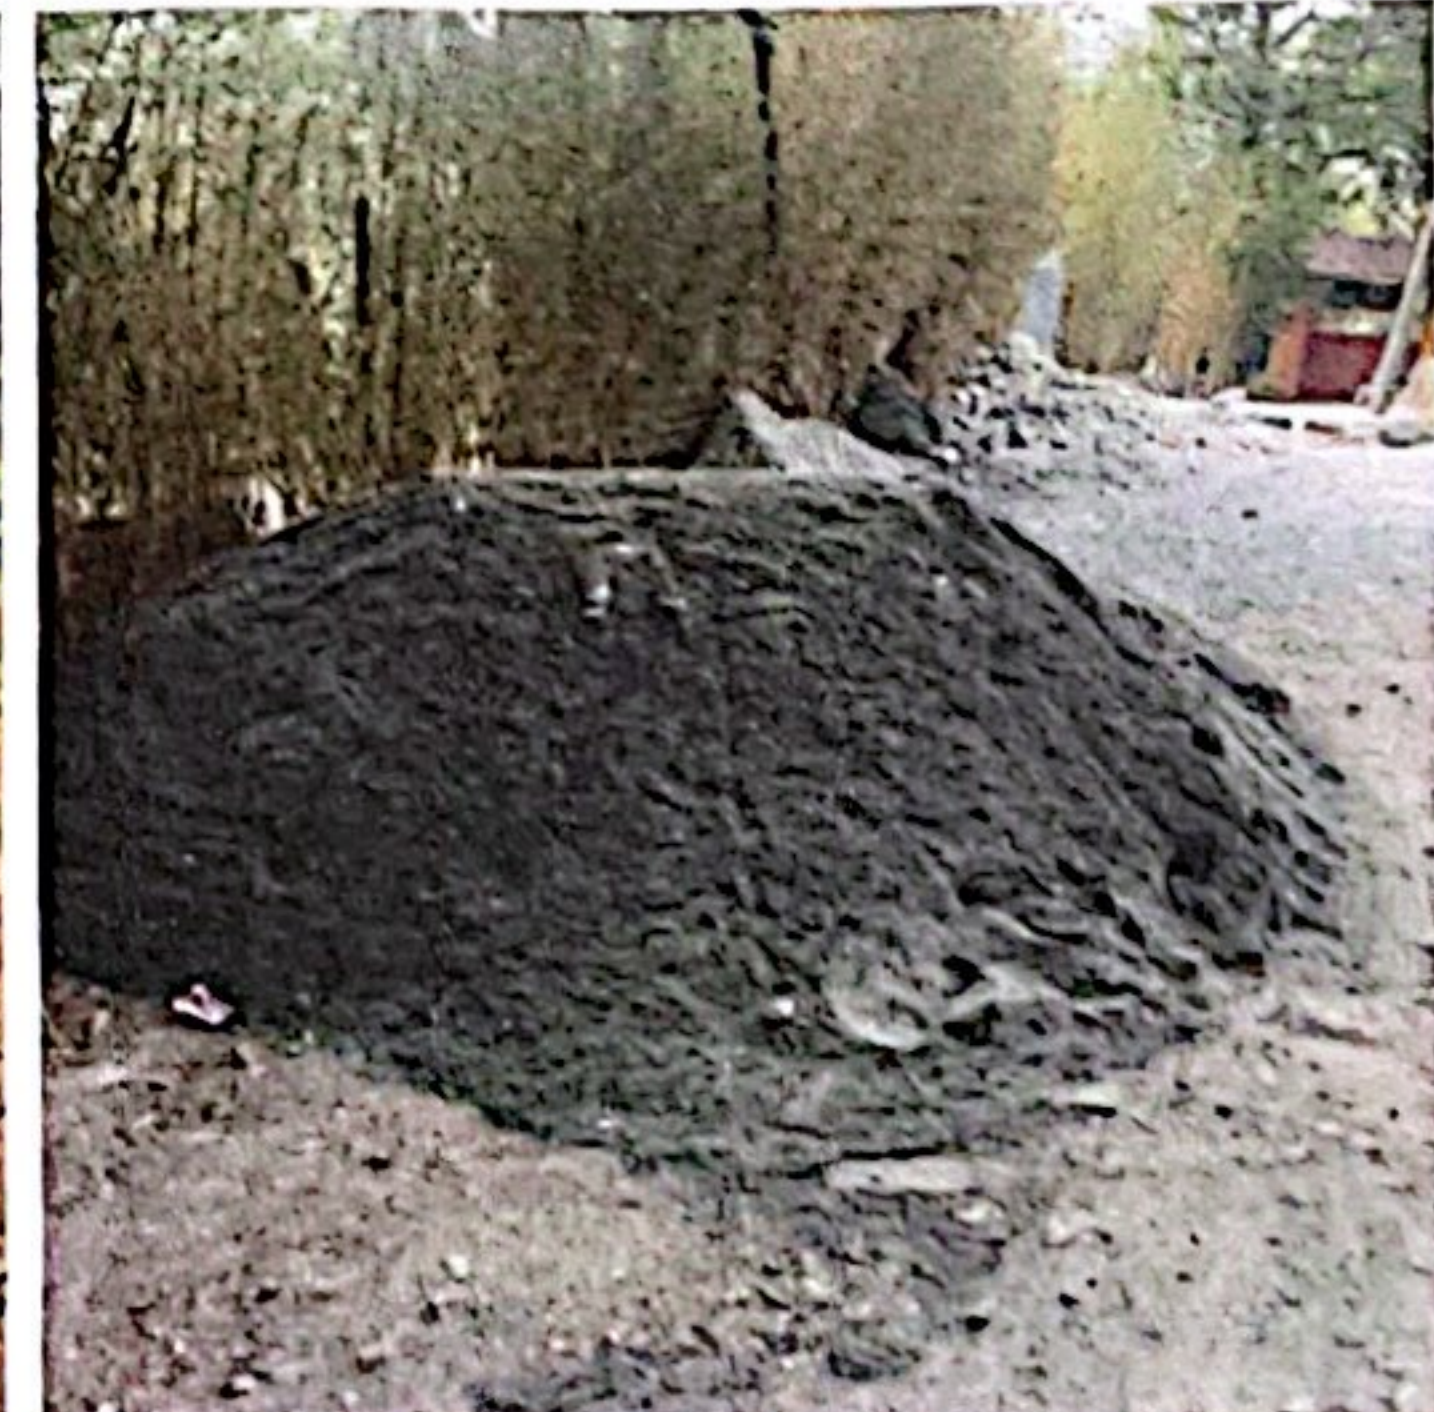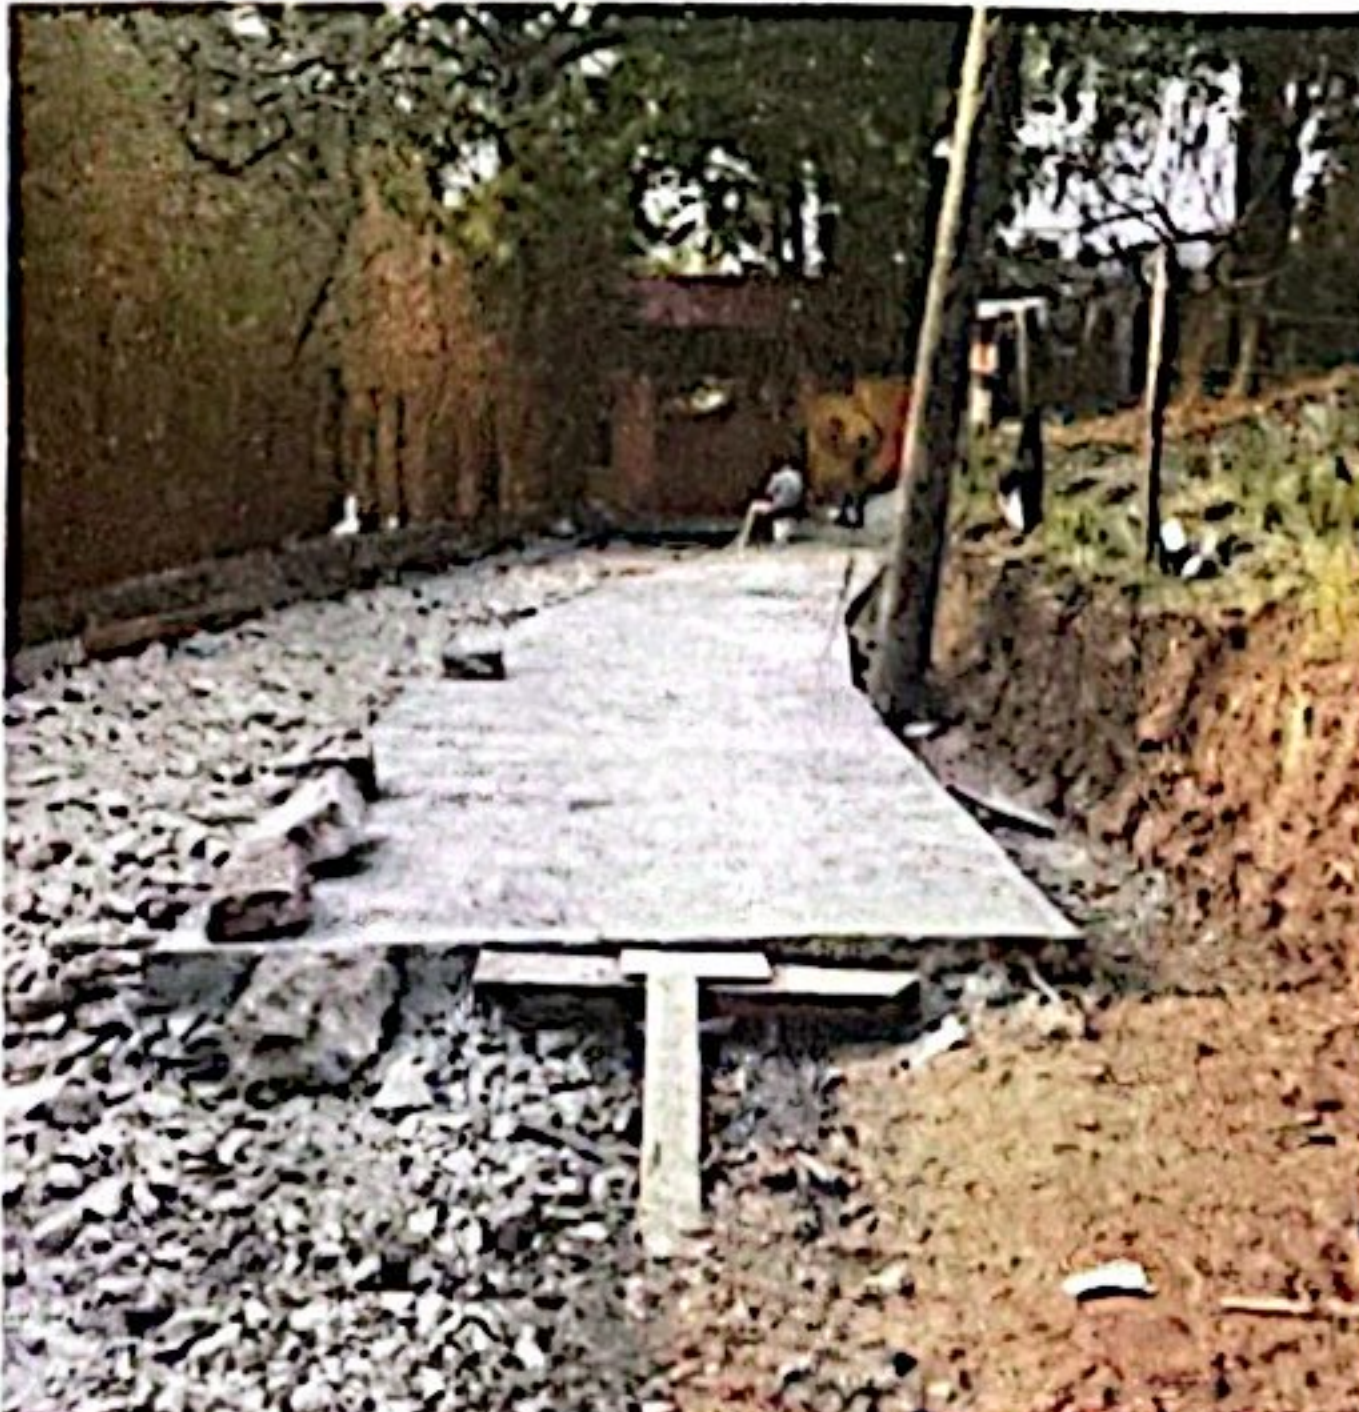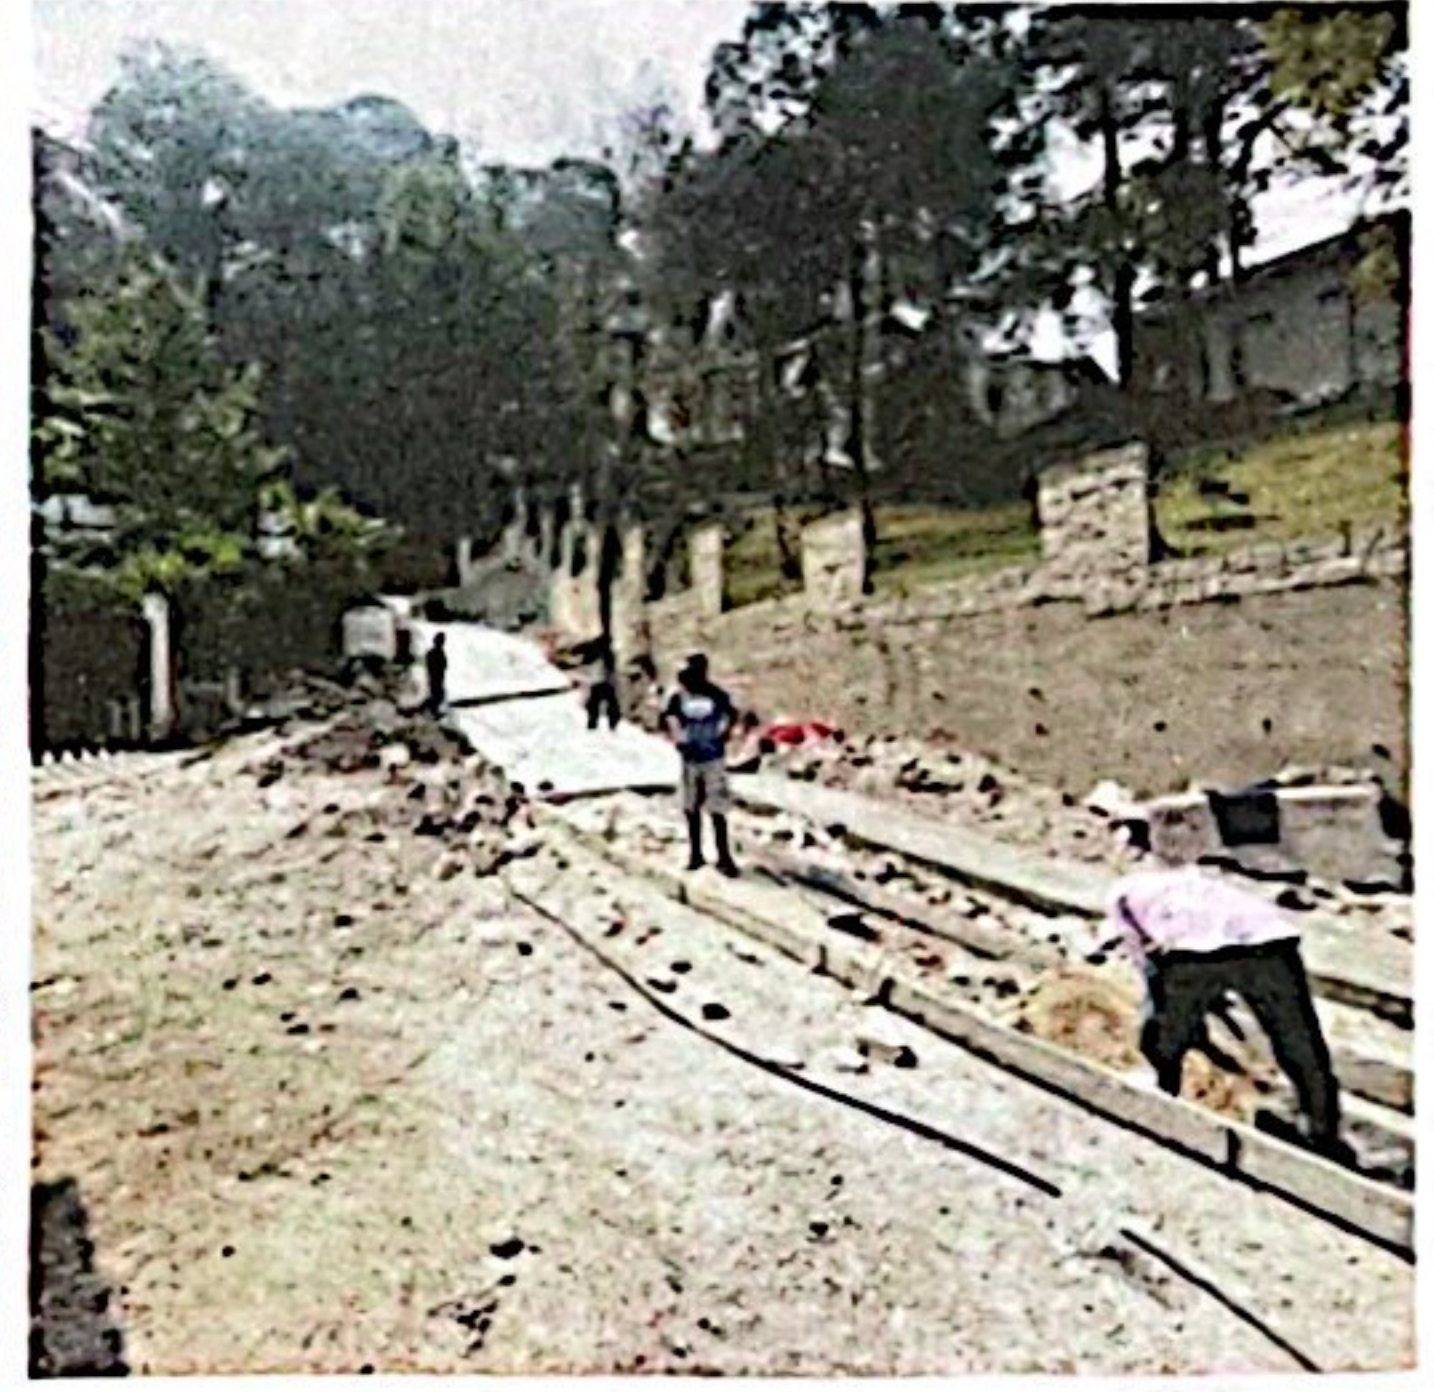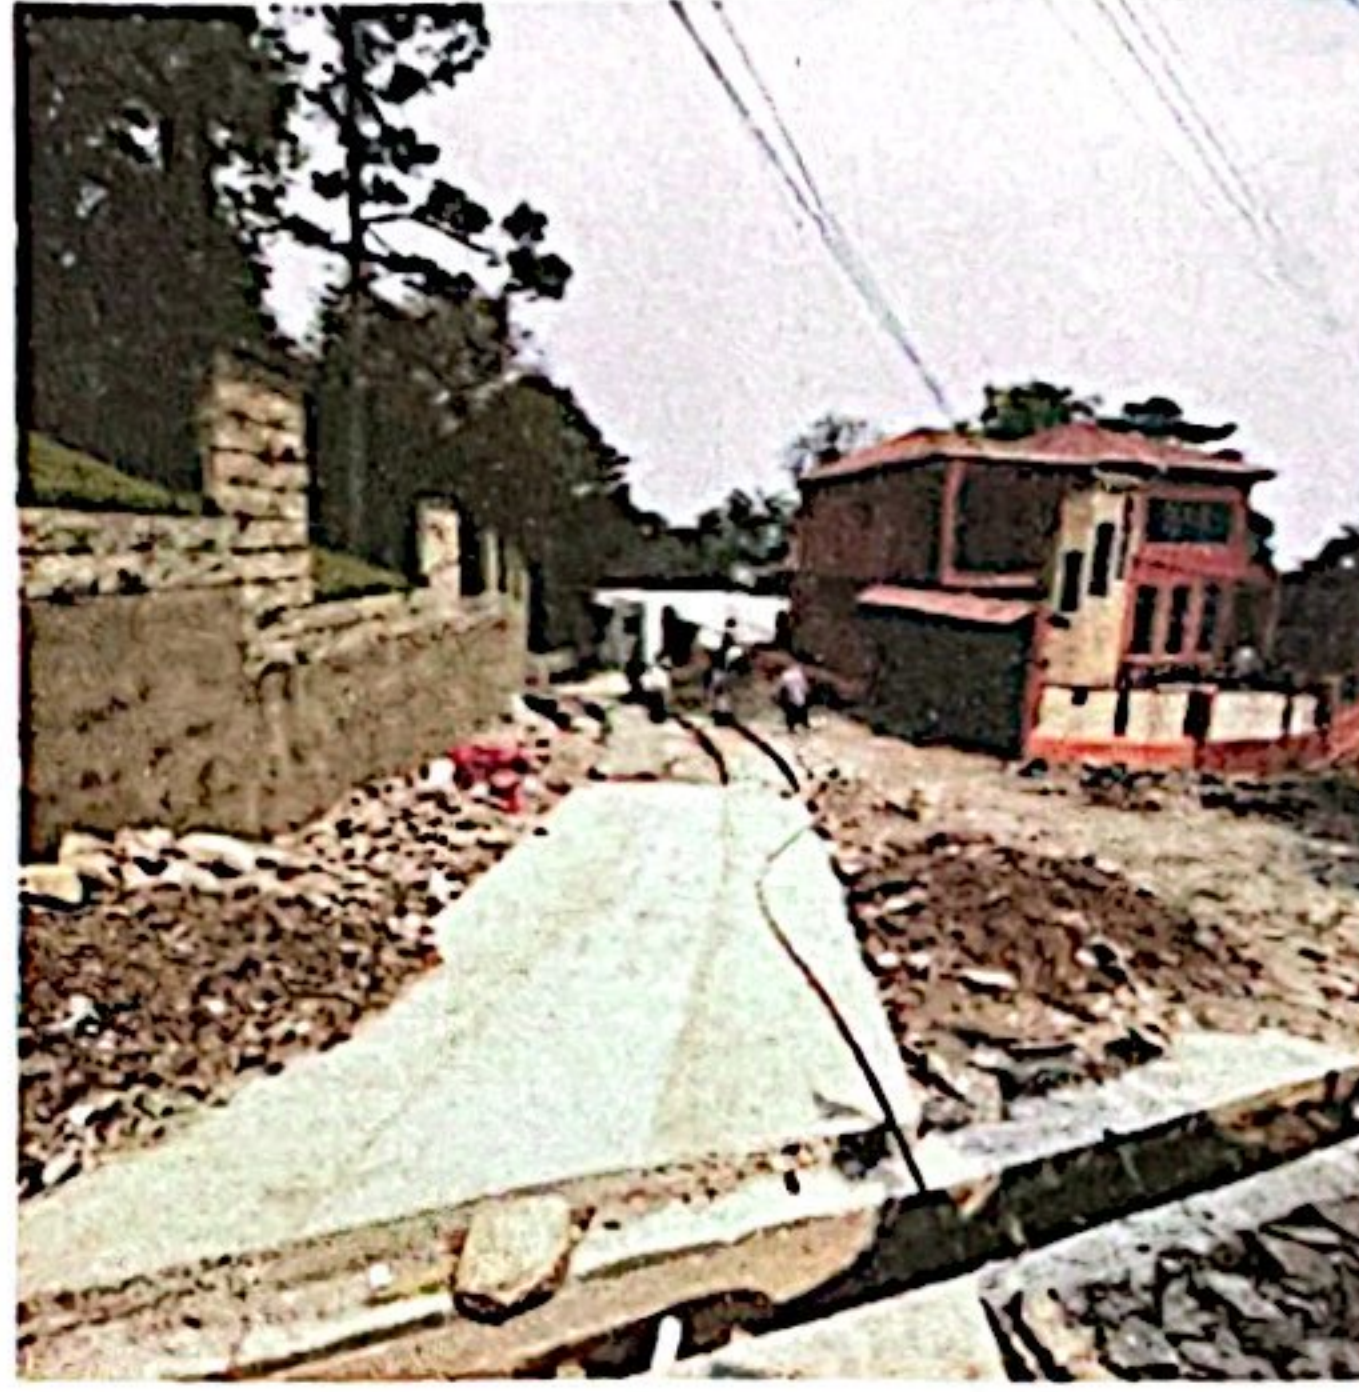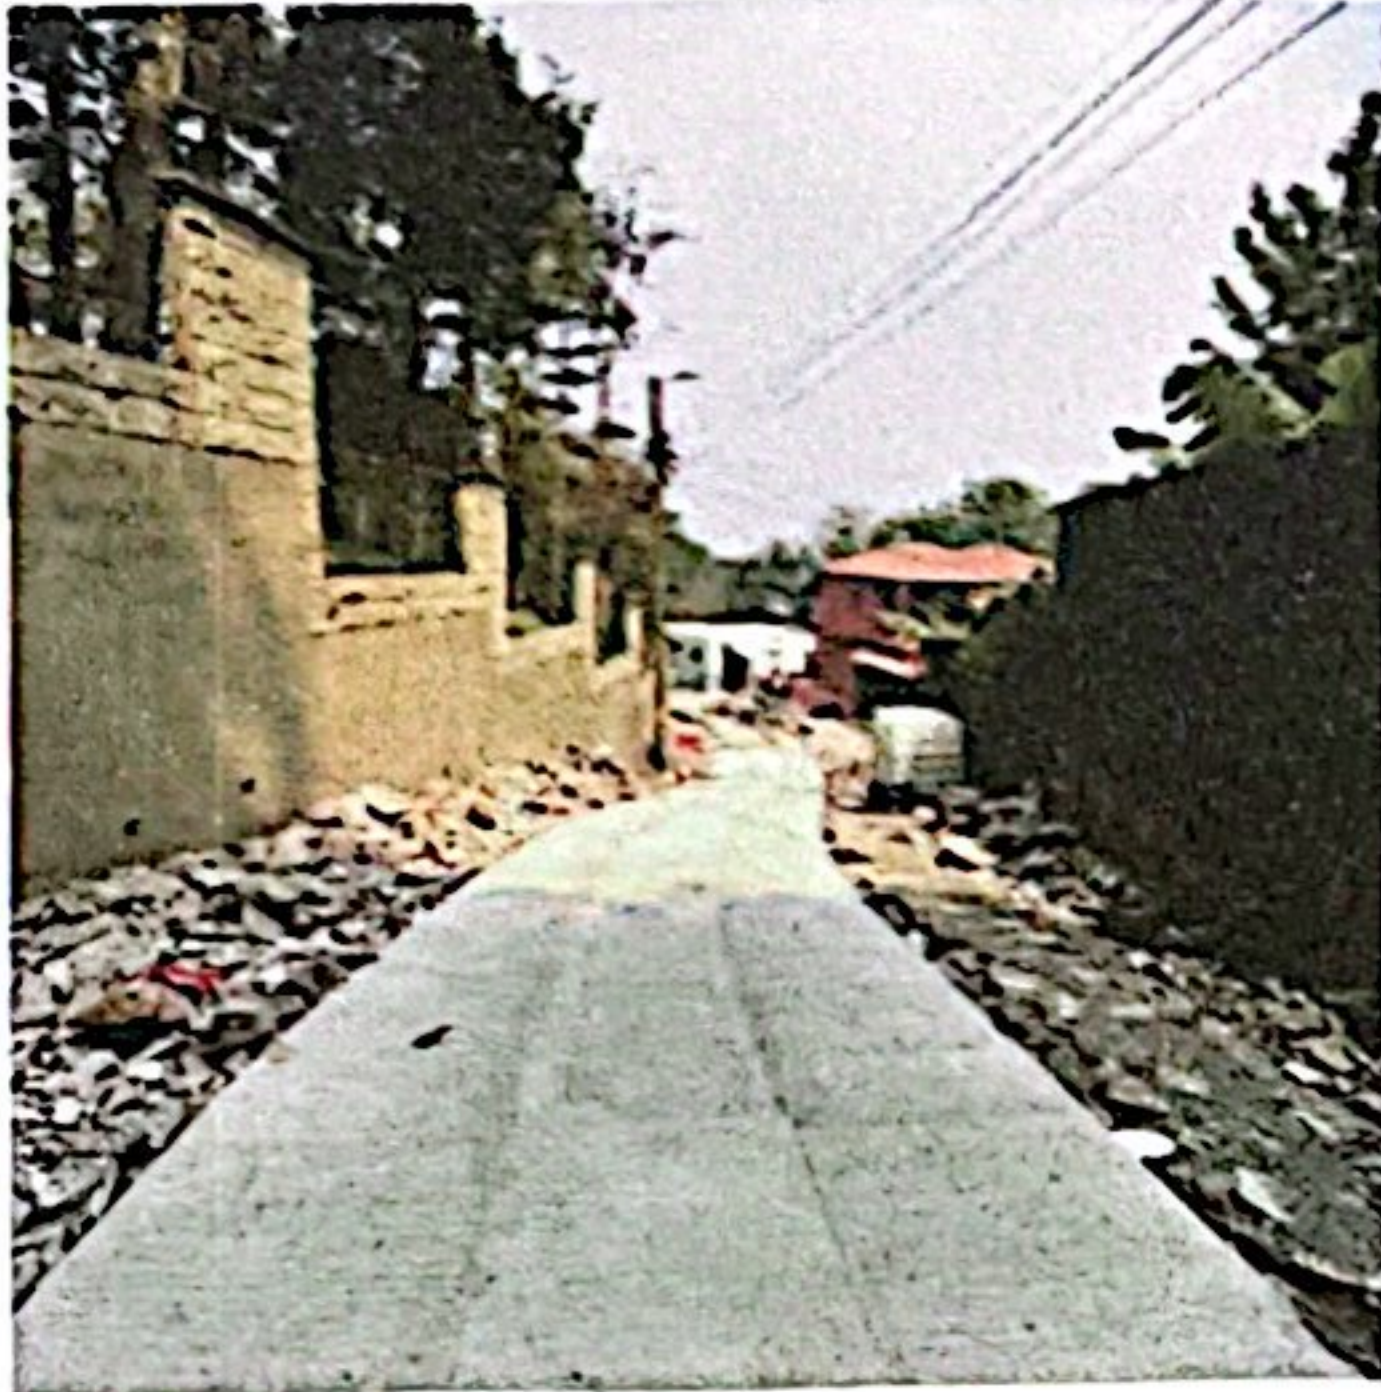

Mantenimiento de calles y caminos

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 055

- 1) Encargado de la Supervisión de Proyecto: Ing. Víctor Exequiel Saucedá García
1. Sector y Sub Sector: Unidad Técnica Municipal (UTM)
2. Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras de viviendas en todo el Municipio
3. Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio
4. Propósito: Mejorar las condiciones en las cuales viven algunos habitantes de nuestro municipio
5. Descripción del Proyecto: Pago por materiales brindados a personas que solicitan ayudas para mejorar sus viviendas e Iglesias, también por la compra de canaletas y láminas para ayudas sociales.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

6. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción y mejoramiento de viviendas populares en el municipio.
7. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Las mejoras en las viviendas se hacen previamente por una solicitud emitida por el beneficiario, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
8. Detalles del Encargado del Proyecto
Ing. Víctor Exequiel Saucedá García
DNI: 0823-1987-00118
9. Fuente de Financiamiento: Fondos de transferencia
10. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

11. La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. **465,724.73** a ejecutar en el proyecto de Construcción, Adiciones y Mejoras de viviendas en todo el Municipio, durante el mes de abril del año 2024.
12. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023
13. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto social para la construcción de Obras sociales en Todo el Municipio.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:
No existen Variaciones en el monto de Construcción, adicione y mejoras de Viviendas populares
- 1) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.

Ing. Victor Exequiel Saucedo

Coordinador UTM

Alcaldia municipal de Santa Lucia



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Terminación de casa como ayuda social en las sabanetas

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029



Laminas que se compraron para ayuda social.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 063

- 1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
- 2) Sector y Sub Sector: Unidad Técnica Municipal (UTM)
- 3) Nombre del Proyecto: Construcción Centro Comunal Aldea Lama Alta Norte.
- 4) Ubicación del Proyecto: Lomas Alta Norte.
- 5) Propósito: Construcción muro de contención para proteger la construcción existente del centro comunal.
- 6) Descripción del Proyecto: Compra de materiales arena, grava, cemento, varillas, madera bloque para construcción de muro de contención en el centro comunal de Loma Alta Norte.
- 7) **ELABORACIÓN DEL PROYECTO**
- 8) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción Centro Comunal Aldea Lama Alta Norte.
- 9) Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales Públicos, por lo tanto, no hay Perjuicios a particulares.
- 10) Detalles del Encargado del Proyecto.
Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
DNI: 0823-1987-00118
- 11) Fuente de Financiamiento: Fondos de Municipales.
- 12) Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:
- 13) La Corporación Municipal Aprobó la Cantidad de Lps. **24,900.00** para la ejecución del proyecto de Construcción de muro de contención en el Centro Comunal Aldea Lama Alta Norte, Durante el mes de abril del año 2024.
- 14) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

- 15) Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para el proyecto de, Construcción Centro Comunal Aldea Lama Alta Norte

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 16) Variación en el Costo Total del Proyecto:

- 17) No existen Variaciones en el monto Construcción Centro Comunal Aldea Lama Alta Norte.

- 18) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto:

Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera Municipal.

Ing. Víctor Exequiel Saucedo
Coordinador UTM
Alcaldia municipal de Santa Lucia





Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOT OGRÁFICO



Construcción de muro de contención en centro comunal De Loma Alta Norte.

Santa Lucia vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 065

- 1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
- 2) Sector y Sub Sector: Unidad Técnica Municipal (UTM)
- 3) Nombre del Proyecto: Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas.
- 4) Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio
- 5) Propósito: Mejoras y reparaciones a la infraestructura de instalaciones municipales.
- 6) Descripción del Proyecto: Pagos por reparación y mantenimientos en instalaciones municipales.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

- 7) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Construcción, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas en todo el Municipio.
- 8) Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
- 9) Detalles del Encargado del Proyecto
Ing. Víctor Exequiel Saucedo García
DNI: 0823-1987-00118
- 10) Fuente de Financiamiento: Fondos de transferencia.
- 11) Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:
La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. **58,435.00** a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas. Durante el mes de abril del año 2024.
- 12) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucia F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

- 13) Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

- 14) Variación en el Costo Total del Proyecto:

Si existen Variaciones en el monto de construcción adiciones mejoras de obras Urbanística en todo el Municipio.

- 15) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas que realiza a la Municipalidad.

Ing. Victor Exequiel Sauced
Coordinador UTM
Alcaldia municipal de Santa Lucia






Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO

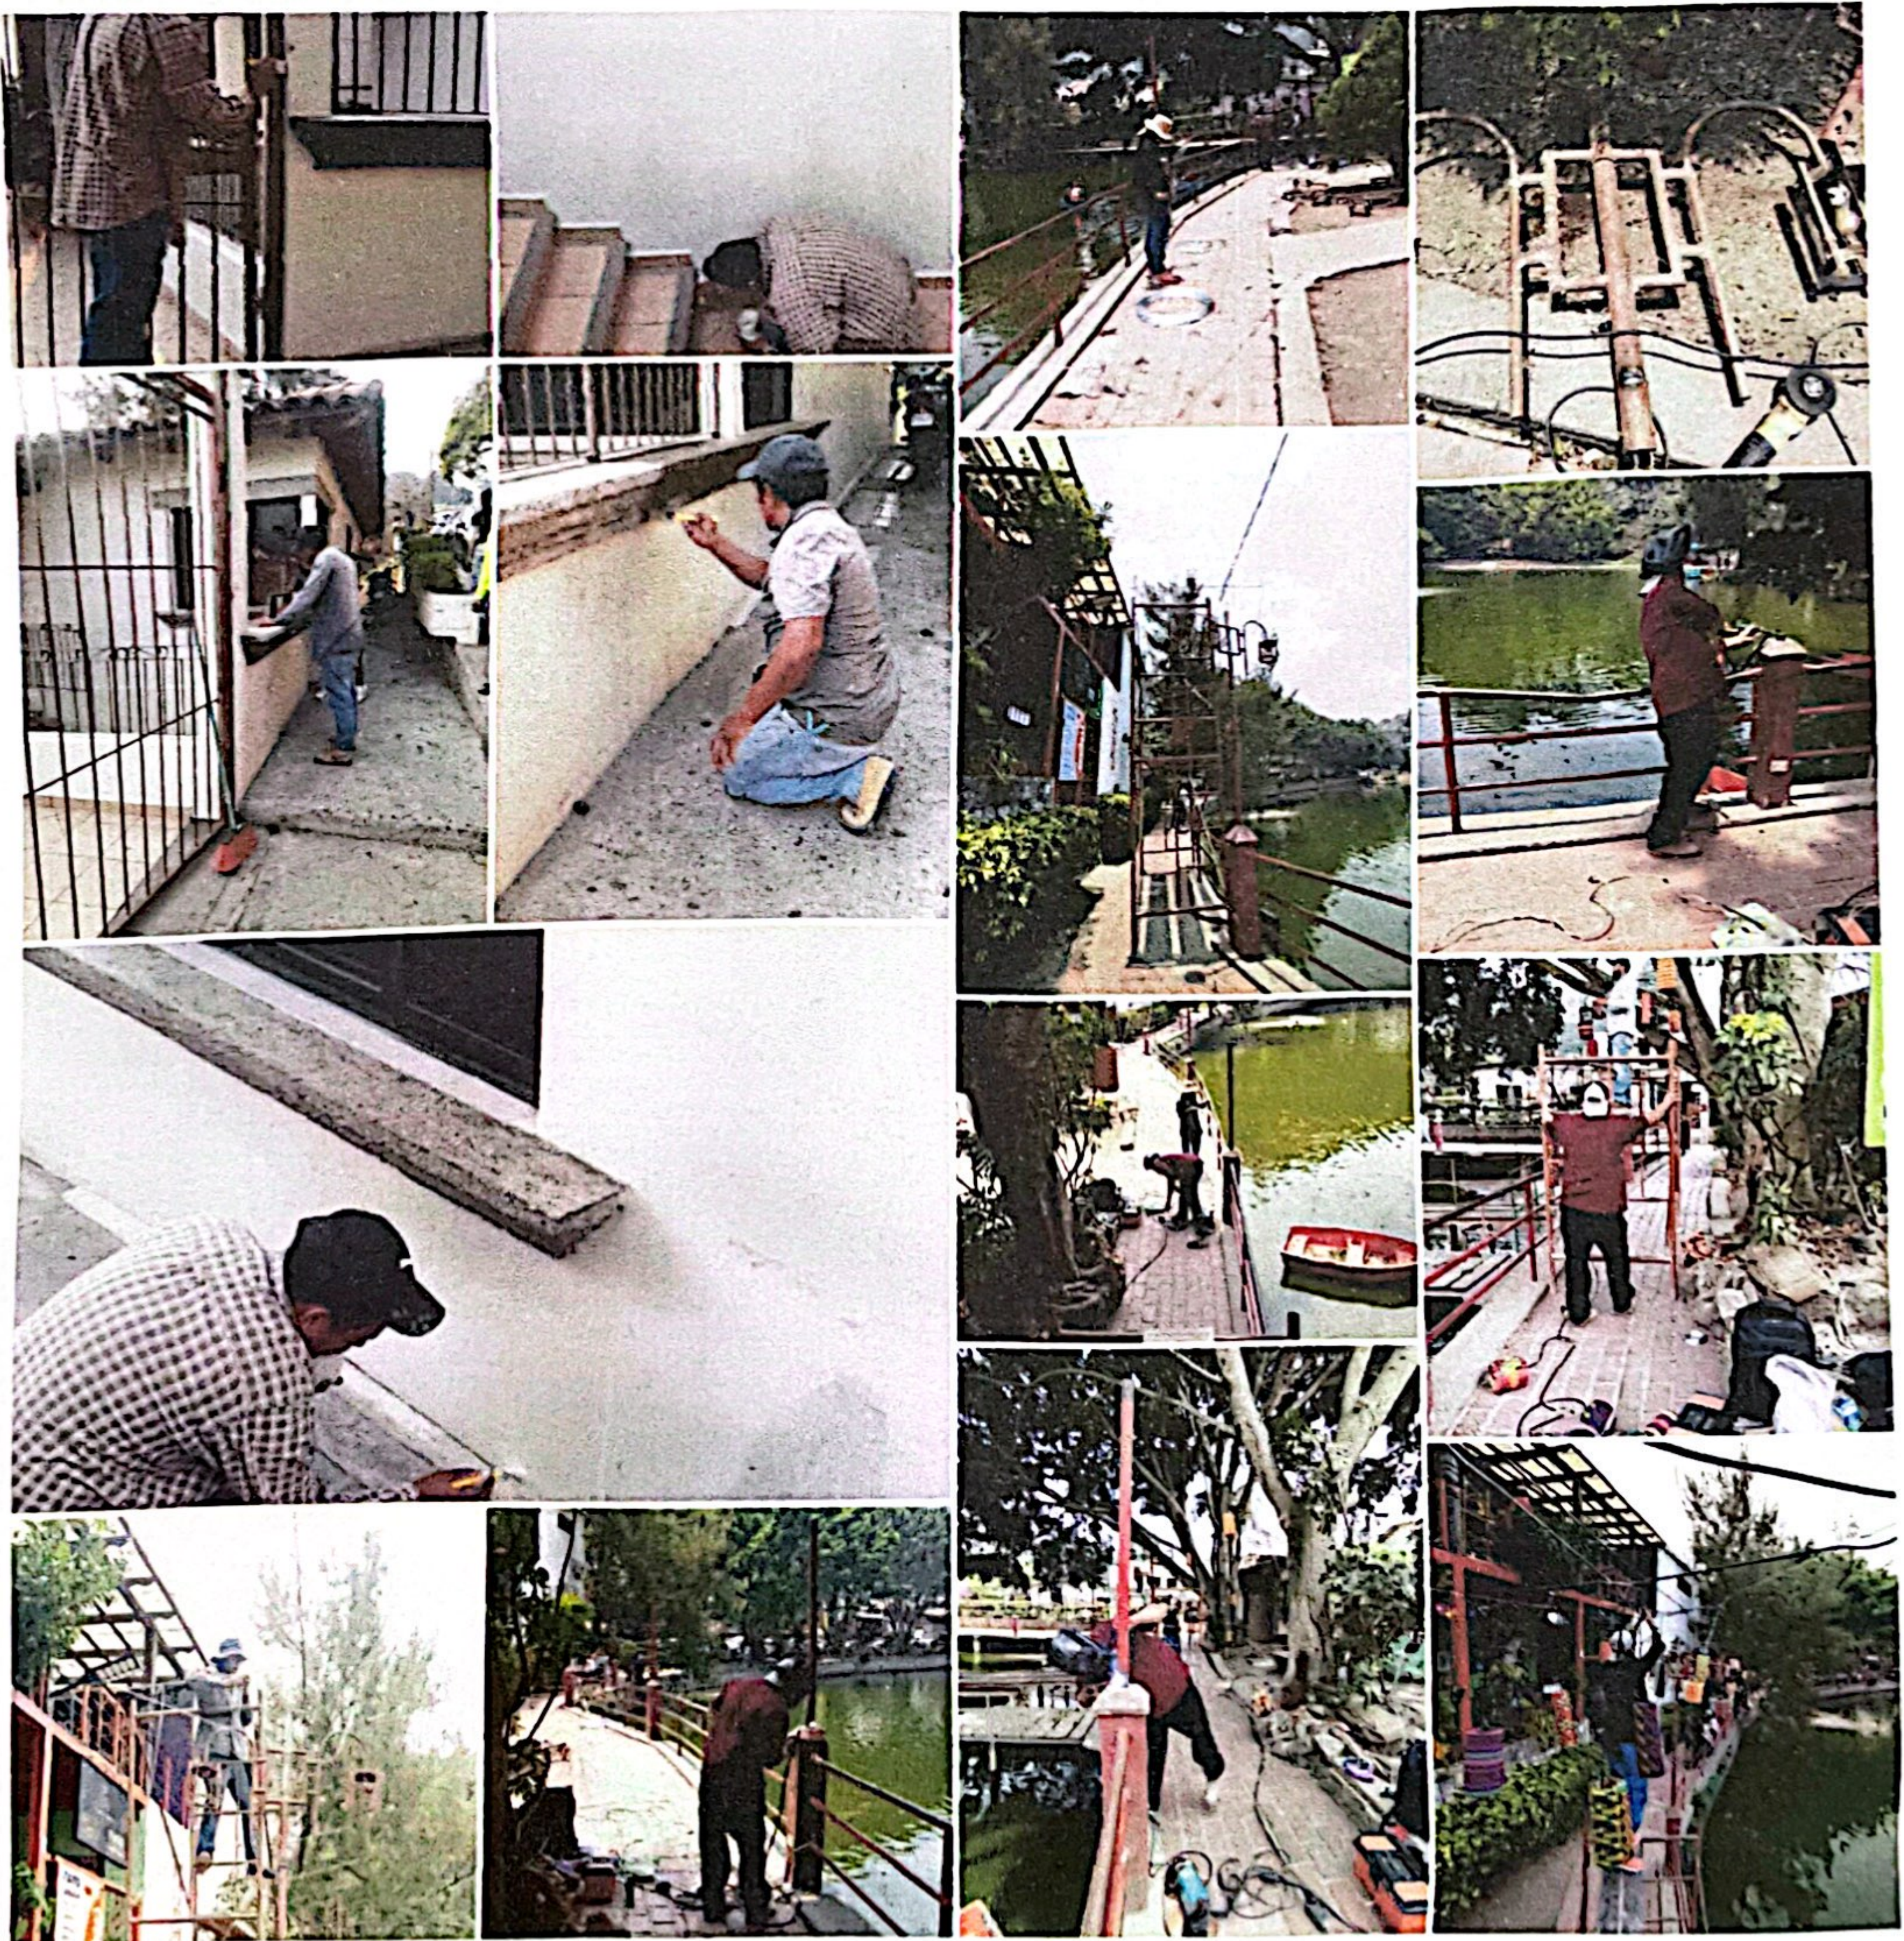

Mantenimiento de obras urbanísticas

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 085

- 1) Encargado de la Ejecución de Proyecto: José Benito Medina Tobías
- 2) Sector y Sub Sector: Unidad Municipal Ambiental
- 3) Nombre del Proyecto: Conservación Y Protección Del Medio Ambiente (Prevención Y Combate De Incendios Forestales)
- 4) Ubicación del Proyecto: Todo el Municipio
- 5) Propósito: Protección, control y seguimiento contra, incendios forestales.
- 6) Descripción del Proyecto: Estos trabajos se realizan para prevenir incendios forestales las hechas de rondas, y control para combatir cuando hay incendios forestales,

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

- 7) Alcance del Proyecto (Principal Producto): Prevenir Incendios Forestales.
- 8) Impacto en el Terreno y Asentamientos: estos trabajos se realizan en previos públicos y privados en el combate de incendios puede haber algunos perjuicios a terceros ya que hacemos lo más conveniente para prevenir un desastre y salvaguardar la vida de cualquier ciudadano.
- 9) Detalles del Encargado del Proyecto.
José Benito Medina Tobías, Coordinador de (UMA)
DNI. 0826- 1982- 00071
- 10) Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
- 11) Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:
La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. **130,601.76** Para ejecutar en el proyecto de Conservación Y Protección Del Medio Ambiente (Prevención Y Combate De Incendios Forestales) en el mes de abril del 2024 en todo el municipio.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

12) Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 21 de diciembre de 2023


13) Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2024 por ser un proyecto global para la Conservación Y Protección Del Medio Ambiente (Prevención Y Combate De Incendios Forestales).

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

14) Variación en el Costo Total del Proyecto:

15) Si existen Variaciones en el monto de Conservación Y Protección Del Medio Ambiente (Prevención Y Combate De Incendios Forestales)

16) Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo disponibilidad financiera de la Municipalidad.



José Benito Medina Tobías
Coordinador Municipal de Medio Ambiente, UMA.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Municipalidad de Santa Lucía F.M.

Honduras C.A.

Teléfono (504) 27790404, 2779-0433, 27790439

Fax (504)2779-029

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Control y prevención de incendios.

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti!



Honduras, C.A.

Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000	SIN PROYECTO	383,186.91	0.00	0.00	0.00	150,000.00	233,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 01 002 001 000 42510 11-001-01 20 2	IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD , VIGILANCIA Y MONITOREO	383,186.91	0.00	0.00	0.00	150,000.00	233,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 001 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
002	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA LA PANCHA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 002 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA LA PANCHA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
003	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESC.DIONISIO DE HERRERA	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
004	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y DIVISION EN EL AULA DE LA ESC.CASERIO EL TUNEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,250.75	18,250.75	0.00	0.00	36.50 %
15 00 004 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y DIVISION EN EL AULA DE LA ESC.CASERIO EL TUNEL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	18,250.75	18,250.75	0.00	0.00	36.50 %
005	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN LA ESC.UNION CENTRO AMERICANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,676.00	4,676.00	0.00	0.00	9.35 %
15 00 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION Y MEJORAS ESCUELA UNION CENTRO AMERICANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,676.00	4,676.00	0.00	0.00	9.35 %
006	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 006 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
007	CONSTRUCCION DE TECHADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES INST.SANTA LUCIA	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 007 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES INST.SANTA LUCIA	25,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
008	CONSTRUCCION DE MEJORAS ESC.JOSE CECILIO DEL VALLE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 008 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
009	CONSTRUCCION Y MEJORAS DE COMPLEJO DEPORTIVO ESC.15 DE SEPTIEMBRENUEVOS JUNCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 009 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ESC.15 DE SEPTIEMBRE NUEVOS JUNCALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
010	CONSTRUCCION DEL PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	330,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	330,600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	116,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	116,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 010 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 010 000 001 47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	214,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	214,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Honduras, C.A.

Programas y Proyectos

Periodo del: al
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024
 Hora : 01:14 p.m.
 Pagina: 2 de 8

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
011 MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	12.37 %
13 05 002 000 002 47210 11-001-01 20 8 MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	37,100.00	37,100.00	0.00	0.00	12.37 %
15 00 011 000 001 47210 11-001-01 20 8 MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
012 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	350,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	450,000.00	100,172.60	100,172.60	0.00	0.00	22.26 %
13 05 003 000 003 47210 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	78,099.60	78,099.60	0.00	0.00	52.07 %
15 00 012 000 001 23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 012 000 001 47210 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	22,073.00	22,073.00	0.00	0.00	7.36 %
013 CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 013 000 001 47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 013 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
014 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	2,033,889.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,889.48	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.12 %
11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	533,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	533,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 000 001 47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 014 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,812.39	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.25 %
015 CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	733,951.13	0.00	1,146,967.87	0.00	0.00	1,880,919.00	792,024.14	792,024.14	0.00	0.00	42.11 %
11 09 001 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	175,904.80	0.00	0.00	175,904.80	60,260.00	60,260.00	0.00	0.00	34.26 %
15 00 015 000 001 47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	233,951.13	0.00	700,000.00	0.00	0.00	933,951.13	232,385.00	232,385.00	0.00	0.00	24.88 %
15 00 015 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	0.00	271,063.07	0.00	0.00	771,063.07	499,379.14	499,379.14	0.00	0.00	64.77 %
017 CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 004 000 004 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 016 000 001 47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 016 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
018 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTA?ITA EL EDEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	1.98 %
15 00 017 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTA?ITA EL EDEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	1.98 %
019 CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS PITOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 018 000 001 47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS PITOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
020 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	833,077.09	0.00	1,425,904.80	0.00	0.00	2,258,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Honduras, C.A.

Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024
Hora : 01:14 p.m.
Pagina: 3 de 8

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
11 05 001 000 001 47210 11-001-01 20 4	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	583,077.09	0.00	175,904.80	0.00	0.00	758,981.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 019 000 001 47110 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 019 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
021 15 00 020 000 001 47110 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA RECOLECTAR AGUA EL CIPRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA RECOLECTAR AGUA EL CIPRES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
022 15 00 021 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECTAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS BARRIO ABAJO	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECTAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS BARRIO ABAJO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 021 000 001 47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECTAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS BARRIO ABAJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
023 15 00 022 000 001 47110 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	CONSTRUCCION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 022 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
024 15 00 023 000 001 47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINOS BARRIO EL PINTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINOS BARRIO EL PINTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
025 14 01 002 000 002 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 024 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
026 15 00 025 000 001 23400 11-001-01 20 8	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES ,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	800,000.00	588,279.24	588,279.24	0.00	0.00	73.53 %
	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES ,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	243,800.67	243,800.67	0.00	0.00	97.52 %
15 00 025 000 001 23400 15-013-01 20 8	MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES ,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	300,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	550,000.00	344,478.57	344,478.57	0.00	0.00	62.63 %
027 14 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	2,566,154.18	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,666,154.18	1,175,341.40	1,175,341.40	0.00	0.00	44.08 %
	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	1,166,154.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,154.18	106,392.40	106,392.40	0.00	0.00	9.12 %
15 00 026 000 001 47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,068,949.00	1,068,949.00	0.00	0.00	76.35 %

Honduras, C.A.

Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024
Hora : 01:14 p.m.
Pagina: 4 de 8

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
15 00 026 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
029	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 003 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 027 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
030	INSTALACION DE BOLLAS O TUMULOS EN LA CALLE PRINCIPAL	199,780.36	0.00	223,371.17	0.00	0.00	423,151.53	10,380.00	10,380.00	0.00	0.00	2.45 %
14 01 004 000 004 47210 11-001-01 20 5	INSTALACION DE HUELLAS Y TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL	199,780.36	0.00	223,371.17	0.00	0.00	423,151.53	10,380.00	10,380.00	0.00	0.00	2.45 %
15 00 028 000 001 23400 11-001-01 20 8	INSTALACION DE HUELLAS O TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
031	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 005 000 005 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 029 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE FUNDICION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
032	CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 006 000 006 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 030 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
033	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA LOS PLANES II ETAPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 031 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PLANES II ETAPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
034	CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA EL CHIMBO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 032 000 001 47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA EL CHIMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 032 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA EL CHIMBO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
035	CONSTRUCCION DE PUENTE EL ARENAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 033 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE PUENTE EL ARENAL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
036	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORTILLO DEL CLAVO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2.50 %
15 00 034 000 001 47210 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORTILLO EL CLAVO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2.50 %
15 00 034 000 001 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORTILLO EL CLAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
037	REPARACION DE FALLA EN LA CALLE NUEVOS JUNCALES Y CANALIZACION DE AGUAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 035 000 001 23400 11-001-01 20 8	REPARACION DE FALLA EN LA CALLE NUEVOS JUNCALES Y CANALIZACION DE AGUAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Honduras, C.A.

Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024
Hora : 01:14 p.m.
Página: 5 de 8

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
038 CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	10,000.00	0.00	21,872,958.98	0.00	0.00	21,882,958.98	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.04 %
15 00 036 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	10,000.00	0.00	184,626.09	0.00	0.00	194,626.09	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4.11 %
15 00 036 000 001 47210 11-011-01 20 8 CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	0.00	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 036 000 001 47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
039 CONSTRUCCION DE LOSA PARA CUNETA BARRIO ARRIBA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 037 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE LOSA PARA CUNETA BARRIO ARRIBA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
040 CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS ALDEA LA PANCHA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 038 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS ALDEA LA PANCHA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
041 CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 039 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
042 CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ZONAS CRITICAS ALDEA LOMA ALTA SUR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 040 000 001 47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE HUELLAS ZONAS CRITICAS LOMA ALTA SUR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
043 CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 041 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
044 CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ACHIOTILLAL	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 042 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ACHIOTILLAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 049 000 001 47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE DESDE LA LAGUNA HASTA EL ACHIOTILLAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
045 CONSTRUCCION DE GRADAS HACIA LOS MAGUELITOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 043 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE GRADAS HACIA LOS MAGUELITOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
046 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE LOS PITOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 044 000 001 47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE LOS PITOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
047 PAVIMENTACION DE CALLE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,202,798.43	1,202,798.43	0.00	0.00	48.11 %
15 00 045 000 001 47210 15-013-01 20 8 PAVIMENTACION DE CALLE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,117,990.43	1,117,990.43	0.00	0.00	55.90 %
15 00 045 000 001 47210 11-001-01 20 8 PAVIMENTACION DE CALLE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	84,808.00	84,808.00	0.00	0.00	16.96 %
048 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 046 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
049 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE LAS LAJITAS ALDEA EL CHIMBO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 047 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LAS LAJITAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Honduras, C.A.

Programas y Proyectos
Periodo del: al
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2024
Hora : 01:14 p.m.
Pagina: 6 de 8

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
050 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE LOS HORNITOS ALDEA ZARABANDA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 048 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS HORNITOS ALDEA ZARABANDA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
052 CONSTRUCCION DE CASETAS PARA ESTACION DE BUSES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 050 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 050 000 001 47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
053 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE LA MANZANA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 051 000 001 47210 11-001-01 20 8 FUNDICION DE CALLE LA MANZANA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
054 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLEJON CONTIGUO AL CEMENTERIO CASCO URBANO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 052 000 001 47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLEJON CONTIGUO AL CEMENTERIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
055 CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	1,583,077.09	0.00	598,140.92	0.00	0.00	2,181,218.01	752,206.11	752,206.11	0.00	0.00	34.49 %
11 04 001 001 000 36100 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	583,077.09	0.00	175,904.80	0.00	0.00	758,981.89	108,858.02	108,858.02	0.00	0.00	14.34 %
15 00 053 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	0.00	422,236.12	0.00	0.00	1,422,236.12	643,348.09	643,348.09	0.00	0.00	45.23 %
056 CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNAL ALDEA ZARABANDA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 054 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNAL ALDEA ZARABANDA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
058 REPARACION MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	4,709.13	4,709.13	0.00	0.00	3.77 %
15 00 055 000 001 23100 15-013-01 20 8 REPARACION MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	4,709.13	4,709.13	0.00	0.00	3.77 %
059 AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALCALDIA MUNICIPAL	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 056 000 001 23100 15-013-01 20 8 AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALCALDIA MUNICIPAL	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
060 CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 057 000 001 47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	110,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 057 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
062 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA PANCHA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 058 000 001 47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA PANCHA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
063 CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ALDEA LOMA ALTA NORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24.90 %
15 00 059 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOMA ALTA NORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24.90 %
064 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOMA ALTA NORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 060 000 001 47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOMA ALTA NORTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
065 CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS	87,834.38	0.00	211,503.25	0.00	0.00	299,337.63	190,914.80	190,914.80	0.00	0.00	63.78 %

BIPM		EN EL EJERCICIO			Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación				Devengado	Pagado			
15 00 061 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS	0.00	0.00	58,918.10	0.00	0.00	58,918.10	99.00	99.00	0.00	0.00	0.17 %
15 00 061 000 001 47110 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS	87,834.38	0.00	152,585.15	0.00	0.00	240,419.53	190,815.80	190,815.80	0.00	0.00	79.37 %
066	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA CASCO URBANO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 062 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
067	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 063 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
069	CONSTRUCCION REPARACION Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS DE PARQUE EL CEMENTERIO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 064 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION REPARACION Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS DE PARQUE EL CEMENTERIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
070	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 065 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
15 00 065 000 001 47110 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
071	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 066 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
082	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA BIOGESTOR DE BAÑOS ISL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 067 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA BIOGESTOR DE BAÑOS ISL	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
083	CONSTRUCCION DE AULA ESC.GENIOS DEL FUTURO CASERIO EL TUNEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 068 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA ESC.GENIOS DEL FUTURO CASERIO EL TUNEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
084	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	149,671.50	149,671.50	0.00	0.00	29.93 %
15 00 069 000 001 47110 15-013-01 20 8	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	149,671.50	149,671.50	0.00	0.00	29.93 %
085	CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	272,566.64	272,566.64	0.00	0.00	77.88 %
15 00 070 000 001 47110 15-013-01 20 4	CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	272,566.64	272,566.64	0.00	0.00	77.88 %
088	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,344,888.82	0.00	0.00	1,344,888.82	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	1.04 %
15 00 071 000 001 47110 11-001-01 20 1	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,344,888.82	0.00	0.00	1,344,888.82	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	1.04 %
089	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ALDEA ZARABANDA	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 005 000 005 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ALDEA ZARABANDA	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
090	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	223,371.17	17,510.78	17,510.78	0.00	0.00	7.84 %
13 05 006 000 006 47210 11-001-01 20 8	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00	223,371.17	17,510.78	17,510.78	0.00	0.00	7.84 %
091	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION TURISTICO	0.00	0.00	167,528.38	0.00	0.00	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Honduras, C.A.

Programas y Proyectos

Periodo del: al
Moneda Lempras (L)

Emisión: 13/05/2024
Hora : 01:14 p.m.
Pagina: 8 de 8

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 01 007 000 007 47110 11-001-01 20 7	CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CENTRO DE INVESTIGACION TURISTICO	0.00	0.00	167,528.38	0.00	0.00	167,528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
092	REPARACIONES EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO EN ALDEA ZARABANDA	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 072 000 001 47110 11-011-02 20 7	REPARACIONES EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO EN ALDEA ZARABANDA	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	1,942,696.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
093	CONSTRUCCION DE AULA NUEVA CON MODULO SANITARIO ESCUELA FELIZ HORIZONTE EN ALDEA LOMA ALTA SUR	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 073 000 001 47110 11-011-02 20 7	CONSTRUCCION DE AULA NUEVA CON MODULO SANITARIO ESCUELA FELIZ HORIZONTE EN ALDEA LOMA ALTA SUR	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	1,048,623.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
094	REPARACIONES EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EN ALDEA MONTA?ITA EL EDEN	0.00	0.00	308,680.26	0.00	0.00	308,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 074 000 001 47110 11-011-02 20 7	REPARACIONES EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EN ALDEA MONTA?ITA EL EDEN	0.00	0.00	308,680.26	0.00	0.00	308,680.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
095	CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO SANTA LUCIA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 00 075 000 001 47110 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO SANTA LUCIA	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		17,799,860.59	0.00	32,338,006.53	0.00	150,000.00	49,987,867.12	5,377,983.52	5,377,983.52	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte
Fecha Inicial: 1/1/2024
Fecha Final: 31/12/2024
Ejercicio: 2024
Programa: 813616
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Ds+js/j9JmezATh86pbI38kGwKh/jfI2atpJjUXyJxc6I/TkAVWHNxbG2PEFYgsuTSgzPCs+HE3SCojwldmWnaARmd+B8AN3efYBTvb+WmwR4IaMhBIC7SvSfj51woe3/yg2kP3mpWFrWN2RaXXK/dmPHFVE+Oll2aELI2c2e3yroRg/I2VyxiIGkVMbYPUbOFnnoZraPtubNUTJ+Ybw1Vp4pN+kusQ3FH8cOgNMIGHwE
HrTNiVrtIdfAQm9rACXWcnUWcpNmZVihSyVHg2uZEzYTRWOh2KzrWVPzNxsVFXMJBYP8ns7nOy98gpaCwnXVv81jibJE2nSosY9PP/NYwz7C+4/Y3kr8mf8=
