



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Encargado de ejecución del proyecto.	MUNICIPALIDAD DE TOMALA
Sector/Subsector	Infraestructura Social
Nombre del Proyecto	Construcción de Pavimento en Barrio el Pilar y Barrio Las Brisas.
Ubicación del Proyecto	Barrio El Pilar y Barrio Las Brisas, casco Urbano Municipal.
Propósito	El propósito principal del proyecto es pavimentar un tramo entre el Barrio las Brisas y Barrio El Pilar con un total de 375 metros lineales de pavimentación con concreto Hidráulico.
Descripción del proyecto.	En vista que nuestro municipio se encuentra en pleno desarrollo, se realizara un tramo de pavimentación de 375 metros lineales con concreto hidráulico con un espesor de 15 cm de los cuales INSEP construirá la cantidad de 246 metros lineales y la municipalidad construirá la cantidad de 129 metros lineales.

Avances del proyecto.	En el periodo del mes de Enero de 2019 se presentaron distintos avances en las diferentes actividades en ejecución: ✓ Se fundieron 50 metros lineales de los correspondientes a la municipalidad de Tomalá.
Impacto Ambiental	No se tiene un impacto ambiental en este proyecto,
Impacto del terreno y asentamiento.	NO APLICA
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Cesar Cárcamo López 9730-8692
Detalles del encargado del proyecto(MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com
Fuentes de financiamiento	L ✓ Municipalidad de Tomalá
Porcentaje de avance del proyecto.	40%



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Fecha de finalización estimada	Febrero 2019
--------------------------------	--------------




MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Memoria Fotográfica del proyecto.

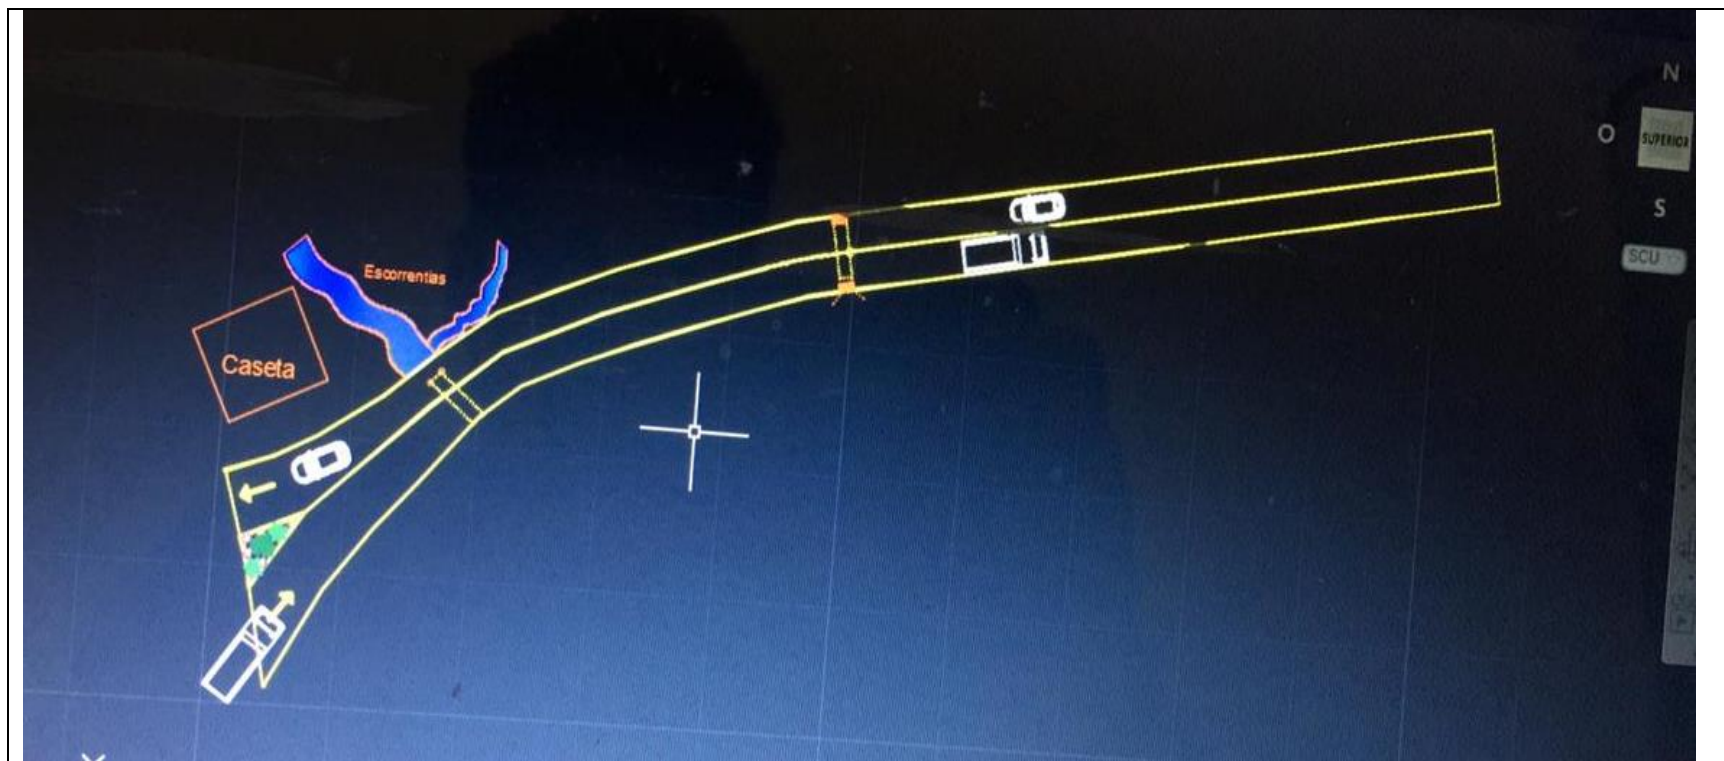

Levantamiento Topográfico del Terreno.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION



Proceso de Fundición de Concreto.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION



Proceso de Encofrado.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION



Proceso de Fundición.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION

Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
