



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2022
Hora : 01:47 p.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 3172

L.: 98,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2514

Fecha de Emision: 4/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

Id/RTN: 18041977027084

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Segunda Estimación del Contrato No.055-2021 por valor de Lps.198,490.00 por el Suministro de Materiales y Mano de Obra en el Centro de Educación Básica Juan Bautista Rivera de La Comunidad de El Corozal, Trinidad, S.B. (Valor de Estimación Lps.98,855.00 menos Retención del 5% de Garantía de Calidad Lps.4,942.75)presento Adendum No.007-2021 por ampliación de tiempo por un total de 28 días laborales contados del 04 diciembre 2021 al 05 enero 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 001 001 000 23100 11-001-01	MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	98,855.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	4,942.75
Total de retenciones:		4,942.75

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,855.00
Monto Total:		98,855.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,855.00
- RETENCIONES	4,942.75
TOTAL	93,912.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Henry Alberto Enamorado Soto
1804-1977-02708

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwrfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCCymUBlfatiLu+cr0sVdfGNHy6j8q13k9QSgrebsDJxQXuhSYWviZzj49C FPUoah75xqDkGmQxXP0Op3+MSTL3BAddb2+qYrwsbrtip2H 5Q==



ADENDUM DE CONTRATO N°007-2021

Nosotros, Manuel Leopoldo Regalado, mayor de edad, casado, Bachiller En Ciencias y Letras, hondureño, con tarjeta de Identidad No. 1606-1979-00036, con domicilio en el Municipio de Trinidad, Santa Bárbara, actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Trinidad, nombrado mediante punto Único de la Sesión extraordinaria celebrada el día 17 de Diciembre de 2017, certificada por el Tribunal Supremo Electoral, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, denominado en adelante **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el Señor **HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO**, mayor de edad, casado, hondureño, con tarjeta de identidad número **1804-1977-02708**, RTN **18041977027084**, casado, hondureño y con domicilio en el Departamento de Santa Bárbara, quien actúa por su propia cuenta, y de aquí en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**. Por este medio hacemos constar que hemos convenido en celebrar el presente **ADENDUM AL CONTRATO # 055-2021** relacionado con el **SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MEJORA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN BAUTISTA RIVERA DE LA COMUNIDAD DEL COROZAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA.**, el cual se regirá bajo las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: LA MUNICIPALIDAD** con fecha 11 de noviembre del año 2021 firmó con **EL CONTRATISTA** el contrato respectivo **POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MEJORA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN BAUTISTA RIVERA DE LA COMUNIDAD DEL COROZAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA.** Por un monto de ciento noventa y ocho mil cuatrocientos noventa lempiras exactos (**Lps. 198,490.00**), de acuerdo al monto de la Oferta presentada, el cual se realizó en un lapso de tiempo de 15 días calendario a partir del viernes 12 de noviembre al día viernes 03 de diciembre del presente año. **CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL ADENDUM:** Realizar la ampliación de tiempo al contrato de Suministro de materiales y mano de obra para mejora en el Centro de Educación Básica Juan Bautista Rivera de la comunidad del corozal, Trinidad, Santa Bárbara, por un total de 28 días laborales contados a partir del 04 de diciembre al 05 de enero del 2022, luego de la fecha de finalización del contrato, ya que se requirió más tiempo porque el centro educativo fue centro de votación y requería de mejora eléctrica en las instalaciones por lo que se detuvo el trabajo **CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO:** El presente contrato no sufrirá incremento de su monto contractual.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
ALCALDIA MUNICIPAL



CLAUSULA CUARTA: ACEPTACION: Queda entendido que el resto de las cláusulas del contrato inicialmente firmado se mantienen vigentes y que deberá ser respetado y cumplido de acuerdo a sus lineamientos. **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DE ESTE ADENDUM DE CONTRATO:** Forman parte de este Adendum de contrato: 1) El contrato original y sus cláusulas. 2) Solicitud de Adendum entregado por el contratista Henry Alberto Enamorado Soto. Estando de acuerdo con lo establecido en cada una de las cláusulas anteriores tanto **LA MUNICIPALIDAD** como **EL CONTRATISTA** ratifican el presente Adendum de Contrato y lo suscriben en el municipio de Trinidad, departamento de Santa Bárbara, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). Quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes, para los fines legales consiguientes.



Manuel Leopoldo Regalado
Alcalde Municipal
Trinidad, Santa Bárbara



Henry Alberto Enamorado Soto
Contratista



CEIBITA
SPORT CENTER

Estimación Avance de Obra #2

Contratista: Henry Enamorado	
Proyecto: Mejoras Centro Basico	
Lugar: Corozal Trinidad Santa Bárbara	5 de Enero 2022

Actividad	Un.	Precio Un.	Presupuesto	Obra Ejecutada	Porcentaje
Elaboración e Instalación de Puertas de Metal	4	3,000.00	Lps.12,000.00	Lps.12,000.00	100%
40 mts de canal de Drenaje	40	3,000.00	Lps.12,000.00	Lps.12,000.00	100%
Tuberia para Drejane	50	250.00	Lps.12,500.00	Lps.12,500.00	100%
Repello y pulido de paredes interiores	222	395 Lps	Lps. 87,690.00	Lps. 58,855.00 149 mts	70%
Pintura de paredes interiores		Lps. 3,500.00	Lps. 3,500.00	Lps. 3,500.00	100%
Total Ejecutado			198,490.00	Lps. 98,855.00	
Retención por calidad de obra	5%	Lps. 4,942.75			
Pago Total		Lps. 93,912.25			


Henry Alberto Enamorado Soto




Manuel Leopoldo Regalado

CEIBITA SPORT CENTER

DE: HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO
 R. T. N. 18041977027084 - TEL. 99969840
 Bo. Alto de Galeras, calle principal, Santa Barbara Honduras, C. A.
 Email: ceibi1@yahoo.com
 CAI: 43215D-81D63A-224589-38869E-08187D-67

DIA	MES	AÑO
21	01	22

FACTURA

000-001-01-00
Nº 005435

Nombre: Municipalidad de Trinidad Sta Barbara
 R. T. N. 1626 999 544 3317

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Pago total del contrato # 055-2021			93,912.25

CONSTADOREGONERADO
ORDENDECOMPRAVENTA
NUMERODEREESTROSAG

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2641-1396
 12Td. 000-001-01-00005,301 - 000-001-01-00005,900 - Fech. Recepción - 14/04/2021 - Limite. Emisión - 14/04/2022

Son: noventa y tres mil, novecientos doce
lempiras con veinte y cinco centavos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	93,912.25





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION FINAL

PROYECTO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MEJORA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN BAUTISTA RIVERA DE LA COMUNIDAD DEL COROZAL EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD S.B

Los abajo firmantes en representación de la MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B. Manuel Leopoldo Regalado Fernández y el Sr. Henry Alberto Enamorado Soto en su condición de CONTRATISTA, después de haber realizado la inspección final del proyecto " SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA MEJORA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN BAUTISTA RIVERA DE LA COMUNIDAD DEL COROZAL EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD S.B.

" CERTIFICAN QUE:

Los trabajos realizados por el contratista Sr. Henry Alberto Enamorado Soto según contrato N° 055-2021 celebrado el 11 de noviembre de 2021 fueron efectuados de acuerdo a lo pactado en el contrato antes mencionado.

En fe de lo cual firmamos la presente Acta de Recepción Final a los cinco días del mes de enero de 2022.



Manuel Leopoldo Regalado Fernández

Alcalde Municipal

Identidad: 1606-1979-00036

Henry Alberto Enamorado Soto

IDENTIDAD: 1804-1977-02708

RTN: 18041977027084



"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 18041977027084

HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20110106

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 543878

Transacción: 67492C



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-6411

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ENAMORADO SOTO HENRY ALBERTO**
Con Registro Tributario Nacional: **18041977027084**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-6411 en fecha 12/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418014790 de fecha 12/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202201, según declaración 27724702363, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.



Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-6411** o mediante el siguiente código QR:



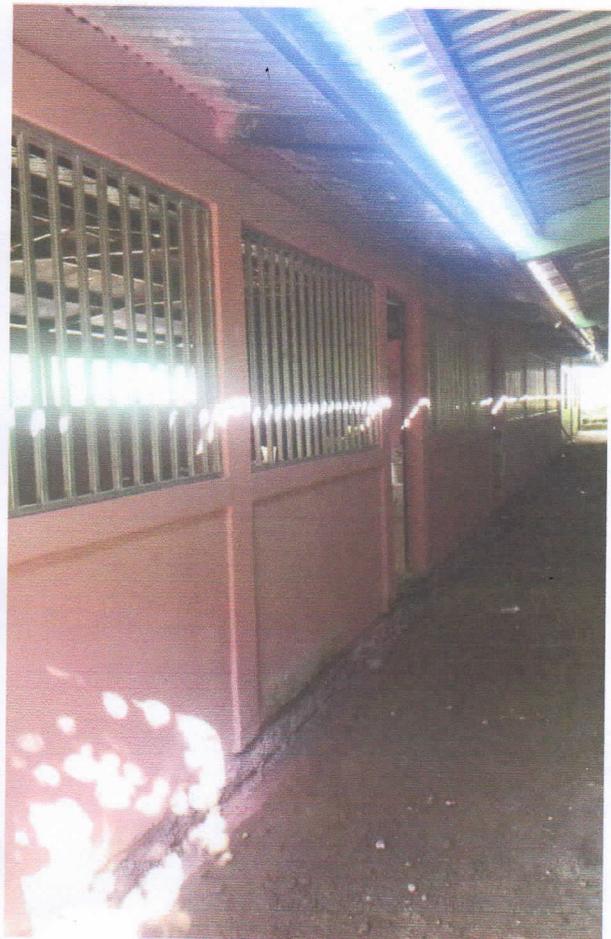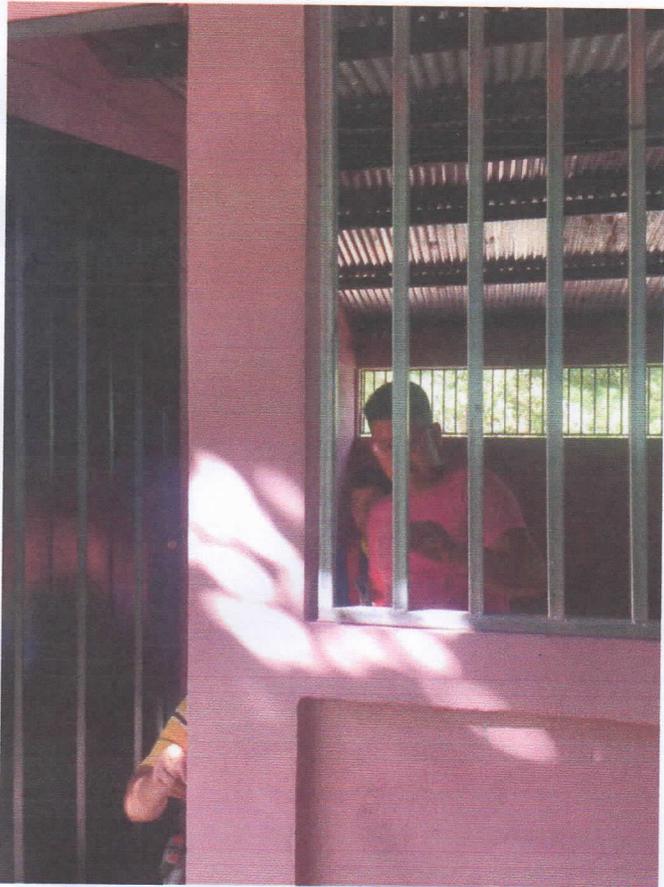

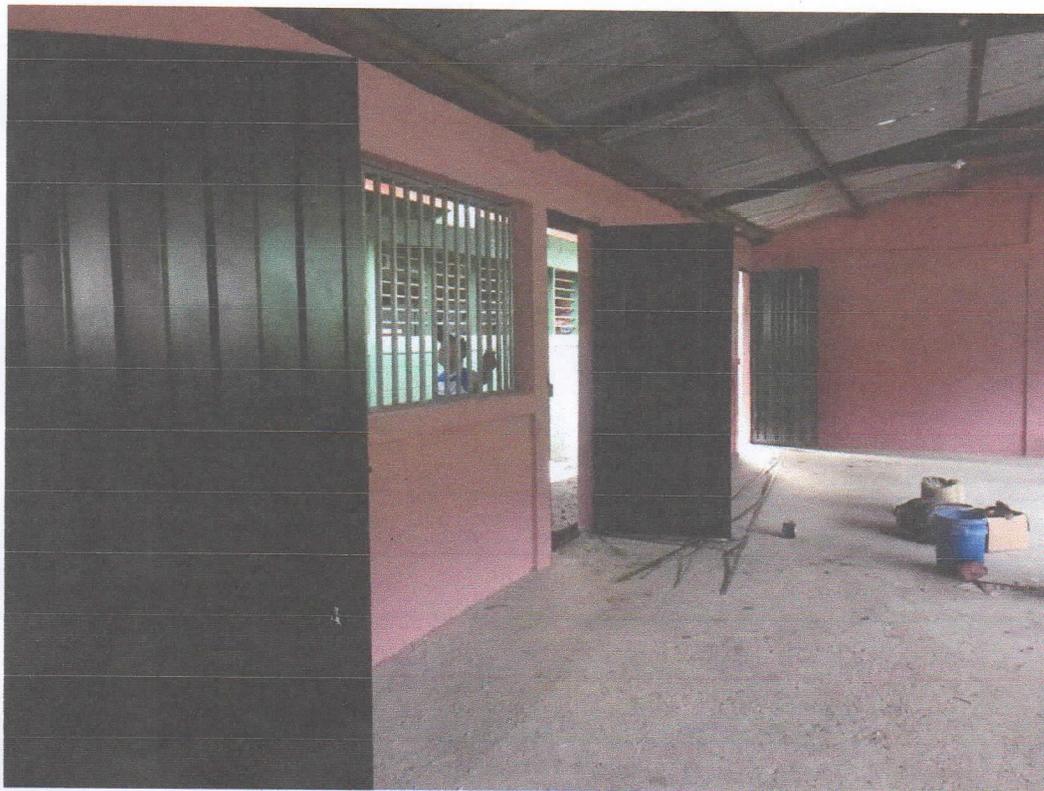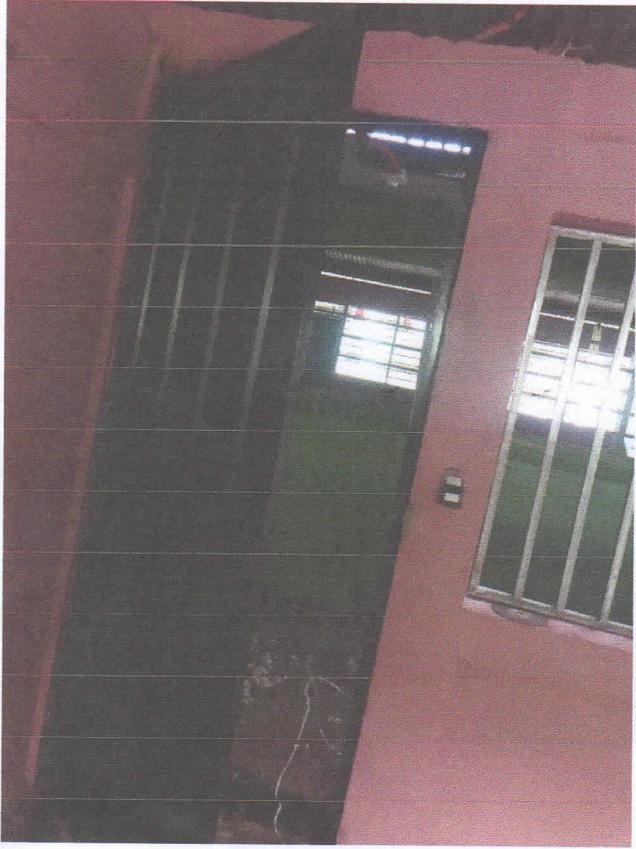





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022

Hora : 02:11 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 3182

L.: 299,569.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2523

Fecha de Emisión: 10/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA

Id/RTN: 1606198700048

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Segunda Estimación del Contrato No.062-2021 por valor de Lps.803,487.87 (Adendum No.01-2022) por la Construcción 116 Mts Pavimento de Concreto Ciclópeo 70/30, de 6.30 M de ancho y 20 cm de espesor en el Barrio San Juan II, T.S.B. (Segunda Estimación Lps.374,461.56, Retención de Anticipo Lps.74,892.31, Retención del 5% de Calidad de Obra Lps.18,723.08 y Retención el 12.5% del Impuesto Sobre La Renta Lps.4,680.77 TOTAL A PAGAR LPS.276,165.40)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 013 000 001 47210 11-011-10	CONSTRUCCION 116 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	299,569.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	4,680.77
207	RETENCIONES VARIAS	18,723.08
Total de retenciones:		23,403.85

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	Transferencia Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo en Barrio San Juan II, Trinidad,S.B.- Inversión	299,569.25
Monto Total:		299,569.25



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2022
Hora : 02:11 p.m.

USUARIO:
YESENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	299,569.25
- RETENCIONES	23,403.85
TOTAL	276,165.40

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

1606-1987-00040

RICARDO LEIVA RIVERA
 INGENIERO CIVIL
 78-01-15
 06-02-15
 C.H., HONDURAS

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwUjZiGX9Yy8XhiCGvmUBlfatiLu+cr0sVdfGNHy6j8q13k9QSgrebsDjxQXuhSYWviZzj49C
FPuOah75xqDkGmQxXP0p3+MSTL3BAAddb2+qYrwsbrtip2H 5Q==

ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA # 2

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 116 ML PAVIMENTO CICLOPEO, A=6.30 M , e=20 CMS

UBICACIÓN: CALLE EN BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO, TRINIDAD, SANTA BARBARA

N°	ACTIVIDAD	CONTRATADO				AVANCE ANTERIOR			AVANCE DEL PERIODO			AVANCE TOTAL	
		UND	CANT.	P. UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL
1	Trazado y Marcado Con Teodolito	Global	1.00	18262.40	18,262.40	1.00	18,262.40	2.27	0.00	0.00	0.00	1.00	18,262.40
2	Excavación Tipo I (Material Común)	M3	167.76	196.95	33,040.33	167.76	33,040.33	4.11	0.00	0.00	0.00	167.76	33,040.33
3	Acarreo de Material (Desperdicio)	M3-km	872.35	30.62	26,711.36	872.35	26,711.36	3.32	0.00	0.00	0.00	872.35	26,711.36
4	Conformacion Y Compactacion de Sub-rasante	M2	559.20	93.21	52,123.03	559.20	52,123.03	6.49	0.00	0.00	0.00	559.20	52,123.03
5	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	83.88	505.51	42,402.18	83.88	42,402.18	5.28	0.00	0.00	0.00	83.88	42,402.18
6	Pavimento de Concreto Ciclópeo e=0.20, (incluye corte, curado y sellado de juntas)	M3	111.84	3982.71	445,426.29	0.00	0.00	0.00	74.39	296,273.80	66.51	74.39	296,273.80
7	Acero de Refuerzo, Grado Inter. Fy=2800 kg/Cm2	Kg	354.82	152.17	53,992.96	0.00	0.00	0.00	177.41	26,996.48	50.00	177.41	26,996.48
8	Bordillo de Concreto Ciclópeo de 0.15 x 0.15	ML	233.00	406.28	94,663.24	0.00	0.00	0.00	126.00	51,191.28	54.08	126.00	51,191.28
9	Acondicionamiento de Pozos Existentes	Unidad	2.00	2756.42	5,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Movilizacion de Equipo	Global	1.00	26000	26,000.00	1.00	26,000.00	3.24	0.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00
11	Rótulo del Proyecto	Unidad	1.00	5,353.24	5,353.24	1.00	5,353.24	0.67	0.00	0.00	0.00	1.00	5,353.24
GRAN TOTAL.....LPS.					803,487.87	0.00	203,892.54	25.38		374,461.56	46.60		578,354.10

RESUMEN DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA

1*) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPO.....LPS.	374,461.56
2*) DEDUCCION DEL ANTICIPO 20% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	74,892.31
3*) DEDUCCION DEL CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	18,723.08
4*) DEDUCCION DEL ISR (12.5% DEL 10% CONSIDERADO COMO UTILIDAD) DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	4,680.77
5*) NETO A PAGAR EN SEGUNDA ESTIMACION.....LPS.	276,165.40

CUADRO DE DEDUCCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		CUADRO DE DEDUCCION			
TOTAL DEL ANTICIPO (20%)	L 160,697.57	AMORTIZACION DE ANTICIPO			
		ANTERIOR	ESTA EST.	ACUMULADO	PENDIENTE DE AMPORTIZAR
		0.00	74,892.31	115,670.82	L 45,026.75



 JOSE EDGARDO LEIVA
 CONTRATISTA



 DR. FREDMAN ALLAN PAREDES PAZ
 ALCALDE MUNICIPAL



 ALMA SARAY PAZ
 TESORERA MUNICIPAL



PROP. JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA
 R. T. N. 16061987000488 // TEL. 88201108
 BARRIO EL OCOTE, CALLE PRINCIPAL,
 COLINAS S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: galoleiva7@gmail.com
 CAI: B625B9-E28183-E74B83-CF1025-AE55FA-18

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00

Nº 000023

Por Lps: **276,165.40**

Recibí de: Municipalidad De Trinidad S.B

RTN: 16269995443317

La suma neta de: Docientos setenta y seis mil ciento sesenta y cinco 40/100

Por concepto de: Pago Segunda Estimacion de Contrato No. 062-2021 Pavimento Concreto Ciclopeo Barrio San Juan II

10 de 2 del 2022

[Handwritten Signature]
 firma



Total por Honorarios	L.:	
Total Retenido	L.:	
Total Neto Recibido	L.:	<u>276,165.40</u>

Original: Cliente Copia: Emisor
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050 - Fech. Recepción - 09/03/2021 - Limite. Emisión - 09/03/2022

RECIBO

Por Lps. 276,165.40

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 40/100 (**Lps. 276,165.40**) por concepto de Segundo pago según Estimación de Avance de Obra del **"PROYECTO DE PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE 116 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO A=6.30 M Y DE 20 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA,** para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 11 de Febrero del 2022.



Ing. Jose Edgardo Leiva

Contratista

Ident. # 1606-1987-00048

Resumen Financiero	
Segundo pago.....Lps.	374,461.56
Menos:	
Retención Del Anticipo.....Lps.	74,892.31
Retención De Calidad De Obra...Lps.	18,723.08
Retención Del ISR.....Lps.	4,680.77
Monto a Pagar.....Lps.	276,165.40

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

INFORME TECNICO 2

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE 116.00 ML
DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO
CON ANCHO DE 6.30 Y $e=0.20$ M, CALLE EN
BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE TRINIDAD.**

Trinidad Santa Bárbara, Febrero 2022.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

INFORME TECNICO No.2 **Ejecución De Obra**

PROYECTO: Construcción De 116.00 ml de pavimento de concreto ciclópeo con ancho=6,30 m, e=0,20 m.

UBICACIÓN:

Este proyecto está ubicado en la Calle del Barrio San Juan II, Casco Urbano, del Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara

FECHA DE INFORME: Viernes 11 de Febrero del 2022.

ALCANCE DEL PROYECTO:

El Proyecto consiste en la ejecución de todas aquellas obras necesarias para alcanzar las condiciones óptimas para el tránsito de vehículos y de peatones en la Calle, con la construcción del Pavimento, beneficiando así a los vecinos.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El objetivo estructural del proyecto fue obtener una capa de rodadura en las más óptimas condiciones tomando en cuenta la calidad de los materiales y la ejecución adecuada del proyecto, el objetivo fundamental del proyecto fue solucionar los problemas que presentaba la calle ya que es el principal acceso a dicho Barrio, y en tiempo de invierno debido a las lluvias se vuelve lodosa debido al tipo de terreno, formación de grandes charcos y así avanza el deterioro de la calle, misma que presenta dificultad para transitar de manera peatonal, de igual manera para los vehículos y moto taxis que circulan a diario.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

Entre las actividades que se están realizando durante el tiempo de la construcción del Proyecto se encuentran las siguientes:

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO.- 20 cms. de Espesor:

MATERIALES: Madera rústica de pino, clavos, piedra fina canto rodado, arena, grava, cemento gris, agua.

MANO DE OBRA: Maestro de obra, albañil, ayudantes, peones.

HERRAMIENTAS: Rasa de madera, martillo, palas, cuchara de albañilería, metro, nivel.

PROCEDIMIENTO: El pavimento consta de 2 calzadas, formadas por losas de 20 cms. divididas por la línea central, ambas con 2% de bombeo y se fundirán por separado.- Se procederá a colocar las tablas de 1"x6" para el encofrado y nivelación, con breces y estacas de madera, debidamente alineadas y de acuerdo al nivel de la rasante y a los ejes.- El concreto será de 1:2:3, se revolverá con mezcladora mecánica de 1 bolsa; el regado se hará a mano y se nivelará con rastra metálica.- Finalmente se afinará la superficie con textura relativamente rugosa se regará con curador para concreto.

Se cuantificará por M3.- Se verificará el espesor de 20 cms.

BORDILLOS DE 0.15x0.15:

MATERIALES: Madera rústica de pino, clavos, arena, grava, cemento gris, agua.

MANO DE OBRA: Maestro de obra, albañil, ayudantes, peones.

HERRAMIENTAS: Almádana, martillo, palas, cuchara de albañilería, metro, plomada.

PROCEDIMIENTO: La calle lleva bordillos de concreto ciclópeo, de 0.15x0.15; a ambos lados.- Inicialmente se encofrará con tablas de 1"x6" y breces de madera y serán alineados paralelos a la rasante de la calle.- El concreto será de 1:2:3, se revolverá con mezcladora mecánica de 1 bolsa; el regado se hará a mano y se nivelará con rastra de madera.- Finalmente

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

se afinará la superficie con textura relativamente rugosa se regará con curador para concreto.

Se cuantificará por ML.- Se verificarán sus dimensiones de 15cms x 15cms.

ACERO DE REFUERZO, GRADO INTER. FY=2800 KG/CM2

El acero de refuerzo concierne a varilla grado 60, utilizada en las juntas longitudinales y transversales del pavimento, donde se utilizó varilla #4, y la varilla #3 grado 60 utilizada en el bordillo de concreto.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN SEGUNDA ESTIMACION:

Pavimento de Concreto Ciclópeo e=0.20, (incluye corte, curado y sellado de juntas)	M3	74.39
Acero de Refuerzo, Grado Inter. Fy=2800 kg/Cm2	Kg	177.41
Bordillo de Concreto Ciclópeo de 0.15 x 0.15	ML	126.00

AVANCE FISICO DE OBRA: 46.60%

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES



- La contratación del personal estuvo a cargo del Contratista, el cual es responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal.
- El contratista es el encargado de la compra de materiales y contratación de mano de obra calificada y no calificada.
- La supervisión está a cargo de al Secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento SEDECOAS.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.


IMAGENES

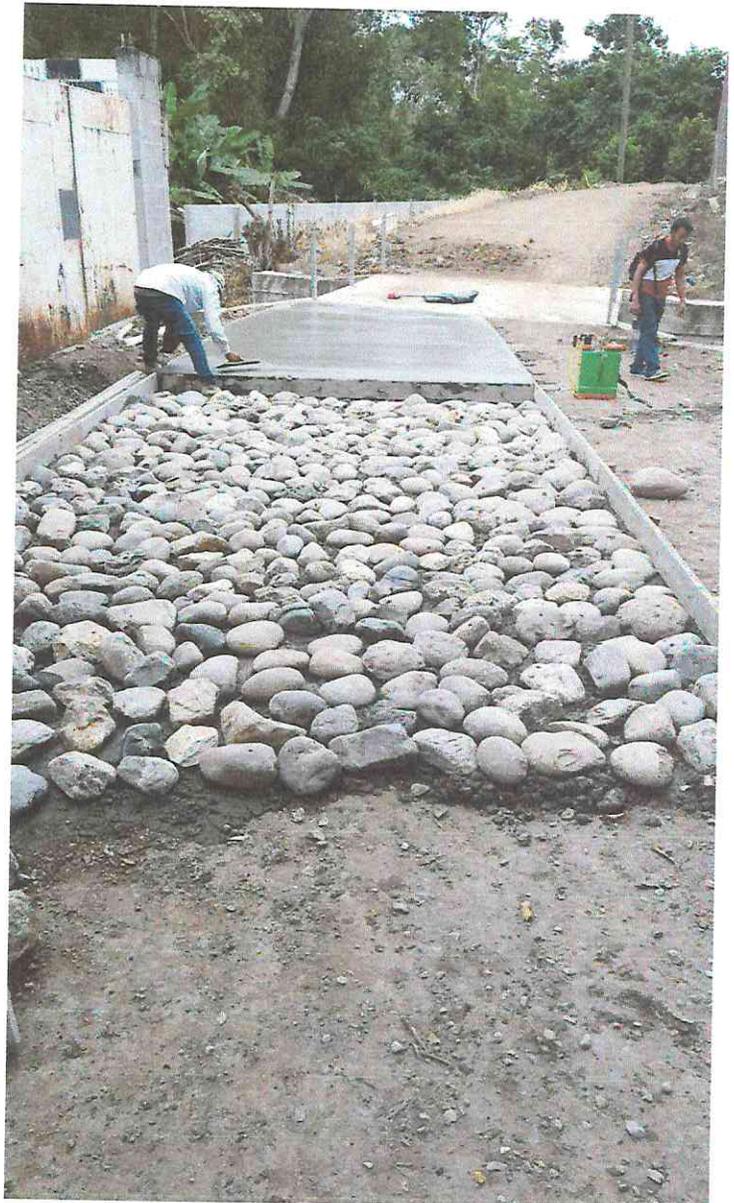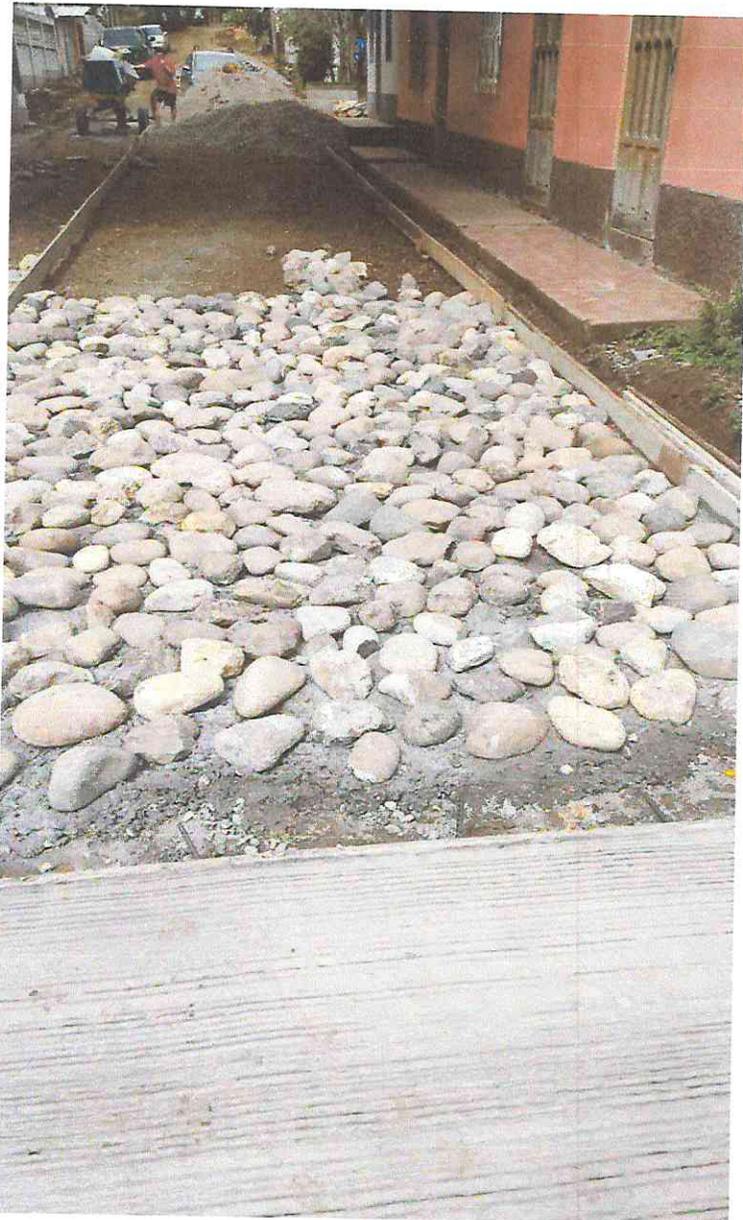

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

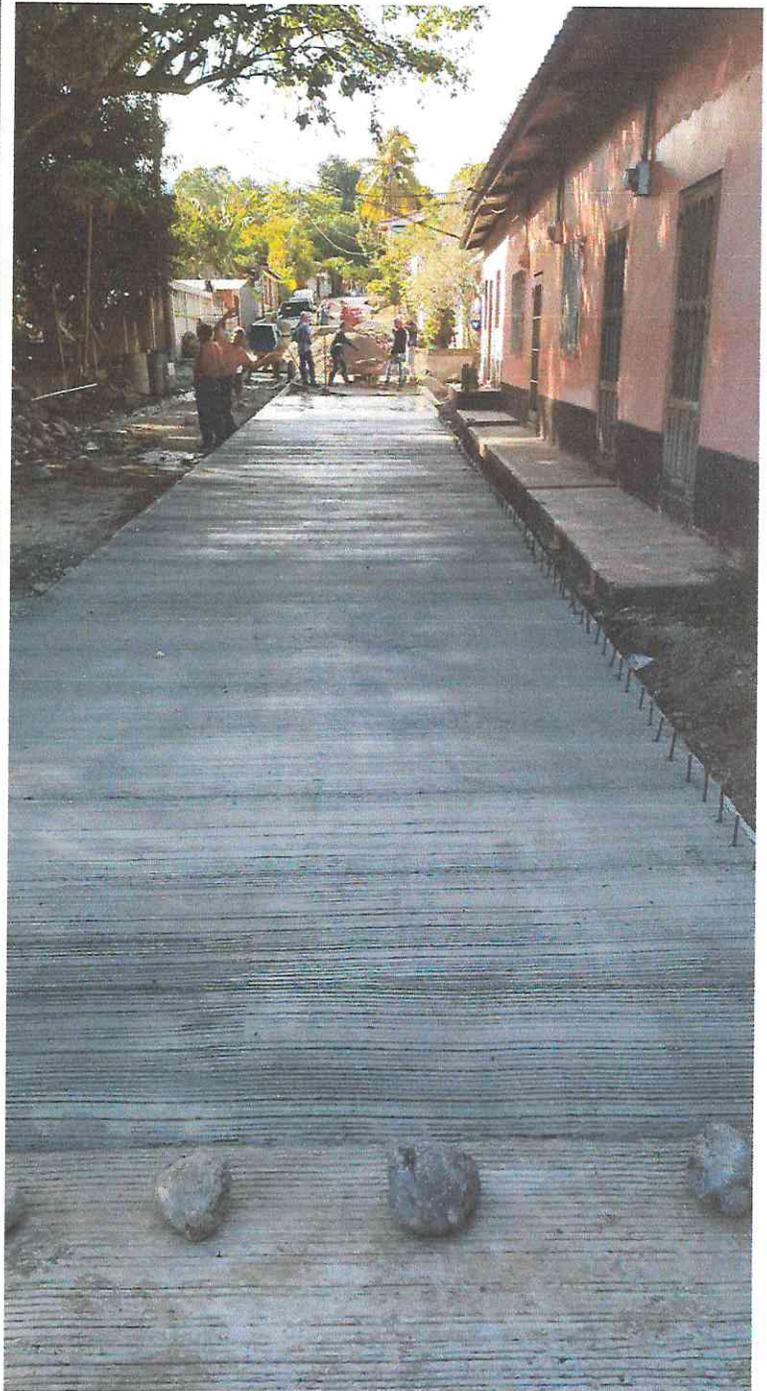

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

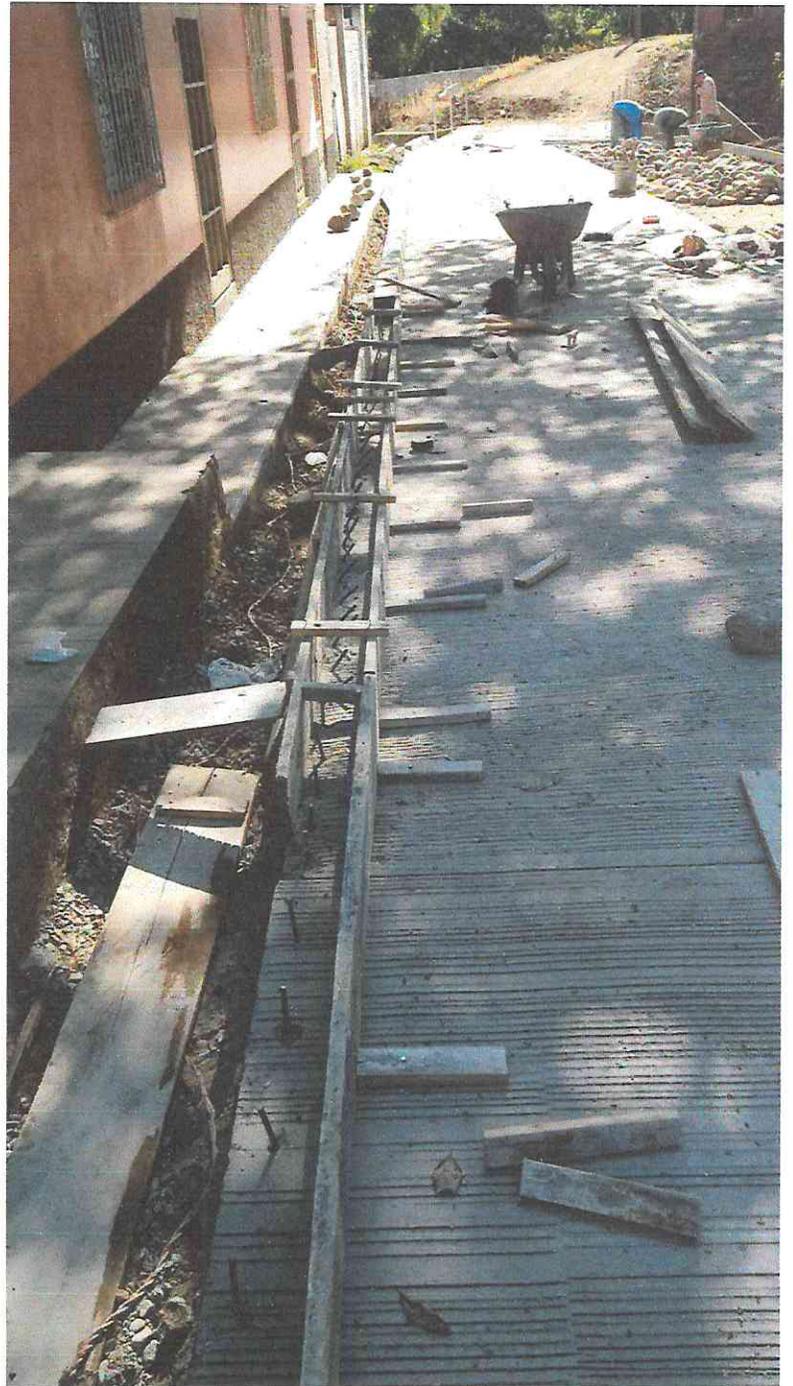

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

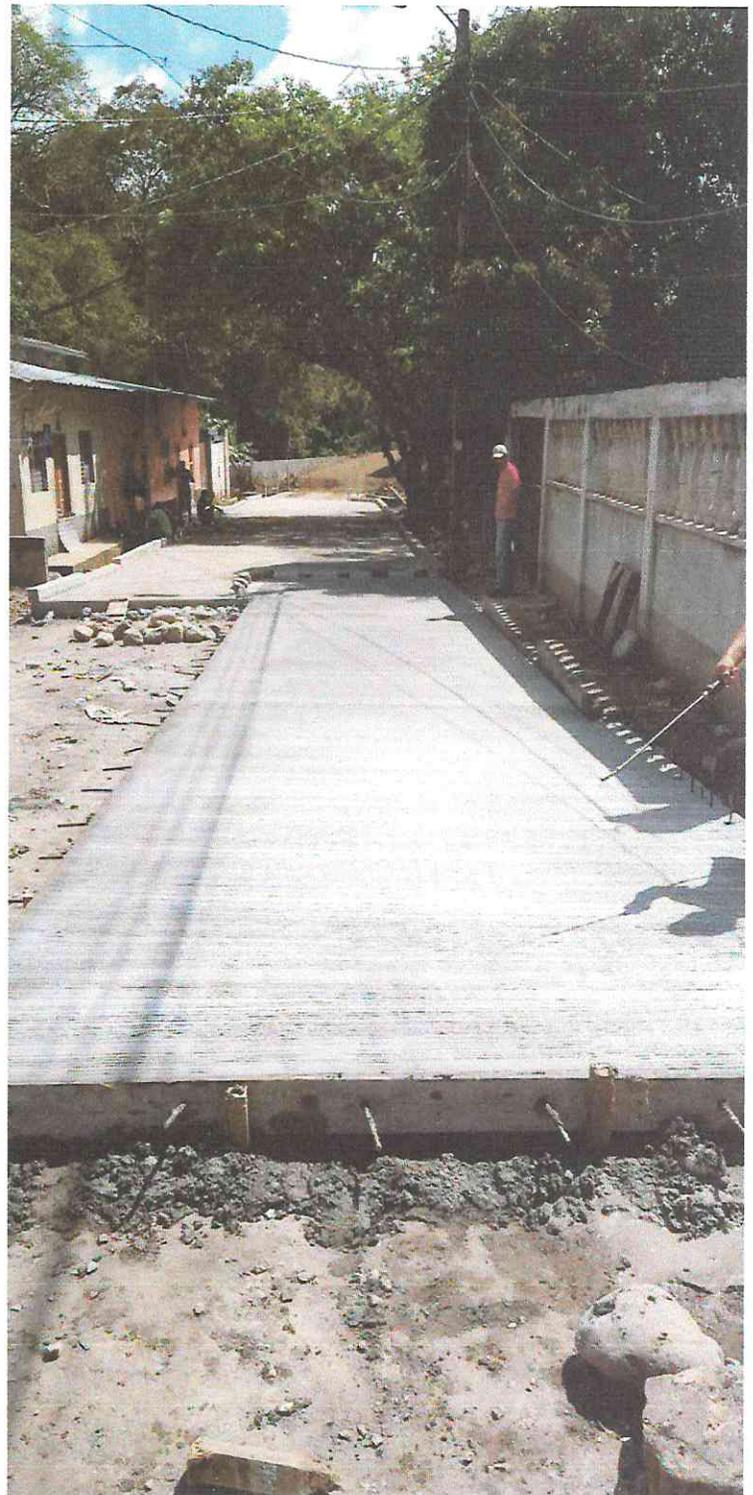

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

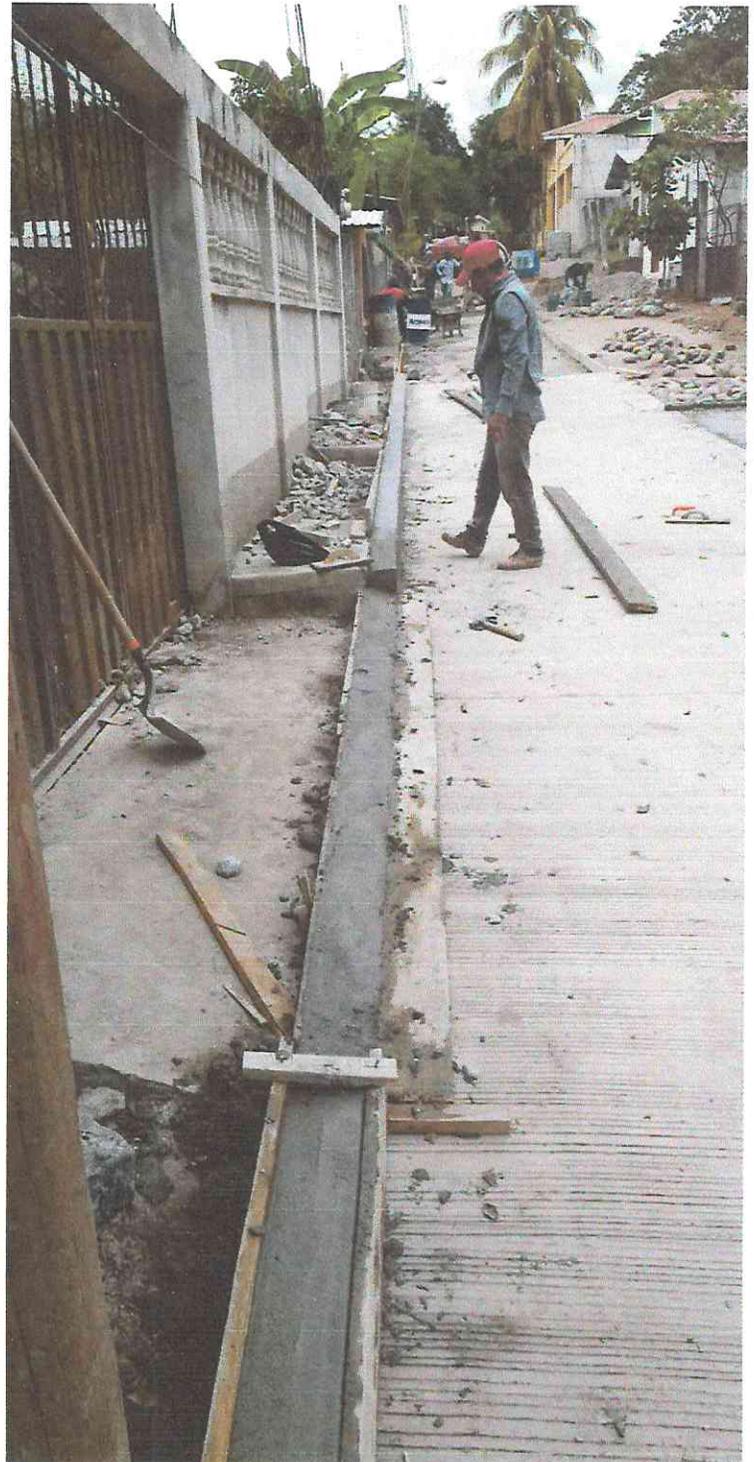

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 3211

L.: 128,482.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2546

Fecha de Emisión: 24/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA

Id/RTN: 1606198700048

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Tercer Estimación del Contrato No.062-2021 por valor de Lps.803,487.87 (Adendum No.01-2022) por la Construcción 116 Mts Pavimento de Concreto Ciclópeo 70/30, de 6.30 M de ancho y 20 cm de espesor en el Barrio San Juan II, T.S.B. (Tercer Estimación Lps.160,603.05, Retención de Anticipo Lps.32,120.61, Retención del 5% de Calidad de Obra Lps.8,030.15 y Retención el 12.5% del Impuesto Sobre La Renta Lps.2,007.54 TOTAL A PAGAR LPS.118,444.75)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 013 000 001 47210 11-011-10	CONSTRUCCION 116 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	128,482.44

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
207	RETENCIONES VARIAS	8,030.15
202	RETENCION DE ISR	2,007.54
Total de retenciones:		10,037.69

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-10	Transferencia Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización para Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo en Barrio San Juan II, Trinidad,S.B.- Inversión	128,482.44
Monto Total:		128,482.44



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/02/2022

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO:
YESENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	128,482.44
- RETENCIONES	10,037.69
TOTAL	118,444.75



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
1606-1987-00040



0s+js/f9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfU...FPuOah75xqDkGmQxXP0Op3+MSTL3BAddb2+qYrwsbrtp2H 5Q==

ESTIMACION DE AVANCE DE OBRA # 3

PROYECTO: CONSTRUCCION DE 116 ML PAVIMENTO CICLOPEO, A=6.30 M , e=20 CMS

UBICACIÓN: CALLE EN BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO, TRINIDAD, SANTA BARBARA

N°	ACTIVIDAD	CONTRATADO				AVANCE ANTERIOR			AVANCE DEL PERIODO			AVANCE TOTAL			PENDIENTE DE PAGAR		
		UND	CANT.	P. UNIT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%	CANT.	TOTAL	%
1	Trazado y Marcado Con Teodolito	Global	1.00	18262.40	18,262.40	1.00	18,262.40	2.27	0.00	0.00	0.00	1.00	18,262.40	100.00	0.00	0.00	0.00
2	Excavación Tipo I (Material Común)	M3	167.76	196.95	33,040.33	167.76	33,040.33	4.11	0.00	0.00	0.00	167.76	33,040.33	100.00	0.00	0.00	0.00
3	Acarreo de Material (Desperdicio)	M3-km	872.35	30.62	26,711.36	872.35	26,711.36	3.32	0.00	0.00	0.00	872.35	26,711.36	100.00	0.00	0.00	0.00
4	Conformacion Y Compactacion de Sub-rasante	M2	559.20	93.21	52,123.03	559.20	52,123.03	6.49	0.00	0.00	0.00	559.20	52,123.03	100.00	0.00	0.00	0.00
5	Relleno y Compactado con Material Selecto	M3	83.88	505.51	42,402.18	83.88	42,402.18	5.28	0.00	0.00	0.00	83.88	42,402.18	100.00	0.00	0.00	0.00
6	Pavimento de Concreto Ciclópeo e=0.20, (incluye corte, curado y sellado de juntas)	M3	111.84	3982.71	445,426.29	74.39	296,273.80	36.87	27.45	109,325.39	24.54	101.84	405,599.19	91.06	10.00	39,827.10	8.94
7	Acero de Refuerzo, Grado Inter. Fy=2800 kg/Cm2	Kg	354.82	152.17	53,992.96	177.41	26,996.48	3.36	137.00	20,847.29	38.61	314.41	47,843.77	88.61	40.41	6,149.19	11.39
8	Bordillo de Concreto Ciclópeo de 0.15 x 0.15	ML	233.00	406.28	94,663.24	126.00	51,191.28	6.37	74.90	30,430.37	32.15	200.90	81,621.65	86.22	32.10	13,041.59	13.78
9	Acondicionamiento de Pozos Existentes	Unidad	2.00	2756.42	5,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,512.84	100.00
10	Movilizacion de Equipo	Global	1.00	26000	26,000.00	1.00	26,000.00	3.24	0.00	0.00	0.00	1.00	26,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	Rótulo del Proyecto	Unidad	1.00	5,353.24	5,353.24	1.00	5,353.24	0.67	0.00	0.00	0.00	1.00	5,353.24	100.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL.....LPS.					803,487.87	0.00	578,354.10	71.98		160,603.05	19.99		738,957.15	91.97		64,530.72	8.03

RESUMEN DE LA TERCERA ESTIMACION DE PAGO SEGÚN AVANCE DE OBRA

1*) MONTO EJECUTADO SEGÚN ESTIMADO EN CAMPO.....LPS.	160,603.05
2*) DEDUCCION DEL ANTICIPO 20% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	32,120.61
3*) DEDUCCION DEL CALIDAD DE OBRA 5% DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	8,030.15
4*) DEDUCCION DEL ISR (12.5% DEL 10% CONSIDERADO COMO UTILIDAD) DE ESTA ESTIMACION.....LPS.	2,007.54
5*) NETO A PAGAR EN TERCERA ESTIMACION.....LPS.	118,444.75

CUADRO DE DEDUCCION DEL ANTICIPO DEL CONTRATO		CUADRO DE DEDUCCION			
TOTAL DEL ANTICIPO (20%)	L. 160,697.57	AMORTIZACION DE ANTICIPO			
		ANTERIOR	ESTA EST.	ACUMULADO	PENDIENTE DE AMORTIZAR
		115670.82	32,120.61	147,791.43	L. 12,906.14



 JOSE EDGARDO LEIVA
 CONTRATISTA



 DR. HEDMAN ALLAN PAREDES PAZ
 ALCALDE MUNICIPAL



 ALMA SARAI PAZ
 TESORERA MUNICIPAL



PROP. JOSE EDGARDO LEIVA RIVERA
 R. T. N. 16061987000488 // TEL. 88201108
 BARRIO EL OCOTE, CALLE PRINCIPAL,
 COLINAS S. B. HONDURAS, C. A.
 Email: galoleiva7@gmail.com
 CAI: B625B9-E28183-E74B83-CF1025-AE55FA-18

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00
Nº 000024

Por Lps: **118,444.75**

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S.B

RTN: 16269995443317

La suma neta de: Ciento Dieciocho mil Cuatrocienta cuarenta y cuatro ^{7/100}

Por concepto de: Pago Tercera Estimación de Contrato No. 062-2021 Pavimento concreto ciclopeo Barrio San Juan II

24 de 2 del 2022

Jose Edgardo Leiva Rivera
 firma



Total por Honorarios	L.:	
Total Retenido	L.:	
Total Neto Recibido	L.:	<u>118,444.75</u>


Original: Cliente Copia: Emisor
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050 - Fech. Recepción - 09/03/2021 - Limite. Emisión - 09/03/2022

RECIBO

Por Lps. 118,444.75

Recibí de la Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara, la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 75/100 (**Lps. 118,444.75**) por concepto de Tercer pago según Estimación de Avance de Obra del **PROYECTO DE PRESTACION DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA Y COMPRA DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCION DE 116 ML DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO A=6.30 M Y DE 20 CMS DE ESPESOR, CALLE EN BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BARBARA**, para tal efecto se adjuntan documentos de respaldo.

Trinidad, Santa Bárbara 24 de Febrero del 2022.



Ing. Jose Edgardo Leiva
Contratista
Ident. # 1606-1987-00048

Resumen Financiero	
Tercer pago.....Lps.	160,603.05
Menos:	
Retención Del Anticipo.....Lps.	32,120.61
Retención De Calidad De Obra...Lps.	8,030.15
Retención Del ISR.....Lps.	2,007.54
Monto a Pagar.....Lps.	118,444.75

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

INFORME TECNICO 3

**PROYECTO: CONSTRUCCION DE 116.00 ML
DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO
CON ANCHO DE 6.30 Y $e=0.20$ M, CALLE EN
BARRIO SAN JUAN II, CASCO URBANO,
MUNICIPIO DE TRINIDAD.**

Trinidad Santa Bárbara, Febrero 2022.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

INFORME TECNICO No.3 **Ejecución De Obra**

PROYECTO: Construcción De 116.00 ml de pavimento de concreto ciclópeo con ancho=6,30 m, e=0,20 m.

UBICACIÓN:

Este proyecto está ubicado en la Calle del Barrio San Juan II, Casco Urbano, del Municipio de Trinidad, Departamento de Santa Bárbara

FECHA DE INFORME: Jueves 24 de Febrero del 2022.

ALCANCE DEL PROYECTO:

El Proyecto consiste en la ejecución de todas aquellas obras necesarias para alcanzar las condiciones óptimas para el tránsito de vehículos y de peatones en la Calle, con la construcción del Pavimento, beneficiando así a los vecinos.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El objetivo estructural del proyecto fue obtener una capa de rodadura en las más óptimas condiciones tomando en cuenta la calidad de los materiales y la ejecución adecuada del proyecto, el objetivo fundamental del proyecto fue solucionar los problemas que presentaba la calle ya que es el principal acceso a dicho Barrio, y en tiempo de invierno debido a las lluvias se vuelve lodosa debido al tipo de terreno, formación de grandes charcos y así avanza el deterioro de la calle, misma que presenta dificultad para transitar de manera peatonal, de igual manera para los vehículos y moto taxis que circulan a diario.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

Entre las actividades que se están realizando durante el tiempo de la construcción del Proyecto se encuentran las siguientes:

PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO.- 20 cms. de Espesor:

MATERIALES: Madera rústica de pino, clavos, piedra fina canto rodado, arena, grava, cemento gris, agua.

MANO DE OBRA: Maestro de obra, albañil, ayudantes, peones.

HERRAMIENTAS: Rasa de madera, martillo, palas, cuchara de albañilería, metro, nivel.

PROCEDIMIENTO: El pavimento consta de 2 calzadas, formadas por losas de 20 cms. divididas por la línea central, ambas con 2% de bombeo y se fundirán por separado.- Se procederá a colocar las tablas de 1"x6" para el encofrado y nivelación, con breces y estacas de madera, debidamente alineadas y de acuerdo al nivel de la rasante y a los ejes.- El concreto será de 1:2:3, se revolverá con mezcladora mecánica de 1 bolsa; el regado se hará a mano y se nivelará con rastra metálica.- Finalmente se afinará la superficie con textura relativamente rugosa se regará con curador para concreto.

Se cuantificará por M3.- Se verificará el espesor de 20 cms.

BORDILLOS DE 0.15x0.15:

MATERIALES: Madera rústica de pino, clavos, arena, grava, cemento gris, agua.

MANO DE OBRA: Maestro de obra, albañil, ayudantes, peones.

HERRAMIENTAS: Almádana, martillo, palas, cuchara de albañilería, metro, plomada.

PROCEDIMIENTO: La calle lleva bordillos de concreto ciclópeo, de 0.15x0.15; a ambos lados.- Inicialmente se encofrará con tablas de 1"x6" y breces de madera y serán alineados paralelos a la rasante de la calle.- El concreto será de 1:2:3, se revolverá con mezcladora mecánica de 1 bolsa; el regado se hará a mano y se nivelará con rastra de madera.- Finalmente

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

se afinará la superficie con textura relativamente rugosa se regará con curador para concreto.

Se cuantificará por ML.- Se verificarán sus dimensiones de 15cms x 15cms.

ACERO DE REFUERZO. GRADO INTER. FY=2800 KG/CM2

El acero de refuerzo concierne a varilla grado 60, utilizada en las juntas longitudinales y transversales del pavimento, donde se utilizó varilla #4, y la varilla #3 grado 60 utilizada en el bordillo de concreto.

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS EN SEGUNDA ESTIMACION:

Pavimento de Concreto Ciclópeo e=0.20, (incluye corte, curado y sellado de juntas)	M3	27.45
Acero de Refuerzo, Grado Inter. Fy=2800 kg/Cm2	Kg	137.00
Bordillo de Concreto Ciclópeo de 0.15 x 0.15	ML	74.90

AVANCE FISICO DE OBRA: 91.97%

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES


- La contratación del personal estuvo a cargo del Contratista, el cual es responsable de reclamos por accidentes, reclamos laborales o derechos presentados por su personal.
- El contratista es el encargado de la compra de materiales y contratación de mano de obra calificada y no calificada.
- La supervisión está a cargo de al Secretaria de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento SEDECOAS.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.


IMAGENES

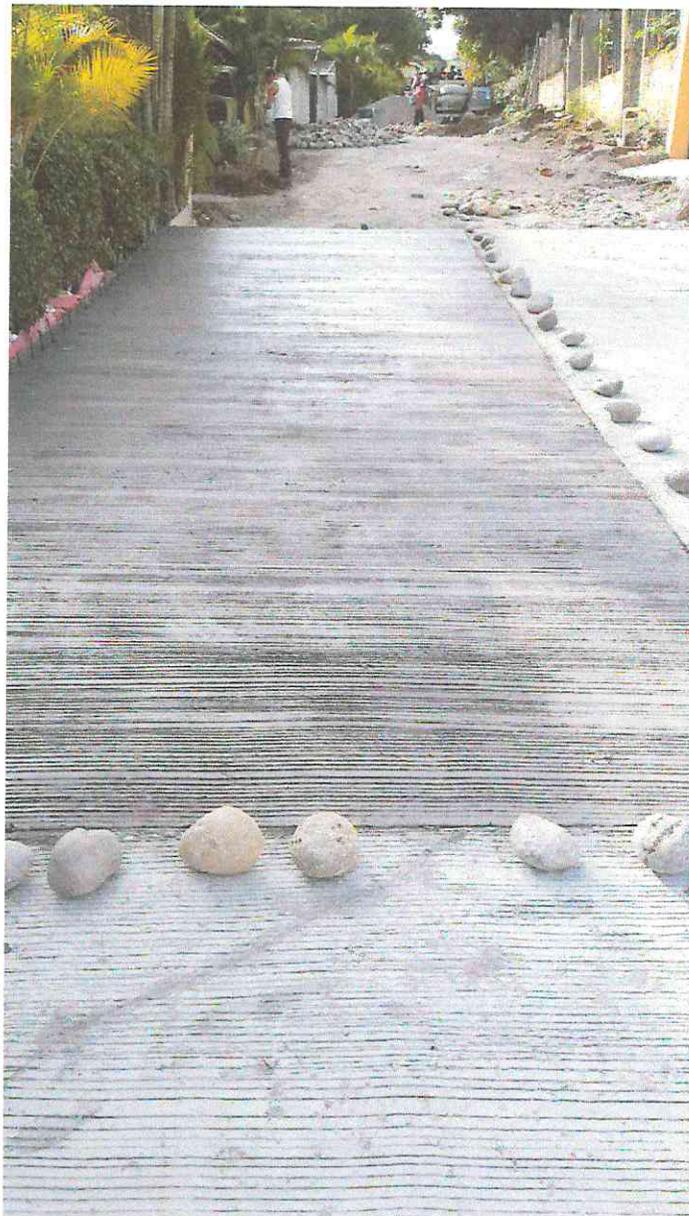

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

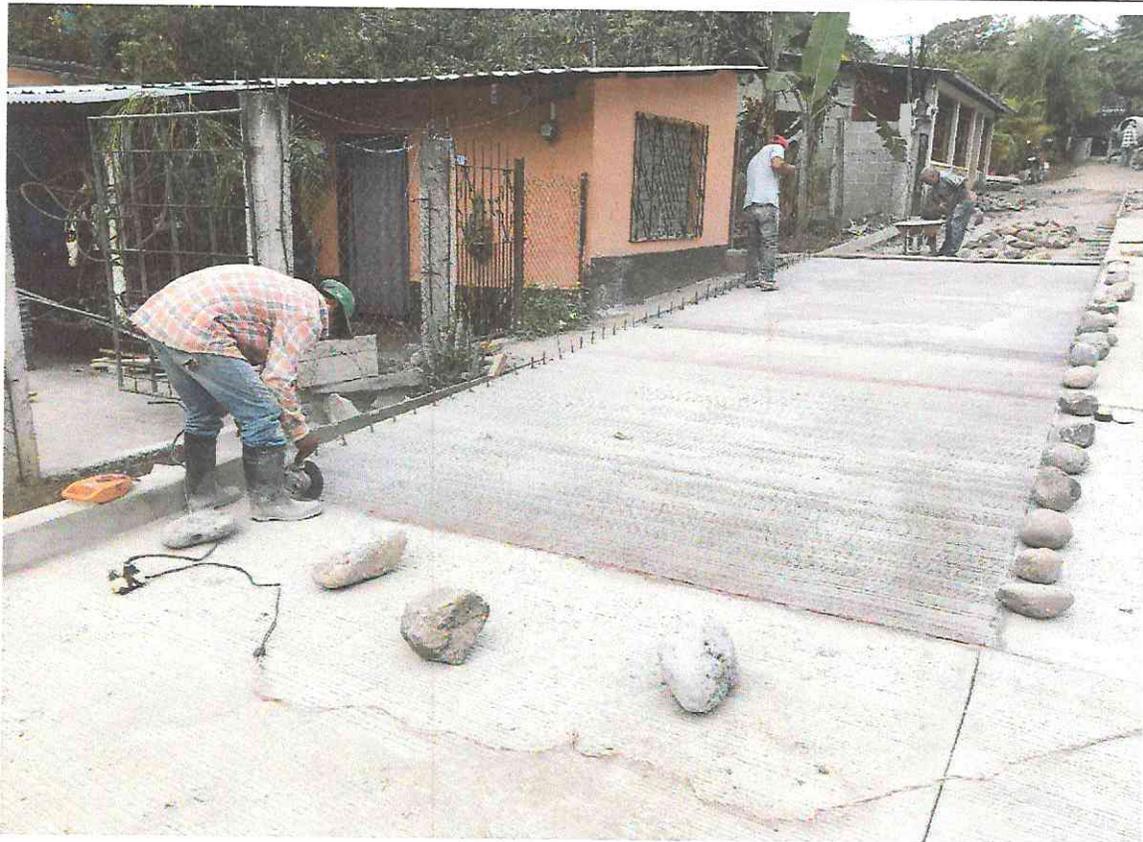

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD





DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD




DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

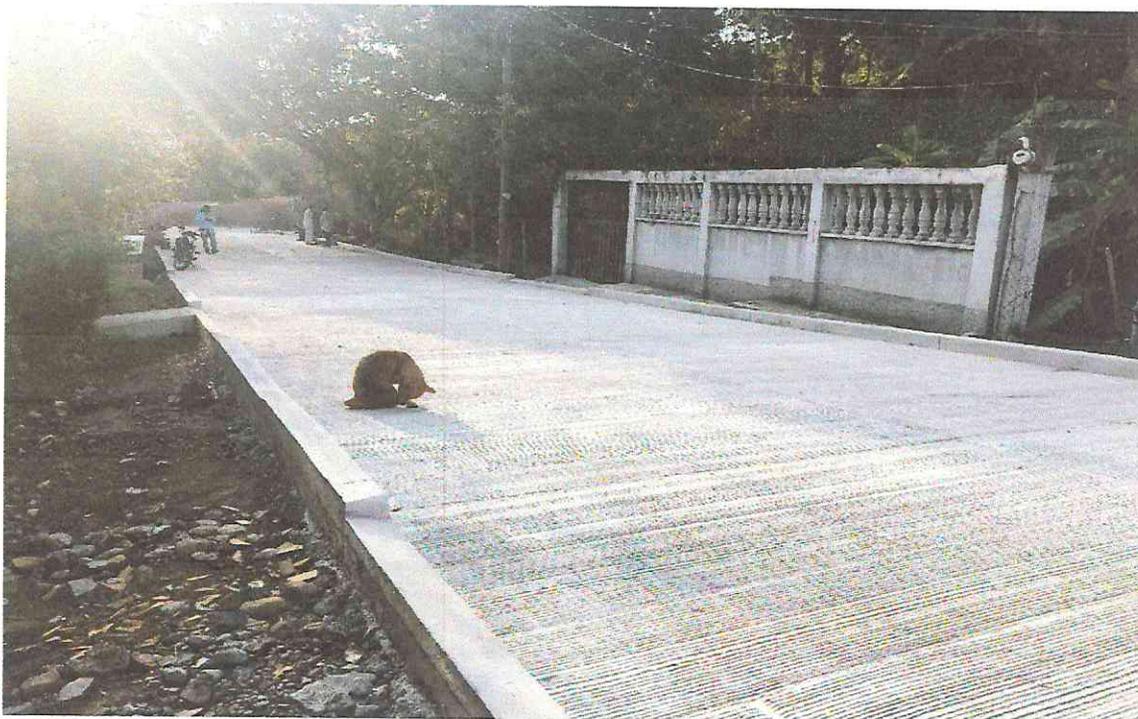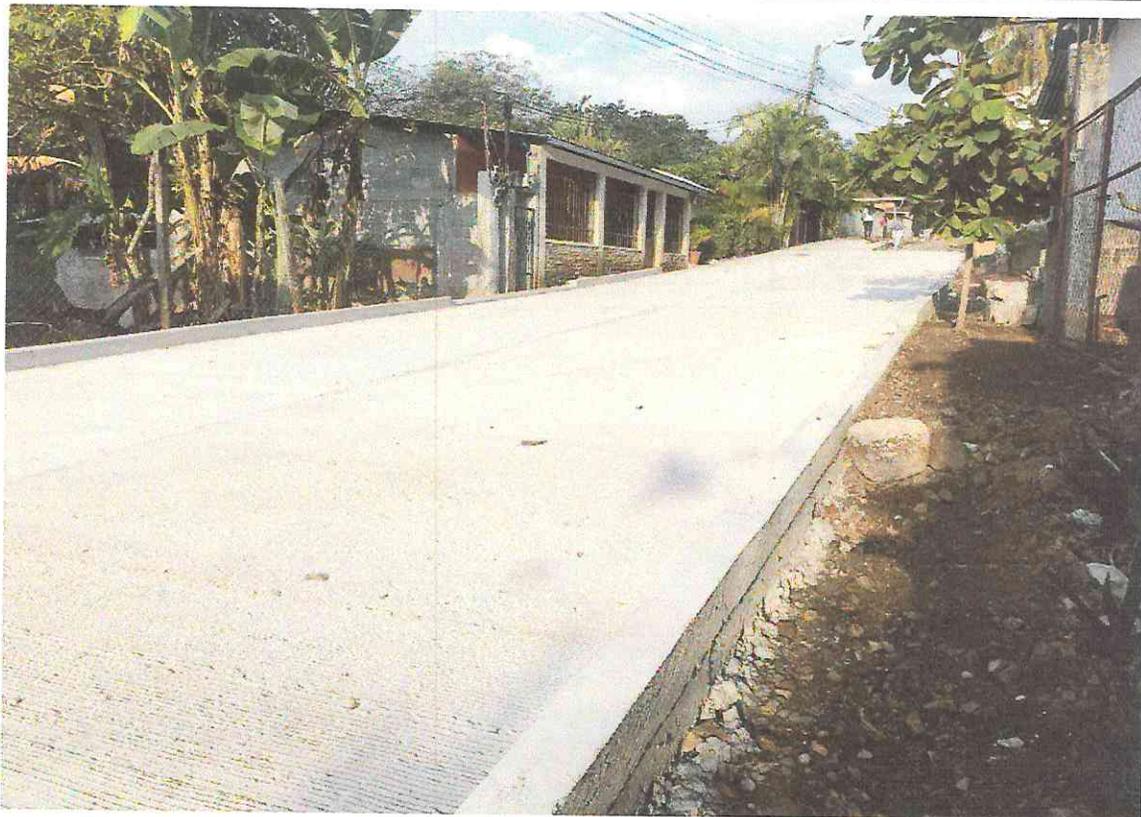

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

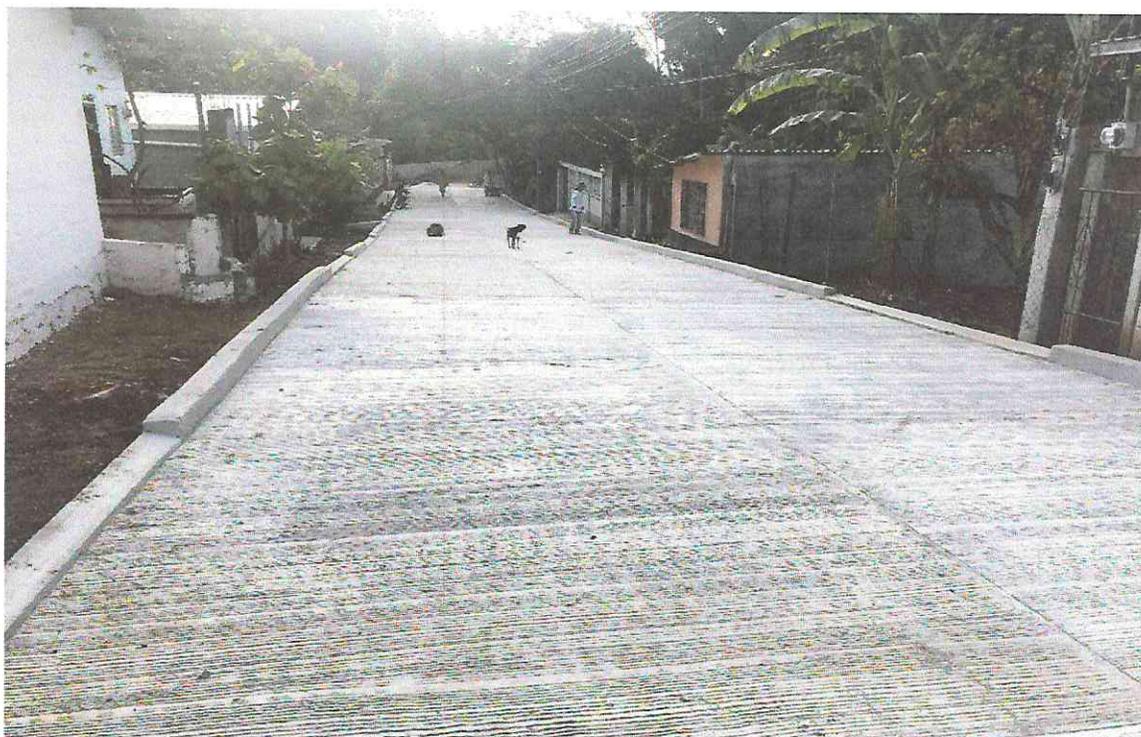


MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD



DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.

