


Proyecto: Proyecto Proceso de Fecha: mar 8/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Gantt Chart																			
				ago	sep	tri 4, 2022	oct	nov	dic	tri 1, 2023	ene	feb											
22	2.3.2. Revisión por la Comisión de Protocolo	jue 22/9/22	mar 27/9/22																				
23	2.3.3. Incorporación de Observaciones	mar 27/9/22	mar 4/10/22																				
24	2.3.4. Presentación de borrador final ante JN	mar 4/10/22	mié 5/10/22																				
25	2.3.5. Incorporación de observaciones de JN	mié 5/10/22	mar 11/10/22																				
26	2.3.6. Aprobación Final	mar 11/10/22	jue 13/10/22																				
27	2.3.7. Publicación	jue 13/10/22	vie 14/10/22																				
28	2.4. Perfil del Magistrado(a)	lun 19/9/22	vie 14/10/22																				
29	2.4.1. Elaborar primer borrador	lun 19/9/22	mar 20/9/22																				
30	2.4.2. Revisión por la Comisión	mar 20/9/22	vie 23/9/22																				
31	2.4.3. Incorporación de Observaciones	vie 23/9/22	mar 27/9/22																				
32	2.4.4. Presentación borrador final a JN	mar 27/9/22	vie 30/9/22																				
33	2.3.5. Incorporación de observaciones de JN	vie 30/9/22	lun 10/10/22																				
34	2.4.6. Aprobación Final	mar 11/10/22	mié 12/10/22																				
35	2.4.7. Publicación	jue 13/10/22	jue 13/10/22																				
36	2.5. Elaborar los formularios de la solicitud	lun 19/9/22	vie 14/10/22																				
37	2.5.1. Elaborar primer borrador	lun 19/9/22	vie 23/9/22																				
38	2.5.2. Revisión por la Comisión de instrumentos	vie 23/9/22	mié 28/9/22																				
39	2.5.3. Incorporación de Observaciones	mié 28/9/22	mar 4/10/22																				

Proyecto: Proyecto Proceso de Fecha: mar 8/11/22


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	ago	sep	tri 4, 2022	oct	nov	dic	tri 1, 2023	ene	feb
40	2.4.4. Presentación borrador final a	mar 4/10/22	lun 10/10/22									
41	2.3.5. Incorporación de observaciones de JN	lun 10/10/22	mié 12/10/22									
42	2.4.6. Aprobación Final	mié 12/10/22	jue 13/10/22									
43	2.4.7. Publicación	jue 13/10/22	vie 14/10/22									
44	III ETAPA: Proceso de Selección	lun 10/10/22	lun 16/1/23									
45	3.1. Fase 1: Convocatoria	lun 10/10/22	lun 31/10/22									
46	3.1.1. Elaboración de borrador de Convocatoria (enviar vía correo)	lun 10/10/22	mar 11/10/22									
47	3.1.2. Aprobación de Convocatoria	mar 11/10/22	mié 12/10/22									
48	3.1.3. Publicación Convocatoria	mié 12/10/22	vie 14/10/22									
49	3.2. Fase 2: Recepción de Postulaciones	vie 14/10/22	mar 1/11/22									
50	3.2.1. Recepción de Autopropuestas	vie 14/10/22	mar 1/11/22									
51	3.2.2. Elaborar expedientes de post	vie 14/10/22	mar 1/11/22									
52	3.2.3. Enviar al Congreso Nacional, la información de de autopropuestas presentadas	vie 14/10/22	mar 1/11/22									
53	3.3. Fase 3: Revisión de Documental y Ley	mié 28/9/22	sáb 5/11/22									
54	3.3.1. Verificación de cumplimiento de requisitos de Ley	mié 2/11/22	jue 3/11/22									
55	3.3.2. Cierre de período de subsana	vie 4/11/22	sáb 5/11/22									

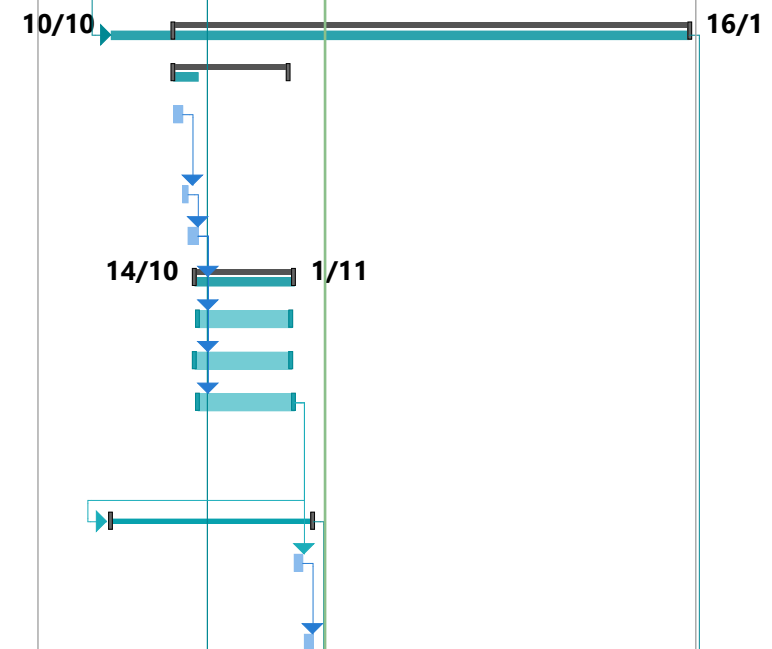

Proyecto: Proyecto Proceso de
Fecha: mar 8/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

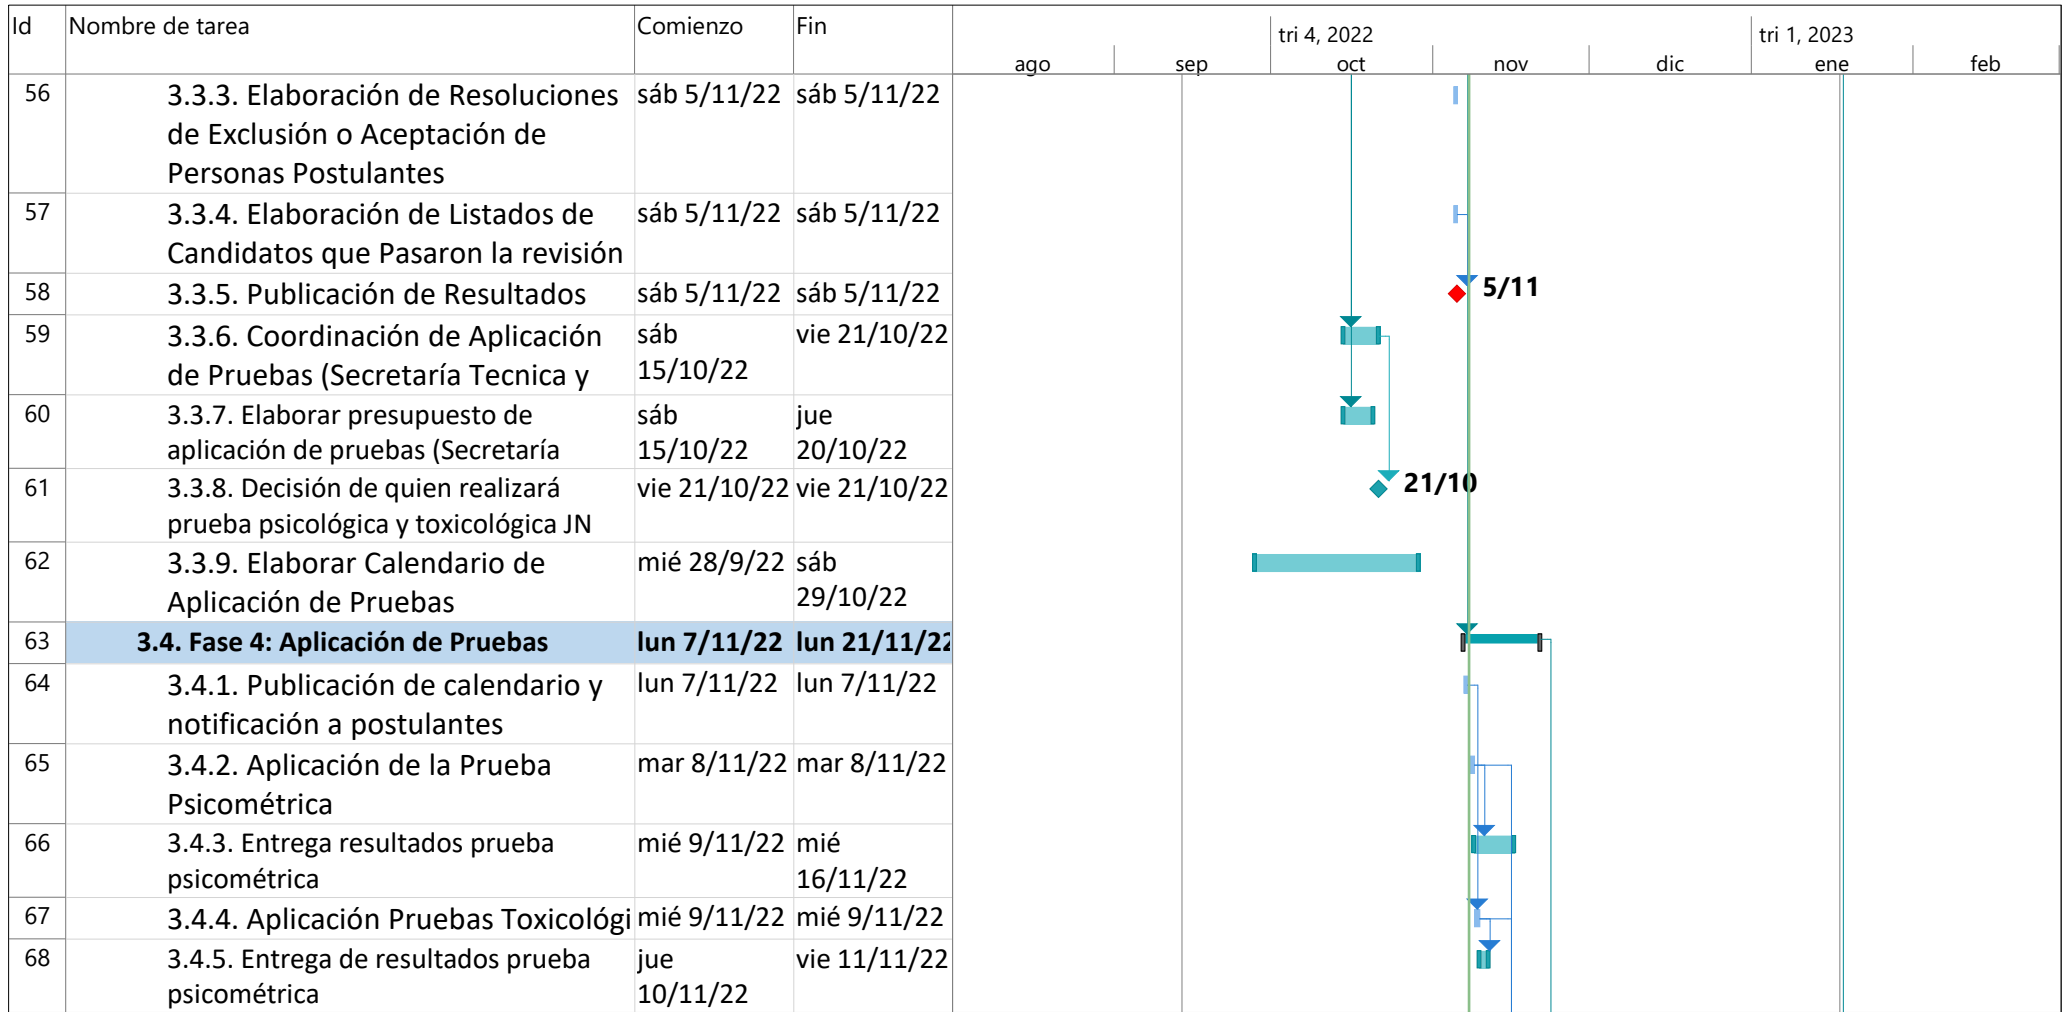




















Proyecto: Proyecto Proceso de Fecha: mar 8/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	tri 4, 2022						tri 1, 2023		
				ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb		
69	3.4.6. Aplicación Prueba Escrita	lun 14/11/22	lun 14/11/22									
70	3.4.7. Entrega resultados prueba escrita	lun 14/11/22	mar 15/11/22									
71	3.4.8. Evaluación de Resultados	mié 16/11/22	jue 17/11/22									
72	3.4.9. Elaboración de Resoluciones de Exclusión o Aceptación de	vie 18/11/22	vie 18/11/22									
73	3.4.10. Elaboración de Listados de Candidatos que aprobaron pruebas	sáb 19/11/22	sáb 19/11/22									
74	3.4.11. Notificación de resoluciones de exclusión	lun 21/11/22	lun 21/11/22									
75	3.4.12. Elaboración de Listados de Candidatos que aprobaron pruebas	sáb 19/11/22	sáb 19/11/22									
76	3.4.13. Publicación de Resultados	lun 21/11/22	lun 21/11/22									
77	3.5. Fase 5: Investigación de Candidatos	lun 21/11/22	lun 19/12/22									
78	3.5.1. Solicitud de informes a organizaciones, instituciones y personas sobre la trayectoria de postulantes. (10 días hábiles)	lun 21/11/22	mar 22/11/22									
79	3.5.2. Recepción de Informes	lun 28/11/22	vie 9/12/22									
80	3.5.3. Evaluación de la Información	vie 9/12/22	mar 13/12/22									
81	3.5.4. Elaboración de Resoluciones de Exclusión o Aceptación	mar 13/12/22	jue 15/12/22									
82	3.5.5. Elaboración de Listados de Candidatos que Pasaron la revisión	jue 15/12/22	vie 16/12/22									

21/11 19/12

Proyecto: Proyecto Proceso de
Fecha: mar 8/11/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Gantt Chart																			
				ago	sep	tri 4, 2022	oct	nov	dic	tri 1, 2023	ene	feb											
83	3.5.6. Notificación de resoluciones de exclusión	jue 15/12/22	vie 16/12/22																				
84	3.5.7. Publicación de Resultados	vie 16/12/22	lun 19/12/22																				
85	3.6. Fase 6: Impugnaciones y Tachas	lun 19/12/22	mié 11/1/23																				
86	3.6.1. Recepción de impugnaciones y tachas	lun 19/12/22	mié 28/12/22																				
87	3.6.2. Cierre de período de denuncias y	mar 27/12/22	mar 27/12/22																				
88	3.6.3. Notificar al postulante	mié 28/12/22	jue 29/12/22																				
89	3.6.4. Descargo para el postulante	jue 29/12/22	jue 5/1/23																				
90	3.6.5. Resolución por la JN	vie 6/1/23	sáb 7/1/23																				
91	3.6.7. Notificar resolución a persona postulante y denunciante	lun 9/1/23	lun 9/1/23																				
92	3.6.8. Elaboración de Listados de Personas Postulantes que van a entrevistas por haber sido declarada sin lugar la tacha o	lun 9/1/23	mar 10/1/23																				
93	3.6.9. Publicación de Resultados	mar 10/1/23	mié 11/1/23																				
94	3.7. Fase 7: Entrevistas	mié 28/12/22	sáb 14/1/23																				
95	3.7.1. Elaborar y aprobar calendario de entrevistas	mié 28/12/22	mié 28/12/22																				
96	3.7.2. Publicación del Calendario y notificación a personas postulantes	mié 28/12/22	jue 29/12/22																				

Proyecto: Proyecto Proceso de Fecha: mar 8/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Gantt Chart (ago, sep, tri 4, 2022, oct, nov, dic, tri 1, 2023, ene, feb)											
97	3.7.3. Entrevistas (incluye evaluación de los 7 miembros de la	jue 29/12/22	vie 6/1/23	[Task bar from Dec 29 to Jan 6, 2023]											
98	3.7.4. Elaboración de resoluciones de exclusión o aceptación	vie 6/1/23	sáb 7/1/23	[Task bar from Jan 6 to Jan 7, 2023]											
99	3.7.5. Notificar exclusión	sáb 7/1/23	lun 9/1/23	[Task bar from Jan 7 to Jan 9, 2023]											
100	3.7.6. Entrevistas para personas que recibieron tachas o denuncias, pero las mismas fueron desestimadas	mar 10/1/23	jue 12/1/23	[Task bar from Jan 10 to Jan 12, 2023]											
101	3.7.7. Elaboración de resoluciones de exclusión o aceptación de personas que habían recibido tachas o	jue 12/1/23	vie 13/1/23	[Task bar from Jan 12 to Jan 13, 2023]											
102	3.7.8. Elaboración de listados de personas postulantes que	vie 13/1/23	sáb 14/1/23	[Task bar from Jan 13 to Jan 14, 2023]											
103	3.7.9 Publicación de listado	sáb 14/1/23	sáb 14/1/23	[Milestone diamond on Jan 14, 2023]											
104	3.8. Fase 8: Evaluación Méritos	dom 15/1/23	dom 15/1/23	[Milestone diamond on Jan 15, 2023]											
105	3.8.1. Evaluar criterios objetivos de evaluación de méritos adicionales	dom 15/1/23	dom 15/1/23	[Milestone diamond on Jan 15, 2023]											
106	3.9. Fase 9: Elaboración del listado final y remisión al Congreso Nacional	lun 16/1/23	lun 16/1/23	[Milestone diamond on Jan 16, 2023]											
107	3.9.1. Elaboración Listados Final de Candidatos de acuerdo a calificación obtenida y aplicación	lun 16/1/23	lun 16/1/23	[Milestone diamond on Jan 16, 2023]											
108	3.9.2. Elaboración de Resoluciones de Exclusión o Aceptación	lun 16/1/23	lun 16/1/23	[Milestone diamond on Jan 16, 2023]											

Proyecto: Proyecto Proceso de Fecha: mar 8/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	ago sep tri 4, 2022 oct nov dic tri 1, 2023 ene feb											
				ene 17/1											
109	Remisión de listado al Congreso Nacional	mar 17/1/23	mar 17/1/23												

Proyecto: Proyecto Proceso de Fecha: mar 8/11/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
